



# Aktuálně řešené úkoly v procesu plánování v oblasti vod a informace z mezinárodní spolupráce

KPOV  
2. prosince 2016



## Reporting plánů povodí

- V souladu s požadavkem článku 15. směrnice 2000/60/ES bylo nutno zajistit reporting schválených plánů povodí EK (kopie plánů zaslat EK do 22. 3. 2016)
- Proces byl dále upraven směrnými dokumenty EK
  - WFD Reporting guidance
  - GIS guidance
  - datová schémata
- Reporting probíhal prostřednictvím EIONET „Central data repository“

### Reporting obsahuje

- **Kopie plánů povodí**
- **Geografické údaje** – mapové výstupy, shapefily - oblasti povodí, dílčí povodí (sub-units), útvary povrchových vod, útvary podzemních vod, monitorovací stanice, chráněná území
- **Popisné/atributové údaje** – strukturovaná data (xml) cca 130 tabulek po 5 – 27 sloupcích, až 78 000 řádků
- **Background dokumenty** – podpůrné dokumenty – možnost objasnit/upřesnit reportované informace






## Reporting plánů povodí

- K **21. 3. 2016 byly**, v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES, **zaslány EK kopie Národních plánů povodí (+ Mezinárodní plány povodí)**
- Dne **18. 8. 2016** byly uzavřeny všechny reportingové obálky a tím formálně **dokončen proces reportingu**.
- ČR byla první zemí EU, které se úspěšně podařilo plně dokončit reporting plánů povodí
- **Reporting plánů povodí je klíčovým podkladem pro úplné a správné sestavení vyhodnocení (zprávu dle článku 18 RSV), sestavované Evropskou komisí.**



# Metodika hodnocení

## Staged approach for the assessment

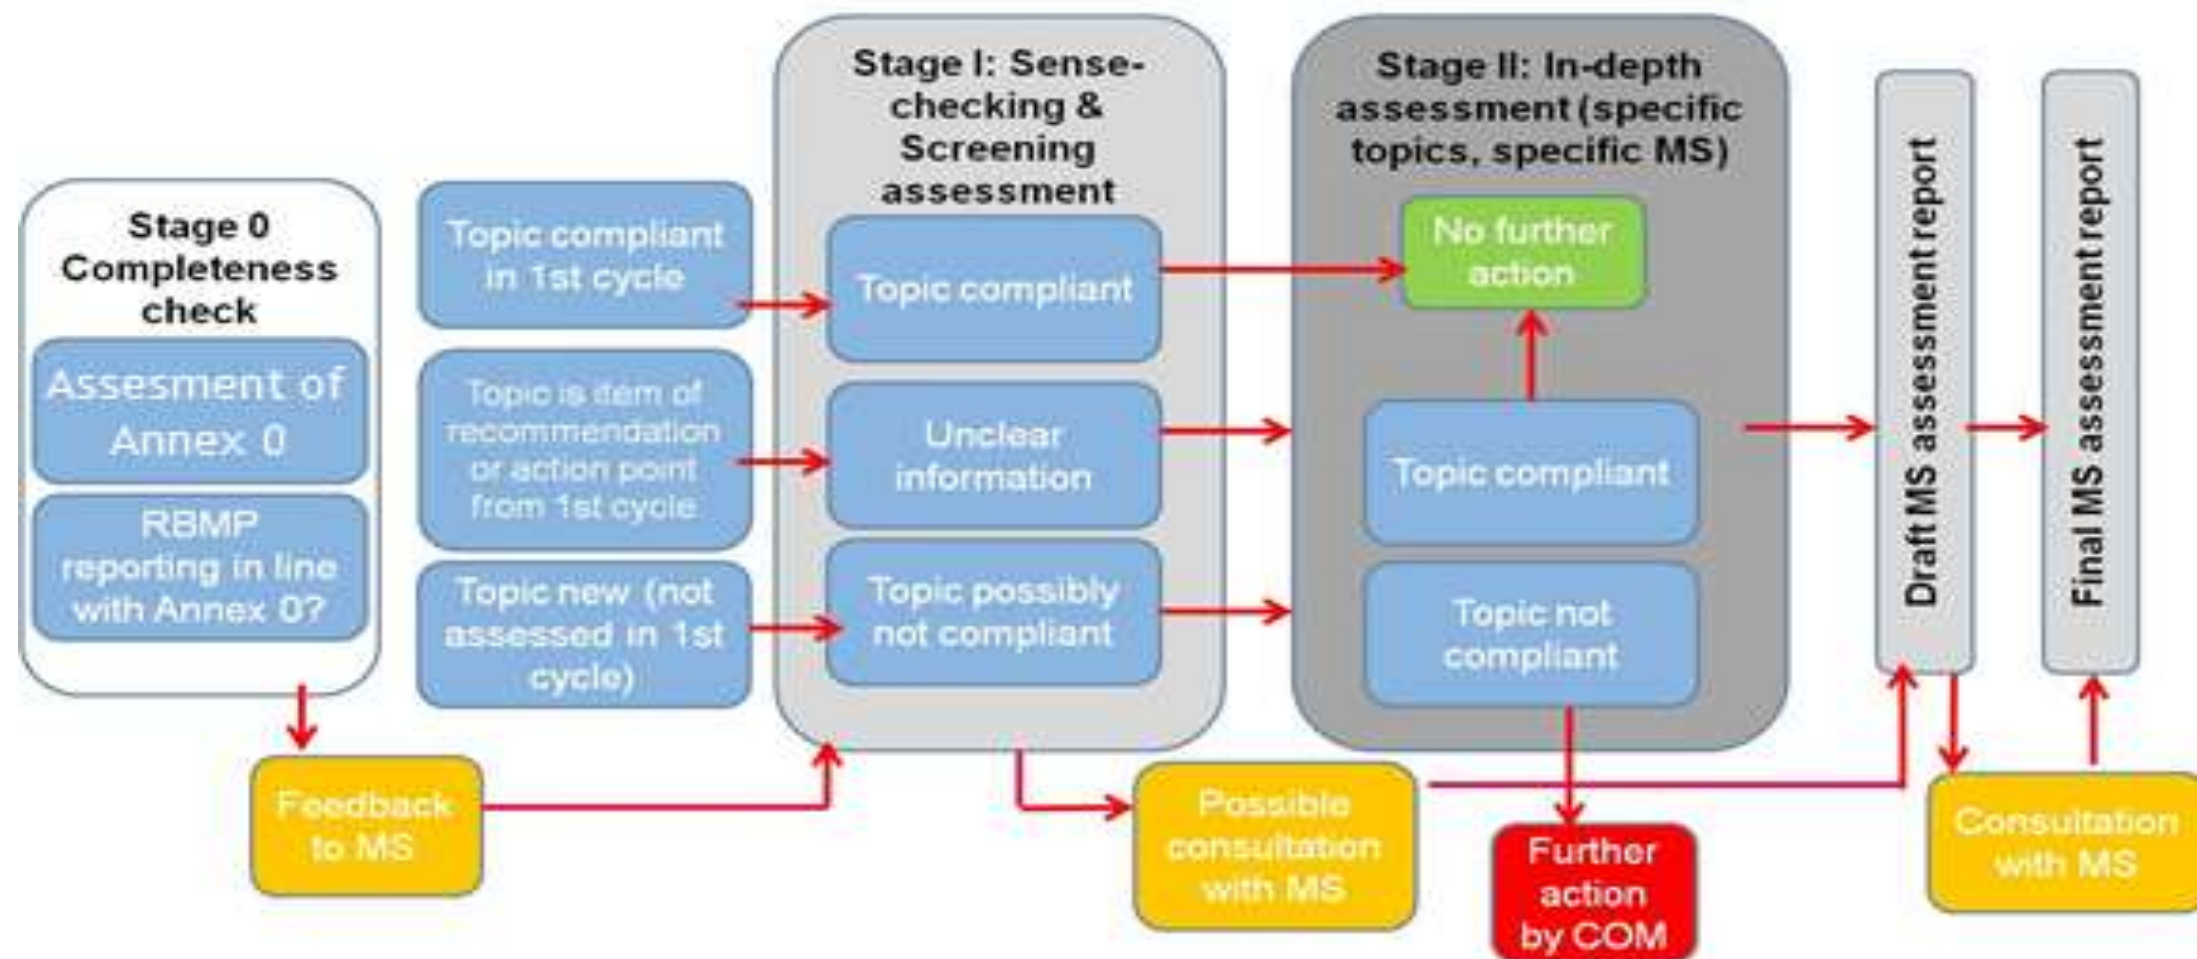

- Výstupy hodnocení EK lze očekávat v první polovině roku 2017.



## Analýza (reportingu) plánů povodí

- Syntéza a analýza dat pro provedení reportingu umožnila (i pořizovatelům plánů) získat ucelený přehled o stavu plánů povodí.
- V přípravě 3. plánovacího období je nutné poučit se z chyb a nedostatků při zpracování plánů povodí ve 2. plánovacím období




### 1. krok – určení a analýza nedostatků při zpracování plánů povodí ve 2. cyklu

*V současné chvíli probíhají pracovní setkání (brainstorming) vybraných zástupců MŽP, MZe, VÚV TGM, zpracovatelů NPP (konsorcium VRV/DHI), správců povodí. Cílem je určení a prioritizace hlavních nedostatků zjištěných při přípravě a vyhodnocení plánů povodí + definování nezbytných kroků v další přípravě 3. plánovacího cyklu.*

### 2. krok – zpracování materiálu „zajištění procesu plánování v oblasti vod do roku 2021“ – předpoklad 1. pololetí 2017



2017

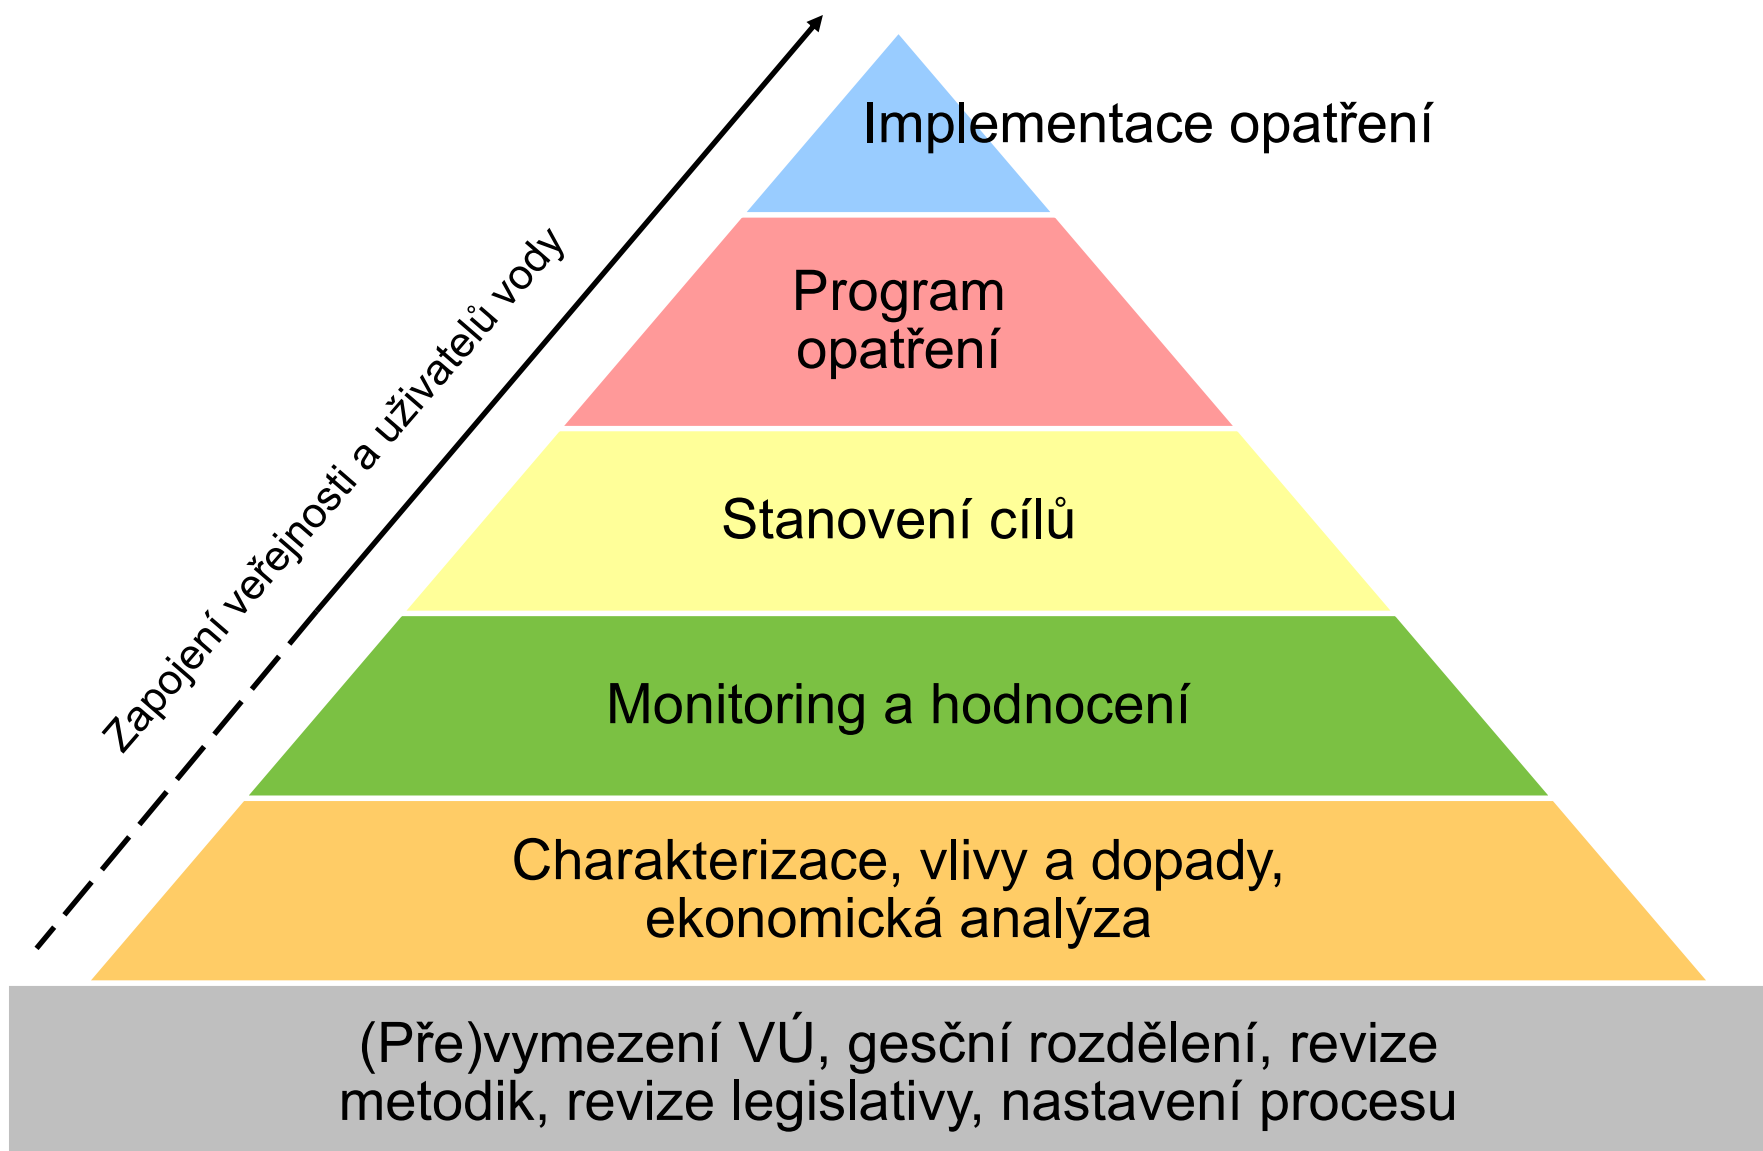

## Současný předpoklad hlavních činností na rok 2017:

- **Legislativní a procesní náležitosti** (analýza a případná revize vyhlášky 24/2011 Sb., vyjasnění vzájemných vazeb a procesů projednávání dle SEA, Vodního zákona a správního řádu (OOP), posílit informování a zapojení veřejnosti – public relations, posílení koordinační role KPOV (RSV KPOV, PS KPOV), stanovit a dohodnout logickou provazbu dílčí a národní úrovně zpracování plánů
- **Revize makety PDP a NPP** - včetně určení datového rámce
- **Diskuze nad vymezením vodních útvarů**
- **Metodická podpora** – revize či nové pořízení metodických postupů (probíhá analýza a vytipování)
- **Datová základna** - příprava podkladových dat (útvary povrchových a podzemních vod, rozvodnice, dílčí povodí), stanovení identifikátoru na národní úrovni, zajištění zpracování dat o surové vodě, databáze dat z reportingu

## Vazba mezi NPP a PpZPR ve třetím cyklu plánování v oblasti vod

- Diskuze nad zahrnutím problematiky povodňové ochrany (v oblastech mimo OsVPR) v plánech povodí.
- Plánované jednání PS KPOV s účastí zástupců RSV KPOV dne 12. 1. 2017





# Zpracování plánů povodí pro 3. plánovací období

## Legislativní milníky

**Do 22. 12. 2018**

**Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí**

Nutno zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám (na období nejméně 6 měsíců), a to nejméně 3 roky před začátkem období, kterého se budou plány týkat,

**Do 22. 12. 2019**

**Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami**

předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, včetně uvedení umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod je zpracován na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, ekonomické analýzy užívání vody. Musí se zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám (na období nejméně 6 měsíců), a to nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se budou týkat,

**Přípravné práce**

**Do 22. 12. 2020**

**Návrhy plánů povodí**

zpracování návrhů plánů povodí, které musí být zpracovány podle výsledků přípravných prací a obsahovat programy opatření k dosažení cílů podle § 24 odst. 4, zveřejněny a zpřístupněny uživatelům vody a veřejnosti (na období nejméně 6 měsíců) k připomínkám nejméně 1 rok před začátkem období, kterého se budou týkat,

**Do 22. 12. 2021**

**Plány povodí**

zpracování plánů povodí upravených podle vyhodnocení konzultací s uživateli vody a veřejností.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
Česká republika

[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz)



**Děkuji za pozornost !**

