



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

PROCESNÍ A VÝSLEDKOVÉ HODNOCENÍ OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020

Finální hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-2020 a horizontálních témat



Zpracovatel

Naviga 4, s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

HOPE Group s.r.o.

Palackého tř. 10
612 00 Brno
(kancelář Lidická 1, Praha 5)

hope
euservis.cz

Zadavatel

ČR – Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

NAVIGA⁴
jednoduchost v orientaci

OBSAH

OBSAH.....	2
MANAŽERSKÉ SHRUTÍ	4
1 ÚVOD	14
2 STRUČNÝ POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ.....	14
3 IMPLEMENTACE OP RYBÁŘSTVÍ 2014-2016	15
4 DOŠAŽENÝ POKROK A VÝSLEDKY OP RYBÁŘSTVÍ.....	20
4.1 Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje	20
4.1.1 2. A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí	20
4.1.2 2. B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků .	24
4.1.3 2. C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje	32
4.1.4 2. D Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti	35
4.1.5 Hodnocení výkonnostního rámce PU 2	37
4.2 Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky	38
4.2.1 3. A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy	38
4.2.2 3. B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž	41
4.2.3 Hodnocení výkonnostního rámce PU 3	43
4.3 Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování	44
4.3.1 5. A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury.....	44
4.3.2 5. B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh.....	48
4.3.3 Hodnocení výkonnostního rámce PU 5	50
4.4 Technická pomoc.....	52
4.4.1 Opatření Technická pomoc.....	52
5 HODNOCENÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT	58
5.1 Hodnocení horizontálních témat – princip partnerství	58

5.2	Hodnocení horizontálních témat – rovné příležitosti	59
5.3	Hodnocení horizontálních témat – udržitelný rozvoj	59
5.4	Hodnocení horizontálních témat – změny klimatu	63
6	HLAVNÍ ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ.....	64
6.1	Hodnocení naplnění očekávaných výsledků DoP	68
7	DOPORUČENÍ	74
8	POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE	75

MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ

Zakázka „**Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství**“ byla zahájena dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společnostmi Naviga 4, s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o.

Zpráva **Finální hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-2020 a horizontálních témat** je jedním z výstupů této veřejné zakázky a zaměřuje se na část výsledkové evaluace. Cílem zprávy je analýza věcného pokroku v plnění cílů OP Rybářství k datu 31. 12. 2016, hodnocen je tedy dosavadní pokrok v plnění nastavených indikátorů programu, doplněný o informace o finančním pokroku. Další části se věnují plnění horizontálních témat v programu - tedy hodnocení principu partnerství, rovných příležitostí, udržitelného rozvoje a příspěvku ke změně klimatu.

Zdroje dat a metody

Informace ve zprávě uvedené jsou založeny na analýze plnění indikátorů z dat z MS2014+ generovaných k 31. 12. 2016 ze strany MMR-NOK, doplněné informacemi o schválených projektech (závazky příjemců) a podaných žádostech (ŘO OPR). V rámci přípravy Závěrečné zprávy byly tedy aplikovány metody data mining a provedena analýza dat z MS2014+ a z IS SZIF, dále byla provedena analýza výzev (harmonogramy výzev, vyhlášené výzvy) a desk research (např. interní materiály ŘO k vyhodnocení komunikačních aktivit). Realizováno bylo šetření mezi klíčovými aktéry programu (garanti jednotlivých opatření na ŘO i SZIF, garanti strategie na MZe, zástupci rybářského sdružení apod.) a dotazníkové šetření mezi příjemci a žadateli.

Postup implementace

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. První dvě výzvy byly vyhlášeny v říjnu 2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2016. Vyhlášení 5. a 6. výzvy a pokračování 2. výzvy OP Rybářství bylo plánováno na 11. října 2016, žádosti o podporu byly zpřístupněny již k 27. 9. 2016. Výzvy č. 1, 2, 4 a 5 již byly ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v případě 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018).

K 31. 12. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1, 5.1 a 5.2a), pro které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva (výzva je plánována na duben 2017). Naopak opatření 2.2 je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá jeho významnosti vzhledem k výši alokace specifického cíle 2.B. (viz výše). Všechna opatření spadající pod Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou dle zjištění pokryta alespoň jednou výzvou.

Dosažený pokrok a výsledky jednotlivých specifických cílů OP Rybářství (k 31. 12. 2016):

V rámci **opatření 2.1.** bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí, z nichž byly ke stejnému datu schváleny 2 projekty, což je zhruba desetina cílové hodnoty. V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. K naplnění cílové hodnoty indikátoru *Změna objemu produkce akvakultury* by měla přispět realizace aktuálně schválených projektů zhruba 18 %. Naplnění indikátorů a cílů opatření lze považovat za principiálně reálné.

V rámci **opatření 2.2. a 2.3.** bylo zaregistrováno celkem 264 žádostí. Již schváleno bylo celkem 69 projektů. U těchto projektů se předpokládá, že jejich realizace přispěje téměř z poloviny k naplnění cílové hodnoty

indikátoru *Změna objemu produkce akvakultury*. Díky těmto investicím by mělo dojít k nárůstu objemu akvakulturní produkce o 85,4 tun ročně. V opatření se v průběhu implementace ukázala jako limitující faktor absorpce definice příjemce, respektive požadavek na minimální roční produkci. Pro výzvu na podzim 2016 (pátá výzva) byla definice příjemce upravena, bylo umožněno čerpat i menším podnikům. Z hlediska perspektivy naplnění cílů programu v opatřeních 2.2 a 2.3 je podstatné, že potenciální žadatelé považují podpory investic do akvakultury za nejatraktivnější instrument OP Rybářství.

V rámci **opatření 2.4.** bylo zaregistrováno celkem 33 žádostí, z toho 12 žádostí již bylo schváleno. Schválena je tak již více než polovina cílového (očekávaného) počtu podpořených projektů. Tento počet projektů celkově naplňuje více jak 60 % indikátoru sledujícího objem produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu indikátoru *Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů s dočišťováním*.

V rámci **opatření 2.5.** byly schváleny 4 žádosti. Tyto projekty naplňují téměř 40 % cílové hodnoty množství vysazeného úhoře. Jako do určité míry limitující faktor nastavení výzev bylo identifikováno vymezení způsobilosti příjemce jako „podniku akvakultury“, kdy přirozená obec příjemců v podmínkách ČR toto vymezení převážně nenaplňuje (jedná se ovšem o nastavení vyplývající z legislativního prostředí).

Celkově bylo k 31. 12. 2016 v rámci PU 2 evidováno 87 projektů s Rozhodnutím s požadovanou výší podpory 114,3 mil. Kč. Zároveň existuje dostatečný zásobník žádostí, které se v současnosti nacházejí v hodnocení. V případě hladké administrace Žádostí o platbu tak lze očekávat naplnění **finančního i věcného milníku**.

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A, **opatření 3.1**, nebyla k 31. 12. 2016 vyhlášena žádná výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru věcného pokroku. V rámci výzvy plánované na duben 2017 má být na projekty v opatření 3.1 alokováno 2,4 mil. EUR, tedy plná finanční alokace na dané opatření. V současné době probíhají mezi žadatelem a ŘO jednání ohledně charakteru plánovaných intervencí v rámci opatření 3.1, přičemž se předpokládá realizace dvou projektů.

K opatření 3.2 nejsou k 31. 12. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, do otevřené výzvy č. 6 pokrývající toto opatření je možné podávat žádosti až do konce roku 2018. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B. Dle dosavadních informací by měly být první žádosti o podporu podány na začátku roku 2018 a z hlediska průběhu naplňování opatření je očekávána realizace cca 2 projektů ročně. V první fázi by měly být realizovány zejména projekty zaměřené na odborné publikace pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a dále školení a výměnné programy (včetně výměny mezi členskými státy) pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností, přičemž byl indikován zájem cílových skupin o tyto aktivity. Naplnění cílů opatření 3.2 se tak jeví jako reálné.

K 31. 12. 2016 nebyla v PU 3 podána žádná žádost o podporu. S ohledem na plánované aktivity v rámci opatření 3.1. Shromažďování údajů lze však usuzovat, že v roce 2018 bude ze 100 % dosaženo **věcného milníku** (tj. bude ukončen 1 projekt zaměřený na podporu shromažďování, správy a využívání údajů). Dosažení **finančního milníku** nelze nyní odhadnout, protože v současné není dosud známa předpokládaná hodnota studie. Další projekty se v tomto opatření plánují až po skončení studie (tedy po roce 2018).

V **opatření 5.1 a 5.2, záměr a)** nebyly evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena výzva zaměřená na naplňování tohoto opatření (výzvy jsou plánovány na duben 2017). Nejsou tak k dispozici

žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to ani na úrovni projektových žádostí. Budoucí vývoj závisí především na zájmu žadatelů o tyto aktivity, který je vzhledem k podmínkám prozatím nejistý.

Přestože výzva č. 3 pokrývající **opatření 5.2, záměr b)** byla vyhlášena již v květnu 2016, nebyl k 31. 12. 2016 schválen v rámci opatření 5.2 žádný projekt. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty monitorovacích indikátorů. K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 7 žádostí o podporu podaných, u jedné žádosti byla administrace ukončena. Požadované finanční prostředky v rámci všech žádostí jsou ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. EUR), což činí přibližně 10 % alokace na výzvu č. 3. výzva je vyhlášena jako průběžná (do 31. 12. 2023) a tudíž je vyčerpání finančních prostředků stále reálné.

V **opatření 5.3** byly schválené celkem 3 projekty zaměřené na zpracování produktů, což je méně než 10 % očekávaného počtu projektů. Ve stavu k 31. 12. 2016 prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové hodnoty produkce zpracovaných ryb. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru *95210 Produkce zpracovaných ryb* měla být dosažena¹.

Naplnění **věcného milníku** vztaženého k Počtu projektů zaměřených na zpracování ryb (MI 96401) lze hodnotit jako velmi reálné – ke konci roku 2016 byly schváleny již 3 projekty a dalších 18 Žádostí je v administraci. Z celkově podaných Žádostí plánuje předložení Žádosti o platbu do konce roku 2018 celých 16 Žádostí, což by znamenalo splnění milníku na 380 %. **Finanční milník** je aktuálně naplněn zazávazkovánými hodnotami z 3,8 %. V případě hladké realizace všech aktuálně administrovaných projektů lze očekávat naplnění milníku z 54,3 %. ŘO OP Rybářství sice v současnosti disponuje dostatečným počtem projektů v administraci, které by finanční milník naplňovaly, nicméně 2 z těchto projektů předpokládá dokončení fyzické realizace až v květnu 2019. Dosažení finančního milníku pro rok 2018 je tedy ohroženo.

V rámci **opatření Technická pomoc** bylo k 31. 12. 2016 bylo zaregistrováno celkem 17 žádostí o podporu, schváleno bylo celkem 9 projektů s celkovou finanční podporou ve výši 7,4 mil. Kč, což činí přibližně 11,9 % celkové alokace opatření. Vzhledem k počtu projektů těsně před schválením bude pravděpodobně procento zazávazkováných financí v blízké době navýšeno. Realizace jednoho projektu již byla ukončena (uspořádání výroční konference k OP Rybářství), většina projektů předpokládá ukončení fyzické realizace projektu v roce 2016 a podání žádosti o platbu v roce 2017. Dosažené hodnoty většiny interních indikátorů jsou tak prozatím nulové. Závazky schválených projektů naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru *80600 Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin*. V případě indikátoru *82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu* je zazávazkováno zatím 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %.

Vyhodnocení očekávaných výsledků DoP

Na základě analýzy finančního a věcného plnění programu bylo zjištěno, že program potenciálně přispívá k posílení biodiverzity a ochraně přírody a krajiny (primárně udržováním populace úhoře říčního v povodích, příspěvek intervencí PU 3 je v tomto ohledu nepřímý, okrajový). Program dále přispívá ke snížení energetické náročnosti a úspoře zdrojů technologických procesů v akvakultuře investicemi do modernizace a obnovení technologického vybavení pro chov ryb a do zařízení k intenzivnímu chovu ryb.

¹ Z Ověřovací studie vyplývá, že vyjasněn musí být způsob agregace hodnoty tohoto indikátoru v případě, že by jeden příjemce žádal o podporu opakovaně (aby nedocházelo k opakovanému načítání jedné produkce).

Příspěvek programu lze dále spatřovat v příspěvku ke zvyšování konkurenceschopnosti producentů akvakultury primárně modernizací a obnovou technologického vybavení producentů a související infrastruktury a rozšiřováním intenzivních postupů chovu ryb, částečně též podporou investic do technologií zpracování produktů. Příspěvek v podobě inovativních produkčních postupů lze očekávat spíše zanedbatelný, stejně jako efekty diverzifikace činností producentů. Podobně, pokud lze očekávat příspěvek intervencí PU 3, pak pouze nepřímý, okrajový.

Na základě aktuálního stavu implementace a zhodnocení dostupného potenciálu program spíše nepřispívá zlepšení řízení a vyšší účinnosti strategických procesů v rámci sektoru.

Hodnocení horizontálních témat

Princip partnerství

Opatření zohledňující zásady **principu partnerství** jsou v rámci implementace OP Rybářství aktivně uplatňována. Do provádění OP Rybářství jsou zapojeni všichni relevantní partneři a míra jejich zapojení je adekvátní. Partneři jsou do provádění programu zapojeni prostřednictvím ustavených platforem, které jsou dle zjištění funkční a pozitivně přispívají k naplňování principu partnerství. Partneři jsou zapojeni zejména prostřednictvím účasti na Monitorovacím výboru, dále také v rámci Plánovacích komisí a Odborné skupiny OP Rybářství. Platforem se účastní široké spektrum aktérů zahrnujících relevantní subjekty a společná jednání partnerů přispívají k řešení zásadních aspektů týkajících se implementace OP Rybářství.

Rovné příležitosti

Informace o principu **rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminace** a o pravidlech dodržování tohoto principu jsou specifikovány v programové a prováděcí dokumentaci OP Rybářství (tj. programovém dokumentu a v Pravidlech pro žadatele OP Rybářství). Nastavené mechanismy zohledňující zásady rovných příležitostí jsou uplatňovány u všech opatření OP Rybářství tak, že relevantní aspekty projektů jsou sledovány v rámci žádostí o podporu. Zároveň bylo ověřeno, že všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné příležitosti byly formálně vyloučeny z podpory programu. Na základě šetření lze konstatovat, že žádný z projektů OP Rybářství nemá prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a že nedochází k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Udržitelný rozvoj

Jak bylo zjištěno, informace o principu **udržitelného rozvoje** a o pravidlech dodržování tohoto principu jsou specifikovány v programové a prováděcí dokumentaci OP Rybářství (tj. programovém dokumentu a v Pravidlech pro žadatele OP Rybářství), a relevantní aspekty projektů jsou sledovány v rámci žádostí o podporu. Bylo ověřeno, že žádný ze schválených projektů OP Rybářství nemá deklarovaný prokazatelně negativní vliv na udržitelný rozvoj. Dle zjištění mají více než dvě třetiny (68 %) projektů OP Rybářství pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, nejvíce pak v rámci opatření 2.2 zaměřeného na úsporu spotřeby energie v akvakultuře a ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnějšímu využívání zdrojů. Z hlediska příspěvku OP Rybářství k udržitelnému rozvoji v rámci naplňování environmentálních indikátorů je v současné fázi implementace pod závazkem vysazení 762 kg úhoře a lze očekávat, že celkový příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji bude odpovídat plánované hodnotě 2000 kg vysazeného úhoře. Naopak v současné fázi implementace programu prozatím nebyly podpořeny žádné výměny výrobních zařízení za energeticky účinnější.

Změny klimatu

Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn je v současné fázi implementace programu naplňována pouze projekty s vydaným Rozhodnutím, a to na úrovni 1,6 %. Vzhledem k tomu, že ještě nebyly proplaceny žádné prostředky, nelze hodnotit naplňování příspěvku na základě vyúčtovaných žádostí o platbu.

MANAGEMENT SUMMARY

Project „**Process and results evaluation OP Fisheries**“ was launched on 7. 11. 2016 by signing contracts between the Ministry of Agriculture and supplier Consortium, which consists of the companies Naviga4 s.r.o. and HOPE GROUP s.r.o.

Final evaluation of fulfilment of objectives for the OP Fisheries OP 2014-2020 and horizontal themes report is one of the outputs of this contract and focuses on the part of the results evaluation. The aim of the report is an analysis of the substantive progress in the implementation of the objectives of the OP Fisheries up to date 31. 12. 2016, previous progress in the implementation of the set programme indicators is therefore evaluated, supplemented with information about financial progress. The next sections are dedicated to the fulfilment of horizontal themes in the program – i.e. assessment of the principle of partnership, equal opportunities, sustainable development and contribution to climate change.

Data sources and methods of analysis

The information given in the report are based on analysis of fulfilment of indicators from data generated by the MS2014+ on 31. 12. 2016 by the MRD-NCA, supplemented with information on approved projects (beneficiaries' commitments) and applications submitted (MA OPF). In preparation of the Final Report were therefore applied methods of data mining (data from the MS2014+ and from SAIF information system), there were realised the analysis of calls (schedules, announced calls) and desk research (i.e. internal materials of MA to evaluate communication activities). There was survey conducted among key stakeholders in the program (guarantors of individual measures at MA and SAIF, guarantors of the strategy at the Ministry of Agriculture, representatives of fishermen's associations, etc.) and a questionnaire survey among beneficiaries and applicants.

Implementation steps

Within the OP Fisheries, a total of 6 calls for project proposals have been opened since October 2015. The first two calls were opened in October 2015, 3th and 4th call later, at the beginning of May 2016. The launch of the 5th and 6th call and the reopening of the 2nd call of the OP Fisheries happened 11. 10. 2016, application forms have been made available already since 27. 9. 2016. Calls 1, 2, 4 and 5 were already completed, within other calls it is still possible to file applications (in the case of call no. 3 till 31. 12. 2023, in the call no 6. till 31. 12. 2018).

Until 31. 12. 2016, most of the measures of the OP were covered by calls for proposals, with the exception of measures 3.1, 5.1 and 5.2a, for which no call has been opened yet (a call for proposal is planned for April 2017). On the contrary, the measure 2.2 has been included in 3 calls, that corresponds to its significance given by the allocation of specific objective 2.B (see above). All the measures falling under the Union Priority 2, i.e. the most important part of the OP Fisheries in terms of financial allocation, have been covered with at least one call.

Achieved progress and results for every specific objective of the OP Fisheries (as to 31. 12. 2016)

Within the measure 2.1, a total of 5 applications were registered, and 2 of the projects were approved on the same date, which represents roughly one-tenth of the target value. As a result of these investments, increase in aquaculture production by 2.9 tonnes per year is expected. Realization of currently approved projects (i.e. projects with published Decision) should contribute to the target value of the indicator *Change in the volume of aquaculture production* by 18 %. The fulfilment of indicators and target measures can be considered as realistic in principle.

Within the measures 2.2 and 2.3 a total of 264 applications were registered and a total of 69 projects have been already approved. It is assumed that implementation of these projects will contribute nearly by one half to meet the target value of the indicator *Change in the volume of aquaculture production*. As a result of these investments, increase in volume of aquaculture production of 85.4 tonnes per year is expected. Absorption of recipient definition, respectively a requirement of minimum annual production was proved to be a limiting factor in the measure in the course of implementation. For the autumn 2016 (the 5th call) call the recipient definition was modified, even the smaller firms were allowed to draw on. In terms of meeting the programme objectives in measures 2.2 and 2.3, it is essential that potential applicants consider the support investments in aquaculture to be the most attractive instrument of the OP Fisheries.

Under the **measure 2.4** a total of 33 applications were registered, of which 12 applications have been already approved. Therefore, more than a half of the target (expected) number of supported projects have already been approved. The number of projects overall meets more than 60 % of the indicator monitoring the volume of production of recirculation systems and almost a third of the indicator *Value of aquaculture production from recirculation systems and flow system with water purification*.

Within the measure 2.5 a total of 4 applications were approved. These projects meet nearly 40 % of the target value of the volume of eel introduced. The definition of the recipients' eligibility as "aquaculture company" was to some extent identified as a limiting factor of call settings, as natural community of recipients in the Czech Republic mostly does not fulfil this definition (this is about setting resulting from the legislative environment, though).

Up to 31. 12. 2016 a total of 87 projects with Decision were registered within the UP 2 with the required amount of support 114.3 million CZK. At the same time, there is a sufficient reservoir of applications, which are currently in the assessment phase. In the case of smooth administration of payment applications, the fulfilment of **financial and substantive milestone** can be expected.

Due to the fact, that no call has been launched for the measures under the specific objective 3.A, measure 3.1 up to 31. 12. 2016, and therefore no project applications have been filed, the degree of substantive progress in implementation cannot be at this stage assessed. Within the call for proposal planned for April 2017 a total of 2.4 million EUR should be allocated on projects in measure 3.1, i.e. full financial allocation for the measure. Negotiations between the applicant and MA about the nature of the planned interventions within the measure 3.1 are currently taking place, assuming the implementation of two projects.

Within the measure 3.2, there were no project applications registered up to 31. 12. 2016, the applications to the open call no. 6 is possible to fill until the end of 2018. Since there are no beneficiaries' commitments to the fulfilment of indicator values not even at the level of registered applications, the degree of fulfilment of the substantive progress within the specific objective 3.B cannot be assessed at this stage. According to the existing information, the first requests for support should be submitted at the beginning of the year 2018 and in terms of the measure fulfilment progress, the realization of approximately 2 projects a year is expected. In the first phase, projects mainly aimed at technical publication for people responsible for the monitoring and controlling of the fishing activities and also on training and exchange programmes (including the exchange between Member States) for people responsible for the monitoring and controlling the fishing activities should be implemented. An interest for these activities was indicated by the target groups. Fulfilment of measure 3.2 objectives appears realistic.

Up to 31. 12.2016, no application was submitted within the UP 3. With regard to the planned activities within the measure 3.1. *The collection of data* it can be assumed that in 2018 **the substantive milestone** will be of 100 % achieved (i.e. one project aimed at supporting collection, management and use of data will be terminated). Achieving **financial milestones** cannot be currently estimated, because the expected value of the study it is not known yet. Other projects in this measure are planned after the end of the study (i.e. after 2018).

In the **measures 5.1 and 5.2, intention a)** any applications for support were registered, since any call for proposal aimed at the fulfilment of this measure (calls are planned for April 2017) has not been announced. Therefore, no commitment values for the indicators fulfilment are available and not even at the level of project applications. Future development depends primarily on the interest of the applicants for these activities, which is so far due to the conditions uncertain.

Although the call no. 3 covering the **measure 5.2, intention b)** was announced back in May 2016, there was no project approved within the measure 5.2 up to 31. 12. 2016. Thanks to that, no values of monitoring indicators are committed so far. Up to date a total of 7 applications were registered, for one application the administration was terminated. The required financial resources across all applications are equal to 4.4 million CZK (162 000 EUR), that is approximately 10 % of the allocation for call no. 3. The call is announced as interim (until 31. 12. 2023) and therefore, the drawing of all funds is still real.

Within the **measure 5.3** a total of 3 projects aimed at processing of products were approved, which is less than 10 % of the expected number of projects. As of 31. 12. 2016, 9% of the projects fulfils almost half of the target value of the production of fish processed. With the current development it can be assumed, that the value of the indicator *95210 Production of processed fish* should be achieved².

Fulfilment of the **substantive milestone** which is related to the Number of processing fish-oriented projects (MI 96401) can be evaluated as a very real – at the end of the year 2016 already 3 projects were approved and another 18 applications were in administration. Of the total applications submitted a total of 16 applications plan to propose the request for payment till the end of 2018, which would mean meeting the milestone on 380 %. **Financial milestone** is currently fulfilled with committed values from 3.8 %. In the case of smooth implementation of all currently administered projects it can be expected to fulfil the milestone of 54.3 %. Although MA OP Fisheries currently has a sufficient number of projects in the administration to fulfil the financial milestone, 2 of these projects are expected to be completed in May 2019. Achieving financial milestone for 2018 is therefore jeopardize.

Achieving financial milestone for the year 2018 is realistic only when a call for proposal will be opened in spring 2017 and when there will be sufficient absorption capacity.

Up to 31. 12. 2016 in the **measure Technical assistance** a total of 17 applications were registered and a total of 9 projects were approved with a total financial support of 7.4 million CZK, that is approximately 11.9 % of the total measure allocation. Due to the number of projects just before the approval, it is likely that the percentage of the committed finances will be increased in the near future. Realization of one project has been already completed (arrangement of the annual Conference to OP Fisheries), most projects assume their physical implementation in 2016 and the proposing of request for payment in 2017. Achieved values of most internal indicators are so far zero. Commitments of the approved projects meet 52 % of the target values of the indicator 80600 *Number of*

² Verification study implies that the method for value aggregation of this indicator have to be clarified in the case where one recipient request for support repetitively (in order to prevent repeated loading of same production).

institutions, working and advisory groups meetings. In the case of indicator 82200 *Purchase of materials, goods and services needed to ensure the implementation of the programme* so far 0.5 % of the target value is committed and 0.4 % achieved.

Expected results of PA assessment

Based on the analysis of the financial and substantive programme fulfilment it was found that the program potentially contributes to the strengthening of biodiversity and nature and landscape protection (primarily by keeping the eel in river basin, the contribution of UP 3 interventions is in this respect indirect/marginal). The programme also contributes to the reduction of energy consumption and to the resource savings in technological processes in aquaculture by investments in modernization and renewal of technological equipment for fish farming and the equipment for intensive fish farming.

The contribution of the program can be also found in the contribution to increasing the competitiveness of aquaculture producers, primarily by modernization and reconstruction of technological equipment of producers and related infrastructure and by expansion of intensive fish farming practices, partly also by supporting investment in technology of products processing. Contribution in the form of innovative production practices can expect rather insignificant, as well as the effects of diversification of activities of producers. Similarly, when a contribution of UP 3 interventions is expected, then only indirect and marginal.

Based on the current state of implementation and assessment of the available potential the programme rather does not improve the management and efficiency of strategic processes within the sector.

Evaluation of horizontal principles

The Principle of partnership

Measures taking into account **the principle of partnership** policy are actively applied within the implementation of the OP Fisheries. In the implementation of the OP Fisheries all relevant partners are involved and the degree of their involvement is adequate. Partners are involved in the programme implementation through the established platforms that are found to be functional and positively contribute to the principle of partnership implementation. In particular, partners are involved through the participation in the Monitoring Committee, as well as in Planning Commissions and Expert groups for OP Fisheries. There is a wide range of actors involved in the platforms, including relevant bodies and joint meetings of partners that contribute to the solution of fundamental aspects related to the implementation of the OP Fisheries.

Equal opportunities

Information about the principle of **equal opportunities for women and men and non-discrimination** and respect for the rules of this principle are specified in the programming and executive documentation of the OP Fisheries (i.e. in the programming document and in the Guidelines for applicants). Set up mechanisms taking into account the principle of equal opportunities are applied for all measures of the OP Fisheries so that relevant aspects of projects are pursued within the grant applications. At the same time, it was verified that all projects with identified negative effect on equal opportunities were formally excluded from the programme support. On the basis of investigation, it can be concluded that none of the OP Fisheries projects has proven negative effect on promoting equality between women and men and that there is no discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.

Sustainable development

As it was found, the information about the principle of **sustainable development** and the rules of compliance with this principle, are specified in the programming and executive documentation of the OP Fisheries (i.e. in the programming document and in the Guidelines for applicants), and relevant aspects of projects are pursued within the grant applications. It was verified that none of the approved projects of the OP Fisheries declare provably negative impact on sustainable development. According to the findings, more than two thirds (68%) of the OP Fisheries projects have positive effect on sustainable development, the most within the measure 2.2 aimed at saving energy consumption in aquaculture, more environmentally friendly aquaculture and more efficient use of resources. In terms of contribution of the OP Fisheries to sustainable development within the fulfilment of the environmental indicators it is currently under implementation phase introducing 762 kg of an eel and it can be expected that the total contribution of the OP Fisheries to sustainable development will correspond to the projected value of 2000 kg of the introduced eel. By contrast, so far in current phase of programme implementation no exchange of production equipment for more energy-efficient one was supported.

Climate change

The indicative amount of the contribution to the objectives in the area of climate change is fulfilled in the current phase of programme implementation only by projects with published Decision, which is at 1.6 %. Given the fact that no funds have yet been reimbursed for any resources, it is not possible to evaluate the fulfilment of the contribution based on the invoiced payment requests.

1 ÚVOD

Zakázka „**Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství**“ byla zahájena dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společnostmi Naviga 4, s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o.

Hodnocení v rámci realizované evaluace je zaměřeno na **dva hlavní okruhy – procesní a výsledková evaluace**. Cílem procesního hodnocení je posouzení nastavení implementační struktury a identifikace slabých míst v systému OP Rybářství. Cílem výsledkové evaluace je ověřit relevanci programu vzhledem k novým podmínkám (změny v odvětví akvakultury, změny rozvojových potřeb), posouzení vhodnosti nastavení indikátorové soustavy a relevance komplementárních vazeb. Obsahem výsledkové evaluace je také zpracování pre-evaluační studie, jejímž cílem je nastavit vhodný mix metod, které budou sloužit k vyhodnocování OP Rybářství 2014 – 2020.

Cílem předkládaného **Finálního hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-2020 a horizontálních témat** je provést hodnocení dosavadních výsledků OP Rybářství k 31. 12. 2016. Hodnocen je věcný pokrok implementace programu (naplnění hodnot monitorovacích indikátorů), který je vzhledem k rané fázi implementace doplněn o kvalitativní komentář k realizovaným projektům, podaným žádostem a plánovaným výzvám. Předkládaná studie obsahuje také vyhodnocení principů partnerství, opatření k prosazování rovnosti mužů a žen, opatření k udržitelnému rozvoji a vyhodnocení cílů v oblasti změny klimatu.

2 STRUČNÝ POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ

Finální hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-2020 a horizontálních témat je jedním z výstupů této veřejné zakázky a zaměřuje se na část výsledkové evaluace. Cílem zprávy je aktualizace analýzy věcného pokroku v plnění cílů OP Rybářství, hodnocen je tedy dosavadní pokrok v plnění nastavených indikátorů programu, doplněný o informace o finančním pokroku. Součástí zprávy je také hodnocení horizontálních témat, které by mělo sloužit jako podklad pro vypracování rozšířené Výroční zprávy o implementaci OP Rybářství.

Informace ve zprávě uvedené jsou založeny na analýze plnění indikátorů z dat z MS2014+ generovaných k 31. 12. 2016 ze strany MMR-NOK, doplněné informacemi o schválených projektech (závazky příjemců) a podaných žádostech (ŘO OPR). V rámci přípravy Závěrečné zprávy byly tedy aplikovány metody data mining a provedena analýza dat z MS2014+ a z IS SZIF. Dále byl proveden desk research a analýza výzev (harmonogramy výzev, vyhlášené výzvy).

S ohledem na aktuální fázi implementace OP Rybářství nenastal prozatím výraznější pokrok v plnění cílů programu. Zhodnocení je tedy provedeno na úrovni výstupů (jelikož žádné výsledky zatím nebyly dosaženy), případně je uveden kvalitativní komentář vycházející z předpokladu naplnění výstupů a výsledků aktuálně realizovanými projekty a projekty, které jsou v současné době ve fázi hodnocení. Vzhledem k počáteční fázi implementace OP je obtížné provádět vyhodnocení očekávaných výsledků uvedených v Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020 a vyhodnocení efektivity dosažených cílů. Toto hodnocení je v předkládané zprávě provedeno prozatím jen rámcově, dle pre-evaluační studie je doporučeno kompletní hodnocení realizovat až pro Zprávu o pokroku 2019, tedy v evaluaci na přelomu let 2018 a 2019.

3 IMPLEMENTACE OP RYBÁŘSTVÍ 2014-2016

Operační program Rybářství je nástrojem pro čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) a přispívá také k plnění cílů Společné rybářské politiky. Operační program Rybářství 2014 - 2020 byl schválen Evropskou komisí dne 2. 6. 2015.

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Dále je program zaměřen na rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a na zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh, včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Program se tak zaměřuje na jedné straně na rozvoj tradičních forem akvakultury a na straně druhé na podporu zavádění moderních intenzivních chovných systémů, především pro produkci lososovitých ryb, případně dalších druhů.


Cíle OP Rybářství jsou naplňovány prostřednictvím tří věcně zaměřených **priorit Unie**³ vycházejících z ENRF:

- Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
- Priorita Unie 3: Podpora provádění společné rybářské politiky
- Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

Na jednotlivé priority Unie (PU) jsou navázány specifické cíle, v rámci nichž jsou definována opatření přispívající k dosažení těchto specifických cílů. Struktura věcných PU a specifických cílů operačního programu Rybářství 2014 – 2020 je znázorněna ve schématu níže.

³ Priorita Unie 6 je zaměřena na technickou pomoc.

Schéma 1: Struktura operačního programu Rybářství 2014 – 2020

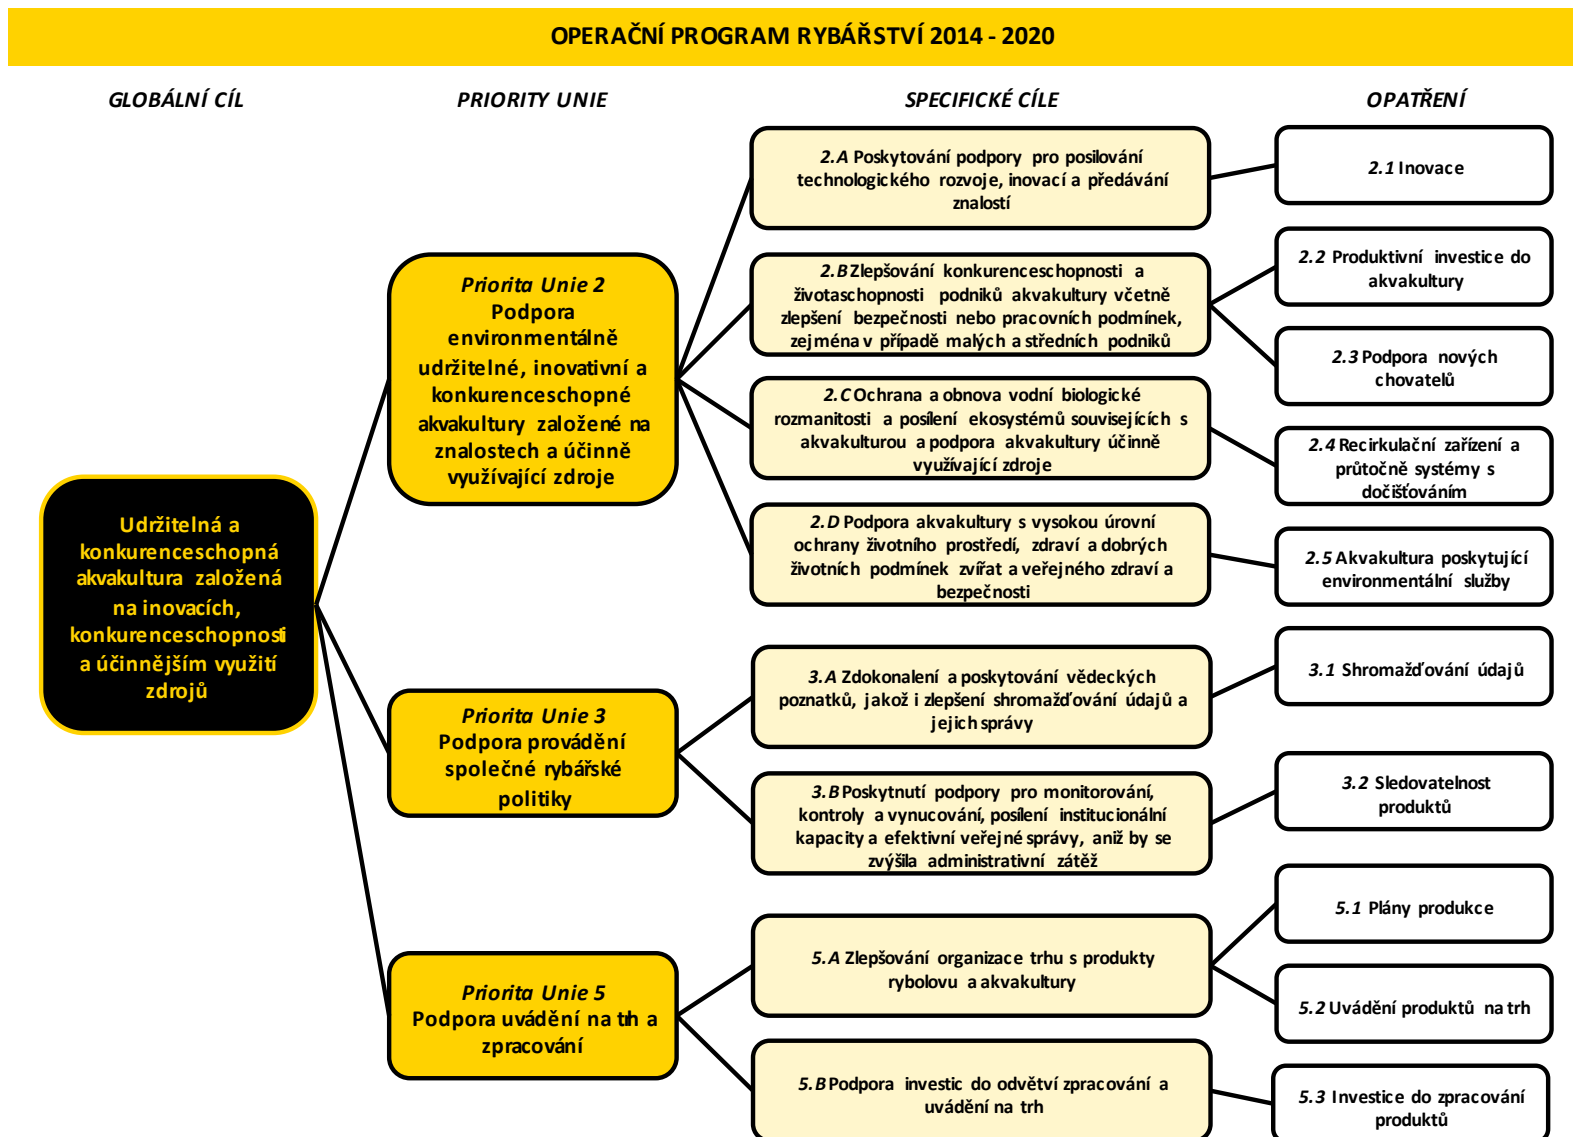

Operační program Rybářství si stanovil **5 priorit**, k jejichž naplňování jednotlivé specifické cíle (a k nim příslušná opatření) směřují:

- Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
- Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
- Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
- Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
- Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Celková finanční alokace Operačního programu Rybářství je 41,16 mil. EUR (1 113,1 mil. Kč). Rozdělení alokace na úrovni Priorit Unie a specifických cílů ukazuje tabulka níže. Přibližně dvě třetiny prostředků (66 %) jsou přiděleny na Prioritu Unie 2, přičemž v rámci této PU jsou prostředky mezi specifické cíle rozděleny poměrně nerovnoměrně. Nejvyšší alokaci v rámci programu má specifický cíl 2.B *Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků* s přidělenými prostředky ve výši 19,0 mil. EUR (514,1 mil. Kč). Naopak specifické cíle 2.A a 2.D patří k těm s nejnižší alokací v rámci programu. Druhou nejvíce podporovanou prioritou je PU5, na kterou je alokováno 8,0 mil. EUR (215,5 mil. Kč) (téměř pětina celkové alokace), Priorita Unie 3 má stanovenou alokaci ve výši 7,8 % všech prostředků a Technická pomoc (PU 6) má 5,5 % celkové alokace.

Tabulka 1: Alokace OP Rybářství dle specifických cílů

Priorita Unie	Specifický cíl	Celková alokace (Kč)	Celková alokace (EUR)
2	2.A	34 886 968	1 289 960
	2.B	514 069 737	19 007 940
	2.C	160 539 151	5 918 640
	2.D	70 017 405	1 479 660
	PU 2 celkem	749 043 729	27 696 200
3	3.A	66 024 113	2 441 269
	3.B	21 035 000	777 778
	PU 3 celkem	87 059 113	3 219 047
5	5.A	99 530 468	3 680 180
	5.B	115 947 865	4 287 220
	PU 5 celkem	215 478 333	7 967 400
6	6.A	61 565 238	2 276 400
	PU 6 celkem	61 565 238	2 276 400
OP Rybářství celkem		1 113 146 413	41 159 047

Postup implementace

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. V tabulce níže je uveden přehled vyhlášených i plánovaných výzev OP Rybářství. První dvě výzvy byly vyhlášeny v říjnu 2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2015. Vyhlášení 5. a 6. výzvy a pokračování 2. výzvy OP Rybářství proběhlo 11. října 2016. Výzvy č. 1, 2, 4 a 5 již byly ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v případě 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018).

Tabulka 2: Přehled výzev OP Rybářství

Číslo výzvy	Priorita Unie	Specifický cíl	Opatření	Stav výzvy (k 31.12.2016)	Alokace výzvy (Kč, EUR)	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí
0	PU 6	Technická pomoc	Technická pomoc	otevřená	61,5 mil. Kč 2,3 mil. EUR	21. 10. 2015	31. 12. 2023
1	PU 2 PU 5	2.A; 2.B; 2.C; 5.B	2.1; 2.2a); 2.4; 5.3	uzavřená	243,2 mil. Kč 9,0 mil. EUR	21. 10. 2015	3. 11. 2015
2	PU 2	2.D	2.5	ukončená	40,0 mil. Kč 1,48 mil. EUR	21. 10. 2015	31. 10. 2016
3	PU 5	5.A	5.2b)	otevřená	45,0 mil. Kč 1,67 mil. EUR	3. 5. 2016	31. 12. 2023
4	PU 2	2.B; 2.C;	2.2b); 2.3;	uzavřená	70,5 mil. Kč 2,61 mil. EUR	3. 5. 2016	17. 5. 2016
5	PU 2 PU 5	2.B; 2.C; 5.B	2.2a); 2.4; 5.3	uzavřená	400 mil. Kč 14,8 mil. EUR	11. 10. 2016	31. 10. 2016
6	PU 3	3.B	3.2.	otevřená	10,5 mil. Kč 0,39 mil. EUR	11. 10. 2016	31. 12. 2018
7	PU 5	5.A	5.1.	plánovaná	6,0 mil. Kč 0,22 mil. EUR	duben 2017	31. 12. 2018
8	PU 5	5.A	5.2.	plánovaná	2,0 mil. Kč 0,08 mil. EUR	duben 2017	31. 12. 2017
9	PU 2 PU 5	2.B; 2.C; 5.A	2.2; 2.3; 5.2.	plánovaná	92,4 mil. Kč 3,42 mil. EUR	duben 2017	duben 2017
10	PU 3	3.B	3.1.	plánovaná	65,9 mil. Kč 2,44 mil. EUR	duben 2017	31. 12. 2023

Pozn.: Dle informací ŘO je na podzim 2017 plánováno vyhlášení 11. výzvy, se zaměřením na opatření (záměry) 2.1, 2.2a), 2.4 a 2.5.

Jednotlivé výzvy OP Rybářství pokrývají i více opatření, zaměření výzev dle opatření znázorňuje tabulka níže. K 13. 12. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1, 5.1 a 5.2a), pro které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva⁴. Naopak opatření 2.2 je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá jeho významnosti vzhledem k větší alokace specifického cíle 2.B (viz výše). Všechna opatření spadající pod Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou dle zjištění pokryta alespoň jednou výzvou.

⁴ Dle harmonogramu výzev na rok 2017 budou výzvy pro opatření 3.1, 5.1 a 5.2a) vyhlášeny v průběhu roku 2017.

Tabulka 3: Vyhlášené výzvy pokrývající jednotlivá opatření OP Rybářství 2014 - 2020

výzva / opatření	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	5.1	5.2	5.3	6.1
0. výzva											
1. výzva											
2. výzva											
3. výzva											
4. výzva											
5. výzva											
6. výzva											
celkem výzev pokrývajících opatření	1	3	1	2	1	0	1	0	1	2	1

4 DOSAŽENÝ POKROK A VÝSLEDKY OP RYBÁŘSTVÍ

4.1 Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

4.1.12. A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

Specifický cíl 2.A je naplňován jedním opatřením - **2.1. Inovace**, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zaváděním nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů. Celkové finanční prostředky alokované k naplňování tohoto opatření činí 1,29 mil. EUR.

Na projekty opatření 2.1. Inovace dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
1	priorita unie 2, 5	2.A, 2.B, 2.C, 5.B	2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015

Ve výzvě bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2), přičemž dílčí alokace pro opatření 2.1 v rámci této výzvy činila 11,6 mil. Kč (429 tis. EUR). Dle informací ŘO je vyhlášení výzvy zahrnující opatření 2.1 (11. výzva) plánováno na podzim 2017.

Analýza finančního pokroku

Tabulka 4 - Finanční pokrok realizace Specifického cíle 2.A

Priorit a Unie	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným ROPD (%)	Finanční prostředky v proplacených ŽOPL (%)
PU2	2.1	1 289 960	34 828 920	3,6%	0 %

V rámci specifického cíle bylo v projektech s vydaným rozhodnutím závazkováno 3,6 % alokované částky.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 5: Přehled kontextových indikátorů – opatření 2.1

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / Interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
95100	Objem produkce akvakultury	kontextový	Hlavní	t	19 555	103,3
95500	Hodnota produkce akvakultury	kontextový	Hlavní	tis. EUR	44 794	103,3
95105	Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek v akvakultuře	kontextový	Interní	FTE	1 442	85,1

Tabulka 6: Přehled ostatních indikátorů – opatření 2.1

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / Interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95110	Změna objemu produkce akvakultury	výsledkový	Hlavní	t	16	2,9	18,1	0
95510	Změna hodnoty produkce akvakultury	výsledkový	Hlavní	tis. EUR / rok	34	6,2	18,4	0
95515	Udržení objemu akvakulturní produkce	výsledkový	Hlavní	t	200	0	0	0
96002	Počet projektů zaměřených na inovace, poradenství a pojištění	výstupový	Hlavní	projekty	18	2	11,1	0
96201	Počet realizovaných produktových inovací	výstupový	Interní	inovace	9	0	0	0
96202	Počet realizovaných procesních inovací	výstupový	Interní	inovace	14	2	14,3	0

K 31. 12. 2016 bylo v rámci opatření 2.1 zaregistrováno celkem 5 projektů. Ke stejnému datu jsou vydaná Rozhodnutí u 2 projektů, což představuje zhruba desetinu očekávaného počtu projektů. U zbývajících projektů byla ukončena administrace.

V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. K naplnění cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury by měla přispět realizace projektů s vydaným Rozhodnutím zhruba 18 %. Podobný příspěvek k naplnění cíle lze očekávat rovněž u indikátoru Změna hodnoty produkce akvakultury. Z hlediska interních indikátorů projekty s vydaným Rozhodnutím naplňují přibližně z 14 % plánovaný počet realizovaných procesních inovací.

Metodické poznámky k monitorovacím ukazatelům

U hodnot následujících ukazatelů byly shledány metodické nedostatky, nebo nebyly dosud sledovány:

- Změna objemu produkce akvakultury
- Změna hodnoty produkce akvakultury
- Udržení objemu produkce akvakultury

V říjnu 2016 EK vydala aktualizovanou příručku pro monitoring a vykazování ukazatelů OP Rybářství, ve které nově požaduje sledování ukazatelů produkce na úrovni celého podniku. Tato nová metodika není v současné době ze strany ŘO OP Rybářství zavedena.


Výchozí a cílové hodnoty na úrovni projektů budou muset být u žadatelů došetřeny došetřeny. Toto by bylo dobré provést do konce roku 2017 a dále na základě nového vyhodnocení dosavadní implementace opatření změnit následně příslušné hodnoty v programovém dokumentu (v rámci revize). Revize OP musí být schválena Evropskou komisí do konce roku 2018, doporučuje se tedy nechat projednat návrh na revizi OP na jarním zasedání MV v roce 2018.

Potenciál dalšího plnění opatření

Opatření 2.1

Z průzkumu potenciálních žadatelů, kteří deklarovali záměr žádat o podporu OP Rybářství, cca třetina (16 respondentů) uvedla jako plánované opatření Inovace (2.1). Lze proto konstatovat, že existuje prostor pro další naplňování cílů opatření.

Graf 1: V rámci jakého opatření plánujete žádat o podporu na váš projektový záměr?

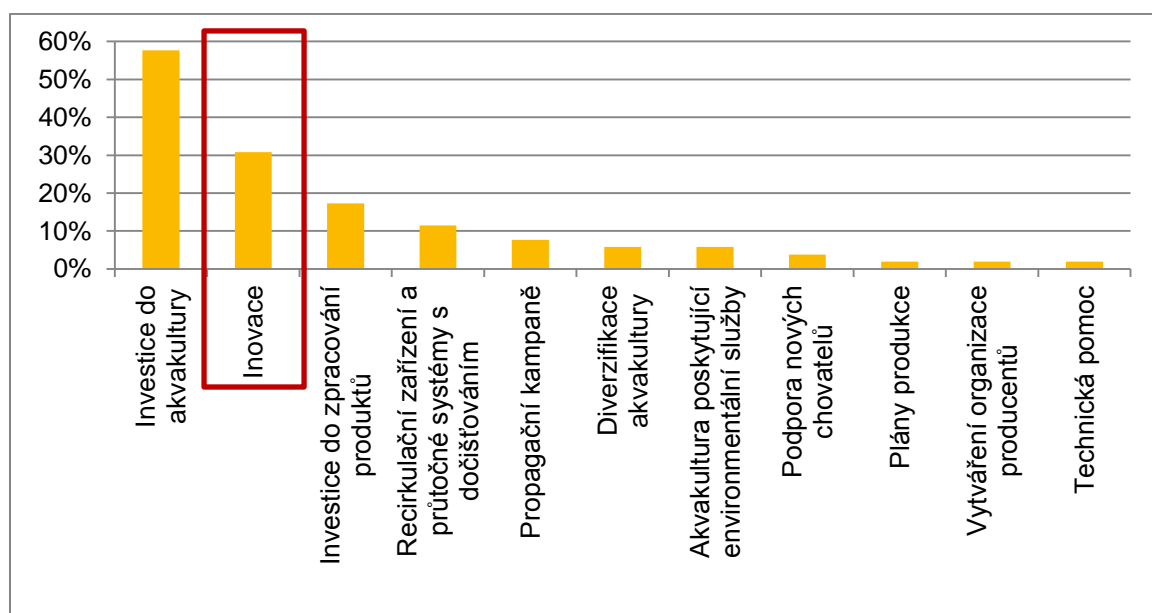

Jako bariéry vnímané žadateli pro podání žádosti jsou obecně nejčastěji uváděny důvody spadající do kategorií:

- Obavy z administrativní a procesní náročnosti.
- Negativního sentimentu žadatelů a příjemců z minulých zkušeností, kdy zisk z podpory je vnímán jako neadekvátní riziku a nákladům spojeným s realizací projektu, především v kontextu kontrol a auditů operací.

V rámci bariér vnímaných **potenciálními žadateli** administrativní a procesní náročnost a negativní zkušenost převažují nad věcnými bariérami, dostupnou mírou podpory a věcnými omezeními (zaměřením projektu a vymezením způsobilosti nákladů), byť i takové bariéry vnímány jsou. Záměrem řídicího orgánu OP Rybářství je rozšíření definice způsobilého žadatele o veřejnoprávní subjekt v nadcházející výzvě.

„Čerpal jsem v minulosti. Bohužel, cena projektu byla mnohem vyšší než by byla, pokud bych realizoval projekt sám z vlastních zdrojů. Toto nastalo u vícero mnou realizovaných projektů“

„Složitá žádost, určitě dost peněz za vypracování, následně zbytečné a opakující se kontroly...“

Shrnutí

Z perspektivy dosažených hodnot ukazatelů není specifický cíl aktuálně naplňován.

Plnění ukazatelů v závazkových projektech je rovněž na spíše nízké úrovni, dosahuje pouze pětinu cílový hodnot. Pro roky 2017 a 2018 jsou plánovány dvě výzvy pro opatření 2.1. Potenciální žadatelé potvrzují zájem podat žádosti o podporu, ŘO zároveň přijal opatření pro odstranění formálních bariér absorpce, existuje tedy potenciál pro zvýšení míry naplňování cílů. V současnosti je však tato míra nízká.

4.1.2.2. B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

Specifický cíl 2.B je naplňován dvěma opatřeními - **2.2. Produktivní investice do akvakultury**, jehož záměrem jsou investice do akvakultury a její diverzifikace a **2.3. Podpora nových chovatelů**.

Cílem prvního opatření je zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje; zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury; výstavba rybníků; úspora spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů a rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře. Hlavním cílem druhého opatření je umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti.

Celková alokace pro opatření 2.2. je 16,77 mil. EUR, u opatření 2.3. činí celková alokace 2,24 mil. EUR.

Na projekty opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury a 2.3 Podpora nových chovatelů dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
1	priorita unie 2, 5	2.A, 2.B, 2.C, 5.B	2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015
4	priorita unie 2	2.B, 2.C	2.2. záměr b), 2.3.	3. 5. 2016 - 17. 5. 2016
5	priorita unie 2, 5	2.B, 2.C, 5.B	2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	11. 10. 2016 - 31. 10. 2016

Ve výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). V první polovině roku 2017 je plánovaná další výzva ve vztahu k SC 2. B (výzva č. 9), zaměřená na projekty naplňující opatření 2.2. (záměr b), a 2.3. Dle informací ŘO je na podzim 2017 plánováno vyhlášení další výzvy zahrnující opatření 2.2, záměr a) (11. výzva).

Počet projektů v rámci opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů v jednotlivých fázích k 31. 12. 2016:

Opatření	Podopatření / záměr	Výzva	Období příjmu žádostí	Počet zaregistrovaných žádostí	Fáze				
					KFNaP	Věcné hodnocení	Příprava Rozhodnutí	Rozhodnutí vydáno	Ukončeno adm.
2.2.	2.2. záměr a)	1	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015	100	00	00	00	67	33
2.2.	2.2. záměr a)	5	11. 10. 2016 - 31. 10. 2016	146	136	-	-	-	10
2.2.	2.2. záměr b)	4	3. 5. 2016 - 17. 5. 2016	4	0	0	2	-	2

Opatření	Podopatření / záměr	Výzva	Období příjmu žádostí	Počet zaregistrovaných žádostí	Fáze				
					KFNaP	Věcné hodnocení	Příprava Rozhodnutí	Rozhodnutí vydáno	Ukončené adm.
2.3.	2.3.	4	3. 5. 2016 - 17. 5. 2016	14	0	0	1	2	11

Analýza finančního pokroku

Tabulka 7 - Finanční pokrok realizace SC 2.2 a 2.3

Priorita a Unie	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným ROPD (%)	Finanční prostředky v proplacených ŽOPL (%)
PU 2	2.2 a)	15 287 999	412 775 960	14,2%	0 %
	2.2 b)	1 481 481	40 000 000	0,0%	0 %
	2.3	2 238 460	60 438 420	4,6%	0 %

V rámci specifického cíle bylo v projektech s vydaným rozhodnutím závazkováno 14,2 % v případě opatření 2.2 a) a 4,6 % v případě opatření 2.3.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 8: Přehled kontextových indikátorů – opatření 2.2 a 2.3

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / Interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
95100	Objem produkce akvakultury	kontext	Hlavní	t	19 555	103,3
95500	Hodnota produkce akvakultury	kontext	Hlavní	tis. EUR	44 794	103,3
95105	Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek v akvakultuře	kontextový	Interní	FTE	1 442	85,1

Tabulka 9: Přehled ostatních indikátorů – opatření 2.2 a 2.3

ID	Název indikátoru	Typ	Jed- notka	Hlavní / Interní	Cílová hodn.	Záva- zek	Závazek (v %)	Dosaže ná hodn. (v %)
95110	Změna objemu produkce akvakultury	výsledko vý	t	Hlavní	208	85,4	41,1	0
					z toho 2.2	85,4	41,1	0
					z toho 2.3	0	0	0
95510	Změna hodnoty produkce akvakultury	výsledko vý	tis. EUR	Hlavní	458	184,0	40,2	0
					z toho 2.2	184,0	40,2	0
					z toho 2.3	0	0	0
95515	Udržení objemu akvakulturní produkce	výsledko vý	t	Hlavní	1400	11 624	830,3	0
					z toho 2.2	11 612,4	829,5	0
					z toho 2.3	11,6	0,8	0
96001	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	výstupov ý	projekt y	Hlavní	415	67	16,1	0
					z toho 2.2	67	16,1	0
					z toho 2.3	-	-	-
96003	Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti akvakultury	výstupov ý	projekt y	Hlavní	40	2	5	0
					z toho 2.2	-	-	-
					z toho 2.3	2	5	0
Interní indikátory – opatření 2.2								
96301	Počet podpořených výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější	výstupov ý	zaříze ní	Interní	30	0	0	0
96501	Příjmy z podpořených doplňkových aktivit mimo akvakulturu	výstupov ý	Kč	Interní	39 000 000	0	0	0
96502	Příjmy z podpořených doplňkových aktivit - diverzifikace v rámci druhů ryb	výstupov ý	Kč	Interní	4 000 000	0	0	0
96503	Příjmy z podpořených doplňkových aktivit - diverzifikace v rámci rybářské turistiky	výstupov ý	Kč	Interní	35 000 000	0	0	0
96801	Počet nově vybudovaných rybníků	výstupov ý	rybník	Interní	1	12	1 200	0

ID	Název indikátoru	Typ	Jed- notka	Hlavní / Interní	Cílová hodn.	Záva- zek	Závazek (v %)	Dosaže ná hodn. (v %)
96901	Množství vytěženého bahna z rybníka/loviště	Výstupový	m3	Interní	115 385	29 275	25,4	0
96902	Množství vytěženého bahna z rybníka/loviště přímo použitelného na zemědělský půdní fond	výstupový	m3	Interní	3 000	0	0	0
97001	Počet zařízení podpořených na ochranu proti rybožravým predátorům	výstupový	zaříze ní	Interní	38	0	0	0
Interní indikátory – opatření 2.3								
95901	Počet podpořených nových chovatelů	výstupový	subjek ty	Interní	40	2	5	0

* ekvivalenty plného pracovního úvazku

Pozn.: Interní indikátory pro opatření 2.2 a 2.3 se liší a jsou sledovány specificky vždy pouze pro dané opatření.

K 31. 12. 2016 bylo v rámci opatření 2.2. a 2.3. zaregistrováno celkem 264 žádostí (250 v rámci 2.2. a 14 v rámci 2.3.).

V případě interních indikátorů dokonce již došlo v jednom případě k několikanásobnému přezávazkování hodnoty indikátoru. Jedná se o indikátor **96801** sledující počet nově vybudovaných rybníků.

Metodické poznámky k monitorovacím ukazatelům

U hodnot následujících ukazatelů byly shledány metodické nedostatky, nebo nebyly dosud sledovány:

- Změna objemu produkce akvakultury
- Změna hodnoty produkce akvakultury
- Udržení objemu produkce akvakultury
- Změna čistého zisku
- Vytvořená pracovní místa
- Udržená pracovní místa

V říjnu 2016 EK vydala aktualizovanou příručku pro monitoring a vykazování ukazatelů OP Rybářství, ve které nově požaduje sledování ukazatelů produkce na úrovni celého podniku. Tato nová metodika není v současné době ze strany ŘO OP Rybářství zavedena.

Výchozí a cílové hodnoty na úrovni projektů budou muset být u žadatelů došetřeny došetřeny. Toto by bylo dobré provést do konce roku 2017 a dále na základě nového vyhodnocení dosavadní implementace opatření změnit následně příslušné hodnoty v programovém dokumentu (v rámci revize). Revize OP musí být schválená Evropskou komisí do konce roku 2018, doporučuje se tedy nechat projednat návrh na revizi OP na jarním zasedání MV v roce 2018

Potenciál naplnění opatření

Opatření 2.2

V případě opatření 2.2 záměr a), které je nosným opatřením v rámci operačního programu jsou v současnosti v hodnocení žádosti podané v rámci 5. výzvy, u které byl příjem žádostí ukončen 31. 10. 2016. Celkem bylo v této výzvě v rámci tohoto záměru podáno 146 žádostí s požadovanou výší podpory 181,9 mil. Kč. Ve srovnání s první výzvou v roce 2015 to znamená přibližně o polovinu vyšší počet žádostí a požadované výše podpory (100 podaných žádostí s požadovanou výší podpory 100 mil. Kč). K 31. 12. 2016 byla ukončena administrace u 10 podaných žádostí. U zbylých 136 probíhalo hodnocení.


Vzhledem k vysokému počtu podaných žádostí a dosavadním závazkům u výsledkových indikátorů, které se pohybují kolem 40 % cílové hodnoty (95110, 95510), je dosažení cílové hodnoty těchto indikátorů reálné a to i s ohledem na plánovaný harmonogram výzev.

Jako částečně rizikové se vzhledem k současnému počtu podpořených projektů jeví naplnění indikátoru 96001.

K 31. 12. 2016 bylo zazávkováno 67 projektů, tj. přibližně 16 % cílové hodnoty pro rok 2023. Ke stejnému datu je souhrnně v rámci opatření 2.2 evidováno celkem 250 žádostí. Z toho je, jak již bylo zmíněno, 67 projektů s Rozhodnutím, 2 žádosti jsou doporučeny a probíhá u nich příprava Rozhodnutí, dalších 136 je v hodnocení (žádosti v rámci 5. výzvy) a u 45 byla ukončena administrace. To znamená celkem 205 živých projektů. Stav při realizaci všech těchto živých projektů by tak hypoteticky odpovídal přibližně 49 % cílové hodnoty, která je pro opatření 2.2 stanovena na 415. Dosažení cílové hodnoty indikátoru 96001 tedy hodnotíme jako reálné, nicméně za předpokladu neklesající poptávky ze strany žadatelů.


V roce 2017 jsou plánovány na záměry v rámci opatření 2.2 dvě výzvy (výzva č. 9 pro opatření 2.2 záměr b) u kterého byl v předchozí výzvě zaznamenán velmi malý zájem žadatelů o toto opatření a výzva č. 11 pro opatření 2.2 záměr a), kde lze naopak očekávat stabilní poptávku ze strany žadatelů i podle výsledků dotazníkové šetření potenciálních žadatelů).

Graf 2: Umožnily Vám podmínky výzvy, včetně pravidel, připravit nebo realizovat Váš záměr plně v souladu s Vašimi potřebami?

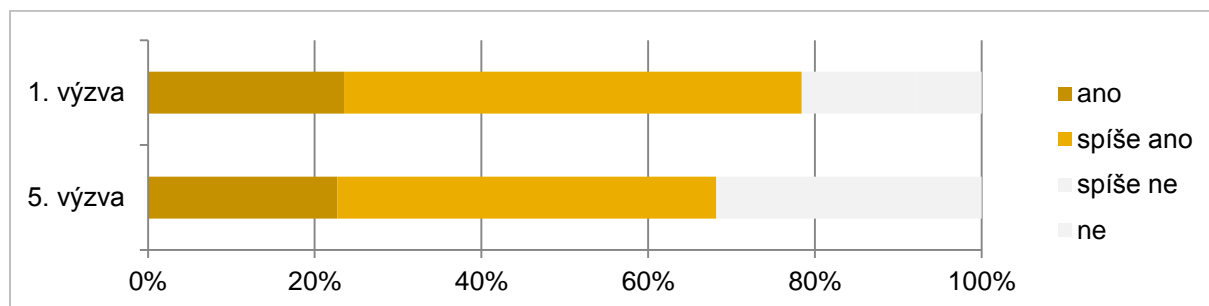

V opatření se v průběhu implementace ukázaly jako limitující faktory zužující potenciální okruh žadatelů. Na jedné straně existoval požadavek na minimální roční produkci, na straně druhé vyloučení „velkých podniků“ ze skupiny způsobilých žadatelů. Pro výzvu na podzim 2016 (pátá výzva) byla definice příjemce upravena a bylo umožněno čerpat i velkým podnikům, požadavek na minimální úroveň produkce byl vypuštěn.

Graf 3: Ve kterých aspektech by Vám úprava výzvy resp. pravidel umožnila připravit / realizovat záměr lépe v souladu s Vašimi potřebami?




Z hlediska souladu potřeb žadatelů a příjemců a podmínek výzev se jako „nejexponovanější“ aspekt jeví míra podpory⁵, podporované aktivity a opakovaně aspekt termínování výzvy.

Opatření 2.3

V případě opatření 2.3 jsou evidovány pouze 2 projekty s vydaným Rozhodnutím u zbylých 11 žádostí došlo k ukončení administrace, 1 žádost je ve stavu přípravy Rozhodnutí. Z provedeného dotazníkového šetření navíc vyplývá potenciální slabá absorpční kapacita (viz graf níže).

Hlavní výstupový indikátor zaměřený na podporu lidského kapitálu v akvakultuře plněn na úrovni 5 %. Ve vztahu k tomuto opatření se naplnění cílů jeví jako velmi problematické vzhledem k malému počtu podpořených projektů a potenciálně nízké absorpční kapacitě.


Graf 4: Umožnily Vám podmínky výzvy, včetně pravidel, připravit nebo realizovat Váš záměr plně v souladu s Vašimi potřebami?



Žadatelé a příjemci hodnotí potenciál podmínek výzvy pro opatření 2.3 převážně pozitivně. Rezervy v atraktivitě nastavení této výzvy byly spatřovány „tradičně“ v termínování, míře dostupné podpory a preferenčních kritériích.


⁵ Z hlediska kontextu nutno zmínit, že míra podpory vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), na základě kterého je operační program Rybářství vypracován a není možné v tomto aspektu měnit podmínky výzev.

Graf 5: Ve kterých aspektech by Vám úprava výzvy resp. pravidel umožnila realizovat záměr lépe v souladu s Vašimi potřebami?

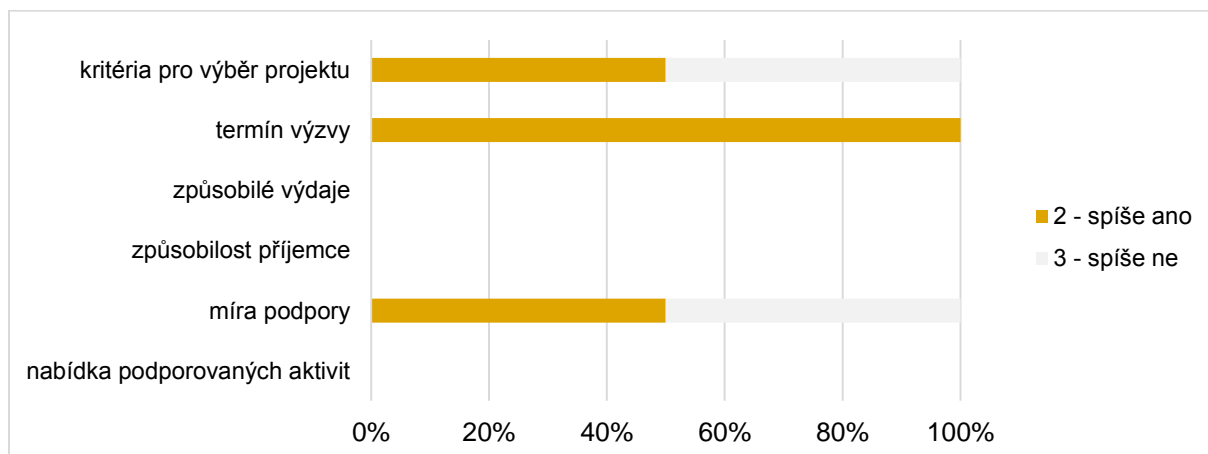

Z hlediska perspektivy naplnění cílů programu v opatřeních 2.2 a 2.3 je podstatné, že potenciální žadatelé považují podporu investic do akvakultury za nejatraktivnější instrument OP Rybářství. Více než polovina potenciálních žadatelů, kteří deklarují plány žádat o podporu v rámci programu, by žádali v rámci opatření 2.2.. Na rozdíl oproti tomu v případě opatření 2.3 je zájem potenciálních žadatelů o toto opatření velmi nízký, to představuje potenciální riziko z hlediska absorpční kapacity ve vztahu k plánovaným výzvám.

Graf 6: V rámci jakého opatření plánujete žádat o podporu na váš projektový záměr?

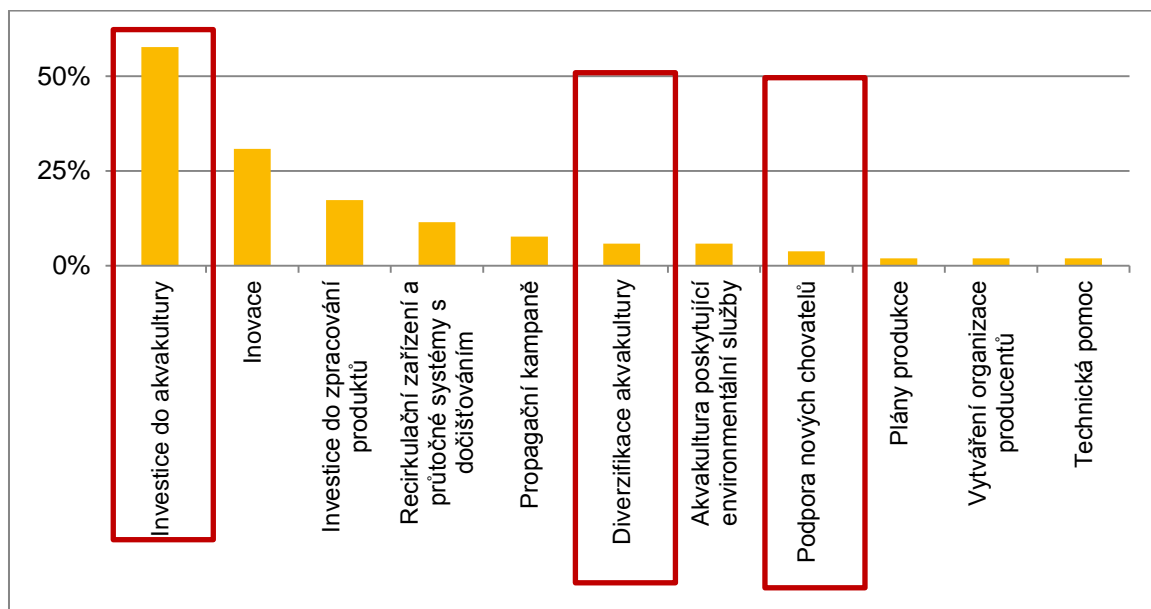

Shrnutí

Z perspektivy dosažených hodnot ukazatelů není specifický cíl aktuálně naplňován, avšak úroveň plnění ukazatelů v závazkových projektech a zásobníku žádostí celkově vytváří dostatečný potenciál pro naplnění specifického cíle.

Intervence zaměřené na produktivní investice do akvakultury (záměr a) dosahují přibližně poloviční úroveň plánovaných cílových hodnot, v zásobníku projektů je hodnoceno dalších 121 projektů. Pro roky 2017 a 2018 jsou plánovány dvě výzvy. Z pohledu cílové skupiny potenciálních žadatelů je intervence vnímána jako nejatraktivnější část programu, existuje tedy potenciál pro další zvýšení míry absorpce a naplňování cílů.

Intervence zaměřené na diverzifikaci činností a podpory vstupu nových chovatelů do odvětví je prozatím plnění cílů na velice nízké úrovni jak z hlediska aktuálního plnění, tak ověřitelného potenciálu vyjádřeného závazky a zájmem potenciálních žadatelů.

4.1.32. C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

Specifický cíl 2.C je naplňován jedním opatřením – **2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním**, jehož cílem je vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení a Rozvinutí intenzivní akvakultury založené na aplikaci moderních inovativních metod šetrných k životnímu prostředí.

Celková alokace pro opatření 2.4 činí 5,9 mil. EUR.

Na projekty opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
1	priorita unie 2, 5	2.A, 2.B, 2.C, 5.B	2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015
5	priorita unie 2, 5	2.B, 2.C, 5.B	2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	11. 10. 2016 - 31. 10. 2016

Ve výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). Dle informací ŘO je vyhlášení výzvy zahrnující opatření 2.4 (11. výzva) plánováno na podzim 2017.

Analýza finančního pokroku

Tabulka 10 - Finanční pokrok realizace SC 2.4

Priorit a Unie	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným ROPD (%)	Finanční prostředky v proplacených ŽOPL (%)
PU 2	2.4	5 918 640	159 803 280	30,1%	0 %

V rámci specifického cíle bylo v projektech s vydaným rozhodnutím závazkováno 30,1 % alokované částky.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 11: Přehled kontextových indikátorů – opatření 2.4

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / Interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
95100	Objem produkce akvakultury	kontextový	Hlavní	t	19 555	103,3
95300	Objem produkce systémů s recirkulací	kontextový	Hlavní	t	1 200	49,5
95500	Hodnota produkce akvakultury	kontextový	Hlavní	tis. EUR	44 794	103,3
95105	Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek v akvakultuře	kontextový	Interní	FTE	1 442	85,1

Tabulka 12: Přehled indikátorů – opatření 2.4

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Jednotka	Hlavní / Interní	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95310	Změna objemu produkce systémů s recirkulací	výsledkový	t	Hlavní	1 100	689	62,6	0
96001	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	výstupový	projekt	Hlavní	20	12	60	0
95514	Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů s dočišťováním	výsledkový	tis. EUR	Interní	4 074	1 190,8	29,2	0

K 31. 12. 2016 bylo v rámci opatření 2.4 zaregistrováno celkem 33 žádostí. V případě 6 žádostí byla administrace ukončena. U 12 projektů již nicméně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zazávazkována je tak již více než polovina očekávaného počtu podpořených projektů. Tento počet projektů celkově naplňuje více jak 60 % indikátoru sledujícího změnu objemu produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu indikátoru 95514.

Potenciál dalšího plnění opatření

Opatření 2.4

V současnosti jsou v hodnocení žádosti podané v rámci 5. výzvy, u které byl příjem žádostí ukončen 31. 10. 2016. V této výzvě bylo přijato 16 žádostí, o jednu méně než v 1. výzvě. U 1 žádosti byla ukončena administrace ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Pokud nedojde k dalšímu ukončení administrace u většího množství v současné době dále hodnocených 15 žádostí, je naplnění cílových hodnot hlavních indikátorů reálné již na základě realizace dosavadních projektů s Rozhodnutím a podmíněné realizace právě hodnocených žádostí. V roce 2017 je na projektové záměry v rámci opatření 2.4 plánována výzva č. 11.

Shrnutí

Z perspektivy dosažených hodnot ukazatelů není specifický cíl aktuálně naplňován, avšak úroveň plnění ukazatelů v závazkovaných projektech a zásobníku žádostí celkově vytváří dostatečný potenciál pro naplnění specifického cíle.

4.1.42. D Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

Specifický cíl 2.D je naplňován jedním opatřením – **2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby**, jehož cílem je vysazování úhoře říční do vnitrozemských vodních toků.

Celková alokace pro opatření 2.5 je 1,5 mil. EUR.

Na projekty opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
2	priorita unie 2	2.D	2.5.	21. 10. 2015 - 31. 10. 2016

Podle harmonogramu výzev pro rok 2017 není plánována na projekty opatření 2.5. Žádná výzva, respektive výzva je koncipována jako kontinuální, s periodickým příjmem žádostí.

Analýza finančního pokroku

Tabulka 13 - Finanční pokrok realizace SC 2.2 a 2.3

Priorit a Unie	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným ROPD (%)	Finanční prostředky v proplacených ŽOPL (%)
PU 2	2.5	1 479 660	39 950 820	10,0%	0 %

V rámci specifického cíle bylo v projektech s vydaným rozhodnutím závazkováno 10 % alokované částky.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 14: Přehled kontextových indikátorů – opatření 2.5

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / Interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
95100	Objem produkce akvakultury	kontextový	Hlavní	t	19 555	103,3
95500	Hodnota produkce akvakultury	kontextový	Hlavní	tis. EUR	44 794	103,3
95105	Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek v akvakultuře	kontextový	Interní	FTE	1 442	85,1

Tabulka 15: Přehled indikátorů – opatření 2.5

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
97110	Množství vysazeného úhoře	výstupový *	hlavní	kg	2 000	762	38,1	0
96702	Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí (environmentální řízení, systémy auditu, environmentální služby ekologické akvakultury)	výstupový	hlavní	projekt y	11	4	36,4	0

* V Programovém dokumentu OP R indikátor uveden jako výstupový, v tabulce dle MMR uveden jako výsledkový.

K 31. 12. 2016 bylo v rámci opatření 2.5 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace u 4 projektů. Tyto projekty naplňují téměř 40 % cílové hodnoty plánovaného množství vysazeného úhoře. Jako do určité míry limitující faktor nastavení výzev bylo identifikováno vymezení způsobilosti příjemce jako „podniku akvakultury“, kdy přirozená obec příjemců v podmínkách ČR toto vymezení převážně nenaplnuje. Z hlediska nastavení programu a výzvy se však jedná o vyšší moc vyplývající z legislativního prostředí.

Potenciál dalšího plnění opatření

V současné době jsou v ještě v hodnocení žádosti podané v rámci 2. výzvy, u které byl příjem žádostí ukončen 31. 10. 2016. V této výzvě bylo přijato celkem 9 žádostí. 4 žádosti, které byly podány v listopadu 2015, již byly schváleny a bylo u nich podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jak je uvedeno výše, tyto projekty naplňují téměř 40 % cílových hodnot hlavních indikátorů. V případě zbývajících 5 žádostí, které byly podány na konci října 2016, 4 již prošly věcným hodnocením, jedna žádost je ještě hodnocena. Dosažení cílových hodnot se tak v tomto ohledu jeví jako reálné. Pro rok 2017 není pro záměry v rámci opatření 2.5 v harmonogramu výzev a přehledu plánovaných alokací výzev evidována žádná výzva. Dle informací zástupců ŘO je nicméně výzvy na toto opatření v letošním roce plánována.

Shrnutí

Z perspektivy dosažených hodnot ukazatelů není specifický cíl aktuálně naplňován, avšak úroveň plnění ukazatelů v závazkovaných projektech a zásobníku žádostí celkově vytváří dostatečný potenciál pro naplnění specifického cíle. Z celkového očekávaného počtu 11 projektů jsou čtyři projekty realizovány, dalších pět projektů je administrováno.

4.1.5 Hodnocení výkonnostního rámce PU 2

Ukazatel a případně jednotka měření	Milník pro rok 2018	Cíle pro rok 2023
Finanční ukazatel	3 916 209,-	22 688 120,-
2.2 - Počet projektů	110	435

Naplnění výkonnostního rámce PU 2 se jeví reálně za předpokladu hladké administrace projektů v rámci finančního vypořádání.

Počet zázavazkovaných projektů naplňuje milník ze 71,8 %. V případě započtení všech „živých“ projektů do vyhodnocení bude tento ukazatel splněn na 209 %.

Finanční ukazatel, vypočtený z výše uvedených projektů, činí ke konci roku 2016 celkem 3 952 189 EUR, což představuje naplnění milníku pro rok 2018 z 100,9 %.

4.2 Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

4.2.1 3. A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy

Specifický cíl 3.A je naplňován jedním opatřením – **3.1 Shromažďování údajů**, jehož cílem je zlepšení v oblasti shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

Celková alokace pro specifický cíl 3. A, resp. pro opatření 3.1 činí 2,4 mil. EUR. Pro toto opatření však nebyla k 31. 12. 2016 vyhlášena žádná výzva v rámci OP Rybářství. Dle harmonogramu pro rok 2017 by měla být výzva pokrývající opatření 3.1 vyhlášena v dubnu 2017 s alokací 65,9 mil. Kč (2,44 mil. EUR).

Analýza finančního pokroku

Tabulka 16 - Finanční pokrok realizace opatření 3.1

Priorita Unie	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu
PU3	3.1	2 441 269	65 914 256	0,0%	0,0 %

V rámci specifického cíle 3.A nebyly k 31. 12. 2016 zazávazkovány žádné finanční prostředky ani podány žádné žádosti o podporu.

Analýza věcného pokroku

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A nebyla k 31. 12. 2016 vyhlášena žádná výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru věcného pokroku. Dle dostupných informací je vyhlášení první výzvy pro opatření 3.1 plánováno až na duben 2017. V rámci plánované výzvy má být na projekty v opatření 3.1 směřována plná finanční alokace na dané opatření.

Tabulka 17: Přehled kontextových indikátorů – opatření 3.1

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
97300	Opatření pro shromažďování údajů - provádění datových volání podle rámce pro shromažďování údajů	kontextový	hlavní	%	100,0	0

Tabulka 18: Přehled indikátorů – opatření 3.1

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
97310	Zvýšení procentního podílu provedení datových volání*	výsledkový	hlavní	%	100,0	0	0	0
97301	Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	výstupový	hlavní	Projekty	2	0	0	0
97302	Počet subjektů zapojených do shromažďování údajů	výstupový	interní	Subjekt / rok	500	0	0	0
97305	Počet data - setů zaslaných producenty v oblasti akvakultury do softwaru pro shromažďování údajů	výsledkový	interní	Data-set / rok	500	0	0	0

* V rámci Ověřovací studie byla navržena úprava nastavení indikátoru včetně názvu a definice. Indikátor by měl vyjadřovat zvýšení procentního podílu úspěšného nahrání požadovaných dat na základě rámce EU pro shromažďování údajů.

** V Programovém dokumentu OP R indikátor uveden jako výsledkový, v tabulce dle MMR uveden jako výstupový.

Naplnování opatření 3.1 je vázáno na rozšířené požadavky pro shromažďování údajů, které vyplývají z nového nařízení Evropského parlamentu a rady o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury a pro podporu vědeckého poradenství pro Společnou rybářskou politiku, a souvisejících předpisů. Na základě aktuální legislativy EU vznikají pro ČR nové požadavky na sledování množství podrobných socioekonomických i biologických údajů, které nebyly na úrovni ČR v minulém programovém období sledovány. Předpisy stanovují rozsah sbíraných údajů a základní zásady jejich sběru. Požadavky na sběr biologických údajů se v ČR týkají pouze kapra, z důvodu dosažení stanovené prahové hodnoty produkce, nad jejíž hranicí členské státy musejí data pro dané druhy ryb shromažďovat.

Příjemcem dotace je v případě opatření 3.2 Oddělení rybářství a včelařství MZe. Jako předpoklad pro realizaci opatření byl již zpracován Pracovní plán ČR pro shromažďování údajů⁶, kde jsou podrobněji popsány metody, které ČR (MZe) plánuje využít pro sběr požadovaných dat. Vzhledem k povaze a složitosti získání některých požadovaných dat však není v současné době prozatím stále jasné, zda bude možné pro sběr alespoň části požadovaných dat využít softwarovou aplikaci, která by umožnila předávání dat přes internetové rozhraní přímo od povinných subjektů. V současné době probíhají mezi žadatelem a ŘO jednání ohledně charakteru plánovaných intervencí v rámci opatření 3.1, přičemž se předpokládá realizace dvou projektů. Jednou z možností je v první fázi realizace studie, která by ověřila možnost využití softwarové aplikace pro sběr alespoň části dat.

⁶ Zpracování tzv. pracovních plánů pro shromažďování údajů je součástí naplnování rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury. Prováděcí rozhodnutí komise 2016/1701 (z 19. 8. 2016) stanovuje pravidla pro předkládání pracovních plánů shromažďování údajů ze strany členských států EU. Pracovní plán zpracovává každý členský stát EU a je schvalován ze strany EK.

Následoval by projekt zaměřený již na samotný sběr požadovaných dat dle Pracovního plánu. Možné jsou však i jiné varianty.

Jak vyplývá z realizované Ověřovací studie, je možné, že po stanovení finální podoby postupu pro sběr dat (které může následovat až po případné realizaci studie) bude třeba upravit cílové hodnoty, ale i definice některých indikátorů sledovaných v rámci opatření 3.1 tak, aby odpovídaly charakteru realizovaných aktivit (aby byly indikátory relevantní, měřitelné a jejich cílové hodnoty dosažitelné – blíže viz Ověřovací studie). Na základě Ověřovací studie dojde pravděpodobně také k úpravě názvu, definice a výpočtu indikátoru *Zvýšení procentního podílu provedení datových volání* tak, aby byly v souladu s definicí indikátoru RI_UP3.B1 uvedenou v metodice EK. Vzhledem k tomu, že prozatím nejsou podány žádné žádosti o podporu, nebylo by po této úpravě ani nutné zpětně dopočítávat zázávkované/dosažené hodnoty.

Potenciál dalšího plnění opatření

Dle informací ŘO je v současné době stanoven harmonogram prvního projektu v rámci opatření 3.1, kterým by měla být v souladu s výše uvedenými předpoklady studie. Tento projekt by měl být realizován a ukončen do konce roku 2018. Další projekty se v tomto opatření plánují až po skončení studie, tj. po roce 2018.

4.2.23. B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

Na specifický cíl 3. B se váže opatření **3.2 Sledovatelnost produktů**, které má za cíl zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury, a to zejména s ohledem na (1) globální, integrovaný a společný přístup, (2) spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu, (3) používání účinných moderních technologií kontroly pro dostupnost a kvalitu údajů o rybolovu, (4) rámec Unie pro kontrolu, inspekci a prosazování a (5) rozvoj kultury dodržování pravidel a spolupráce mezi všemi hospodářskými subjekty a rybáři.

Celková alokace pro specifický cíl 3. B, resp. pro opatření 3.2 činí 0,78 mil. EUR. Opatření 3.2 je pokryto výzvou č. 6, která byla otevřena pro příjem žádostí o podporu 11. 10. 2016. S celkovou alokací 10,5 mil. Kč (0,39 mil. EUR) pokrývá výzva č. 6 přibližně polovinu celkové alokace specifického cíle 3. B.

Dosud vyhlášené výzvy pro opatření 3.2:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
6	priorita unie 3	3.B	3.2	11. 10. 2016 - 31. 12. 2018

Analýza finančního pokroku

Tabulka 19 - Finanční pokrok realizace opatření 3.2

Priorita Unie	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu
PU3	3.2	777 778	21 000 000	0,0%	0,0 %

V rámci specifického cíle 3.B (opatření 3.2) nebyly k 31. 12. 2016 zazávazkovány žádné finanční prostředky a nebyly podány ani žádné žádosti, v rámci nichž by byla určitá výše podpory požadována.

Analýza věcného pokroku

K opatření 3.2 nejsou k 31. 12. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, do otevřené výzvy č. 6 pokrývající toto opatření je možné podávat žádosti až do konce roku 2018. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B.

Tabulka 20: Přehled kontextových indikátorů – opatření 3.2

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
97500	Stávající zdroje k dispozici pro kontrolu - Počet zaměstnanců (inspektorů) na plný pracovní úvazek	kontextový	Hlavní	FTE	1 010,0 (výchozí 1 010,0)	0

Tabulka 21: Přehled ostatních indikátorů – opatření 3.2

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodn. (v %)
97501	Počet provedených kontrol v rámci softwaru pro sledovatelnost produktů akvakultury	výsledkový	hlavní	Kontroly	800	0	0	0
97505	Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování	výstupový	hlavní	Projekty	10	0	0	0
97510	Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti produktů v oblasti akvakultury	výsledkový	interní	%	90,0	0	0	0
97601	Nakoupený software nebo hardware	výstupový	interní	ks	8	0	0	0

Realizace opatření 3.2 je vázána na požadavky v oblasti sledovatelnosti produktů, které vyplývají z uplatňování rámce Unie pro kontrolu, inspekci a prosazování (vynucování), který byl zaveden nařízením (ES) č. 1224/2009 v listopadu roku 2009. Tento kontrolní režim Společenství upřesňuje zásady a požadavky v oblasti kontroly uvádění na trh, včetně sledovatelnosti produktů.

V rámci opatření 3.2 jsou podporovány aktivity vztahující se ke kontrolním činnostem veřejných subjektů. Příjemcem podpory by zde měl být Úřad pro potraviny, jehož prostřednictvím budou realizovány jednotlivé projekty. Dle dosavadních informací by měly být první žádosti o podporu podány na začátku roku 2018 a z hlediska průběhu naplňování opatření je očekávána realizace cca 2 projektů ročně. Celkem je plánována realizace přibližně 10 projektů, čemuž odpovídá cílová hodnota indikátoru 97505. V první fázi by dle zjištění měly být realizovány zejména projekty zaměřené na odborné publikace pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a dále jsou v rámci opatření 3.2 plánována školení a výměnné programy (včetně výměny mezi členskými státy) pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností. O aktivity školení a výměnných programů je mezi cílovými skupinami dle zjištění poměrně velký zájem. Dalšími podporovanými aktivitami jsou analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení provedených auditů a vynaložených výdajů příslušnými orgány při monitorování, kontrole a sledování a také informační

iniciativy (včetně seminářů a mediálních nástrojů) zaměřené na zvýšení povědomí o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel společné rybářské politiky (pro cílovou skupinu rybářů, pro veřejnost či pro další relevantní aktéry).

Potenciál dalšího plnění opatření

Jak bylo uvedeno výše, dle dosavadních informací by měly být první žádosti o podporu podány na začátku roku 2018 a každý rok (počínaje rokem 2018) by měly být realizovány cca 2 projekty. Celkem je plánována realizace přibližně 10 projektů. Mezi prvními by měly být realizovány zejména projekty zaměřené na pořízení potřebného vybavení (hardware, software) a dále školení a výměnné programy (viz výše).

4.2.3 Hodnocení výkonnostního rámce PU 3

Ukazatel a případně jednotka měření	Milník pro rok 2018	Cíle pro rok 2023
Finanční ukazatel (v EUR)	100 000,-	2 441 269,-
3.2 - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	1	2

Hodnota finančního milníku je nastavena na 100 tis. EUR, přičemž k 31. 12. 2016 nebyla v Prioritě Unie 3 podána žádná žádost o podporu. Projekty v jediné vyhlášené výzvě (v rámci opatření 3.2) mohou být ukončovány až do konce roku 2023 a v případě plánovaného projektu v opatření 3.1, který má být ukončen do konce roku 2018 (viz níže), v současné době není známa předpokládaná hodnota požadované podpory. Nelze tak nyní odhadnout, zda budou stanovené finanční prostředky do konce roku 2018 vyčerpány. Naplnění finančního milníku tak v současné době nelze odhadnout.

Plnění věcného milníku souvisí s výše uvedenými skutečnostmi, kdy výzva na oblast shromažďování údajů je teprve plánována, a nejsou tudíž podány žádné žádosti o podporu. Nicméně s ohledem na plánované aktivity v rámci opatření 3.1. Shromažďování údajů lze usuzovat, že v roce 2018 bude milníku Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů dosaženo ze 100 % (tj. do konce roku 2018 bude ukončen 1 projekt).

4.3 Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

4.3.15. A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Specifický cíl 5.A je naplňován prostřednictvím dvou opatření.

Opatření **5.1 - Plány produkce** má za cíl jednak zefektivnit organizaci, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh a jednak přispět k rovnováze nabídky a poptávky na trhu. V rámci opatření 5.1 je podporována příprava a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, které jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu. Hlavním účelem opatření je v tomto smyslu zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky. Příjemci v rámci opatření jsou organizace producentů a sdružení organizací producentů.

Opatření **5.2 - Uvádění produktů na trh** má stanoveny následující cíle: (1) zlepšení postupů při zavádění opatření k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizace trhů prostřednictvím organizací producentů; (2) široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury; (3) zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní a (4) prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách. V rámci opatření 5.2 jsou podporovány aktivity spojené se zakládáním organizací producentů a s vedením regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní. Opatření 5.2 je tedy dále rozčleněno na 2 záměry - *záměr 5.2 a) Vytváření organizace producentů a záměr 5.2 b) Propagační kampaně*.

Specifický cíl 5. A má přiřazenou alokaci ve výši 3,68 mil. EUR, z toho 0,64 mil. EUR (17 %) připadá na opatření 5.1 a 3,04 mil. EUR (83 %) na opatření 5.2.

Na projekty opatření 5.1 a 5.2 dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
3	priorita unie 5	5.A	5.2, záměr b)	3. 5. 2016 - 31. 12. 2023

Pro specifický cíl 5. A byla prozatím vyhlášena jedna výzva pro podávání žádostí (výzva č. 3), která svým zaměřením pokrývá pouze opatření 5.2, záměr b). Jedná se o průběžnou výzvu, do které je možné podávat žádosti až do konce roku 2023. S alokací 45 mil. Kč (1,66 mil. EUR) výzva č. 3 naplňuje přibližně polovinu celkové alokace specifického cíle 5. A a více než polovinu alokace opatření 5.2. Dle harmonogramu výzev jsou v dubnu 2017 plánovány pro SC 5.A dvě výzvy – výzva č. 7 pro opatření 5.1 s alokací 6 mil. Kč (0,22 mil. EUR) a výzva č. 8 pro opatření 5.2, záměr a) s alokací 2 mil. Kč (0,08 mil. EUR). Po jejich vyhlášení budou výzvami pokryta všechna opatření/záměry specifického cíle 5. A. Na rok 2017 je zároveň plánována ještě výzva na opatření 5.2b) (výzva č. 9) s plánovanou alokací 35 mil. Kč (1,3 mil. EUR).

Tabulka 22: Finanční pokrok realizace opatření 5.1 a 5.2

PU	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu
				podíl na alokaci (v %)	
PU 5	5.1	644 980	17 414 460	0,0%	0 %
	5.2 a)	75 880	2 048 760	0,0%	0 %
	5.2 b)	2 959 320	79 901 640	0,0%	0 %

V opatřeních 5.1 a 5.2a) nebyly do 31. 12. 2016 vyhlášeny žádné výzvy, tudíž nejsou zazávazkovány žádné finanční prostředky. Ve vyhlášené výzvě č. 3 bylo registrováno celkem 7 žádostí (4 žádosti jsou v přípravě rozhodnutí) a požadované finanční prostředky v rámci těchto žádostí jsou ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. EUR), tedy cca 5 % celkové alokace opatření. Ani v opatření 5.2b) ovšem nebyly zatím schváleny žádné projekty.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 23: Přehled kontextových indikátorů – opatření 5.1

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
95312	Podíl produkce uváděné na trh organizacemi producentů (objem)	kontextový	hlavní	%	6,5	0
95513	Podíl produkce uváděné na trh organizacemi producentů (hodnota)	kontextový	hlavní	%	12,5	0
95600	Počet organizací producentů	kontextový	hlavní	Organiz. producentů	1	0

Tabulka 24: Přehled ostatních indikátorů – opatření 5.1

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95111	Změna objemu prvního prodeje v organizacích producentů	výsledkový	hlavní	t	600,0	0	0	0
95511	Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích producentů	výsledkový	hlavní	tis. EUR	2 309,0	0	0	0
95801	Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány produkce a uvádění produktů na trh se podporují	výstupový	hlavní	Organiz. producentů	1	0	0	0

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
96004	Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování	výstupový	hlavní	Projekty	5	0	0	0

K opatření 5.1 nejsou k 31. 12. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena výzva zaměřená na naplňování tohoto opatření. Nejsou tak k dispozici žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to ani na úrovni projektových žádostí.

Pro kvalitativní vyhodnocení opatření byly realizovány rozhovory se zástupci ŘO, SZIF i s věcnými garanty problematiky z MZe. Naplňování cílů opatření totiž z velké části závisí na spuštění a úspěchu realizace opatření 5.2 a), v rámci kterého mají vzniknout organizace producentů, které budou následně příjemci opatření 5.1. Výzva na opatření 5.2 a) je plánována na duben 2017 s ukončením příjmu žádostí do 31. 12. 2017. Teprve ke konci roku 2017 bude tedy jasné, zda se podaří v ČR vytvořit (alespoň jednu) organizaci producentů a bude možné naplňovat cíle opatření 5.1.

Dle harmonogramu výzev je vyhlášení první výzvy pro opatření 5.1 plánováno na duben 2017 (s celkovou alokací 6 mil. Kč (0,22 mil. EUR), ukončení příjmu žádostí je plánováno na 31. 12. 2018.

Dle pravidel opatření 5.1 (Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.1) nepřesáhne podpora poskytovaná na jednu organizaci producentů jednou ročně 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými organizacemi producentů na trh příslušnou organizací producentů během předcházejících tří kalendářních let. Jelikož první plány produkce mohou být schváleny realisticky spíše až v roce 2018, je možné alokaci 617,4 milionů Kč (0,47 22 mil. EUR) rozložit do let 2018-2023, tedy v každém roce by mohla organizace producentů dostat až 2,91 mil. Kč. V tom případě by ovšem průměrná hodnota roční produkce (průměr z produkce všech členů organizace) musela být za poslední 3 kalendářní roky více jak 33 96 mil. Kč (tedy cca desetina celkové produkce v ČR). Spojit by se tedy musely pouze největší organizace v ČR. Teprve za splnění těchto podmínek (případně při vzniku více organizací producentů) by mohlo dojít k vyčerpání celé alokace opatření.

Potenciál naplnění opatření 5.1.

V rámci opatření nebyla prozatím vyhlášena žádná výzva a nejsou tudíž registrovány žádné žádosti o podporu (výzva je plánována na duben 2017). Naplňování cílů opatření z velké části závisí a úspěchu realizace opatření 5.2 a), v rámci kterého mají vzniknout organizace producentů, které budou následně příjemci opatření 5.1. Výzva na opatření 5.2 a) je plánována na duben 2017 s ukončením příjmu žádostí do 31. 12. 2017. Teprve ke konci roku 2017 bude tedy možné hodnotit, zda se podaří v ČR vytvořit (alespoň jednu) organizaci producentů a bude možné naplňovat cíle opatření 5.1.

Tabulka 25: Přehled kontextových indikátorů – opatření 5.2

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
95005	Spotřeba sladkovodních ryb a rybích výrobků na obyvatele za rok	Kontextový	interní	kg/osoba	1,41 (výchozí 1,40)	-

Tabulka 26: Přehled ostatních indikátorů – opatření 5.2

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / interní	Jed-notka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
96004	Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování	výstupový	hlavní	Projekty	5	0	0	0
95111	Změna objemu prvního prodeje v organizacích producentů	výsledkový	interní	t	600,0	0	0	0
95511	Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích producentů	výsledkový	interní	tis. EUR	2 309,0	0	0	0
80001	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	výstupový	interní	Aktivity	4	0	0	0
95601	Počet založených organizací producentů	výstupový	interní	Organizace producentů	1	0	0	0
95801	Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány produkce a uvádění produktů na trh se podporují	výstupový	interní	Organizace producentů	1	0	0	0

Přestože výzva č. 3 pokrývající opatření 5.2, záměr b) byla vyhlášena již v květnu 2016, nebylo k 31. 12. 2016 vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty monitorovacích indikátorů.

K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 7 žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 3 (opatření 5.2 b), registrace žádostí probíhala většinou na podzim 2016). Podle statusu rozhodnutí jsou 4 žádosti v přípravě rozhodnutí (projekt doporučen), u jedné žádosti byla administrace ukončena, dva projekty jsou v procesu hodnocení. Požadované finanční prostředky v rámci všech žádostí jsou ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. EUR), což činí přibližně 10 % alokace na výzvu č. 3. Výzva je vyhlášena jako průběžná (do 31. 12. 2023) a tudíž je vyčerpání finančních prostředků stále reálné.

V připravované výzvě č. 9 by měl být navíc rozšířen okruh příjemců (také na výzkumné organizace apod.), čímž by mohla být opět podpořena absorpční kapacita. Plánovaný objem finančních prostředků výzvy č. 09 pro opatření 5.2b) je 35 mil. Kč (tedy 1,3 mil. EUR), což je přes 40 % alokace celého opatření.

Všechny doposud podané projekty jsou podány příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství – Zařízení služeb MZe s.p.o. V rámci předložených žádostí je plánováno naplnit indikátor 80001 Počet uspořádaných

informačních a propagačních aktivit. Z hlediska zaměření se jedná o projekty, jejichž výstupem je webová stránka, reklamní spot, knihy receptů či prezentace na odborné výstavě, projekty navazují na dříve realizovaný projekt „Ryba na talíři“.

Potenciál naplnění opatření 5.2.a) a 5.2.b)

V rámci opatření 5.2.a) nebyla prozatím vyhlášena žádná výzva a nejsou tudíž registrovány žádné žádosti o podporu. Výzva je plánována na duben 2017, prozatím ovšem nelze předvídat, zda se podaří naplnit cíl vytvoření alespoň jedné organizace producentů (a to především z důvodu přísných podmínek na tuto organizace a mj. omezenému rozpočtu dle pravidel EK). Pro vyčerpání alokace opatření by se musely spojit jen největší organizace v ČR (jejichž hodnota produkce by tvořila desetinu celkové produkce v ČR), což je spíše méně reálné.

Pro opatření 5.2.b) Propagační kampaně je vytvořena detailní Komunikační strategie, v rámci které jsou podávány první žádosti o podporu. Celkem bylo zaregistrováno 7 žádostí, 4 z nich jsou v přípravě rozhodnutí. Požadované finanční prostředky v rámci všech žádostí tvoří 10 % alokace výzvy, která je ovšem vyhlášena jako průběžná a vyčerpání finančních prostředků je tedy reálné. V případě uskutečnění akcí plánovaných ve strategii lze očekávat naplnění stanoveného cíle.

4.3.25. B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Specifický cíl 5. B je naplňován opatřením **5.3 Investice do zpracování produktů**, jehož cílem je zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb a modernizace a inovace zpracovatelských kapacit. V rámci opatření jsou podporovány investice na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Oprávněnými příjemci jsou zde malé a střední podniky.

Na projekty opatření 5.3 dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
1	priorita unie 2 priorita unie 5	2.A; 2.B; 2.C; 5.B	2.1; 2.2; 2.4; 5.3	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015
5	priorita unie 2 priorita unie 5	2.B; 2.C; 5.B	2.2; 2.4; 5.3	11. 10. 2016 - 31. 10. 2016

Alokace specifického cíle 5 B, resp. opatření 5.3 je ve výši 4,29 mil. EUR. Opatření 5.3 bylo zahrnuto již ve dvou vyhlášených výzvách – v 1. a 5. výzvě. Alokace obou výzev činila dohromady 99 mil Kč (tedy 3,6 mil. EUR), vyhlášeno tedy bylo přes 85 % plánované alokace. Dle informací ŘO je na podzim 2017 plánováno vyhlášení další výzvy zahrnující opatření 5.3 (11. výzva), s alokací 46 mil. Kč (1,7 mil. EUR) – počítáno je tedy i s nevyčerpanou alokací 1. výzvy.).

Analýza finančního pokroku

Tabulka 27: Finanční pokrok realizace opatření 5.3

PU	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu
				podíl na alokaci (v %)	
PU 5	5.3	4 287 220	115 754 940	0,7%	0 %

V rámci opatření 5.3 bylo k 31. 12. 2016 podáno celkem 25 žádostí o dotaci, z toho u 4 žádostí byla ukončena administrace a 21 žádostí bylo doporučeno (z toho 3 schváleny). K 31. 12. 2016 byly tedy v opatření 5.3 celkem 3 projekty s vydaným Rozhodnutím zaměřené na zpracování produktů, jejichž požadovaný objem prostředků (pro podporu) byl 753 tis. Kč (tedy 27,9 tis. EUR), což odpovídá pouze 0,7 % alokace opatření.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 28: Přehled kontextových indikátorů – opatření 5.3

ID	Název indikátoru	Typ	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (v %)
95200	Objem zpracovaných ryb	Kontextový	hlavní	t	7 453,0 (výchozí 6 803)	0
95005	Spotřeba sladkovodních ryb a rybích výrobků na obyvatele za rok	Kontextový	interní	kg/osoba	1,41 (výchozí 1,40)	0

Tabulka 29: Přehled ostatních indikátorů – opatření 5.3

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95210	Produkce zpracovaných ryb	výsledkový	hlavní	t	650,0	311,0	47,8	0
96401	Počet projektů zaměřených na zpracování	výstupový	hlavní	Projekty	33	3	9	0

V rámci opatření 5.3 bylo k 31. 12. 2016 podáno celkem 25 žádostí o dotaci, z toho u 4 žádostí byla ukončena administrace a 21 žádostí bylo doporučeno (z toho 3 byly již schváleny). K 31. 12. 2016 byly tedy v opatření 5.3 celkem 3 projekty s vydaným Rozhodnutím zaměřené na zpracování produktů. Objem produkce zpracovaných ryb (MI 95210) se mezi jednotlivými projekty výrazně liší, a to až v řádu stovek tun. Ve stavu k 31. 12. 2016 tak prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové hodnoty produkce zpracovaných ryb, jak je patrné

z tabulky výše. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru 95210 *Produkce zpracovaných ryb* mohla být dosažena. Indikátor 96401 *Počet projektů zaměřených na zpracování* je prozatím naplněn (zazávazkován) na hodnotě 9 % (schváleny 3 z očekávaných 33 projektů). Zároveň je ovšem aktuálně doporučeno 18 žádostí ke schválení, v následujících měsících by tedy mohla být hodnota indikátoru navýšena až na 21 projektů, tedy 63,6 %.

Při výpočtu indikátoru 95210 *Produkce zpracovaných ryb* je do budoucna nutné dbát na agregaci dat vykazovaných příjemci, jelikož celkem 9 projektů je podáno třemi žadateli (jeden žadatel podal dokonce již 5 projektů). Vzhledem k agregaci (nápočtu) celkové hodnoty indikátoru nebude možné data vykázaná příjemci čistě sečíst, jelikož jedna hodnota produkce ryb by mohla být započítána vícekrát (pokud by se např. jednalo o tu samou provozovnu).

Z hlediska zaměření zahrnují schválené projekty jak nové zavedení procesu zpracování ryb (tj. výchozí hodnota produkce zpracovaných ryb je nulová), tak modernizaci stávajících provozů pro zpracování ryb. Obsahem projektů je obvykle nákup zařízení, strojů a materiálního vybavení.

96401 Počet projektů zaměřených na zpracování: Z realizované Ověřovací studie dále vyplývá, že cílová hodnota indikátoru „Počet projektů zaměřených na zpracování“ byla dle Metodiky monitorování OP Rybářství 2014 – 2020 určena na základě expertního odhadu průměrného objemu investice, který byl stanoven na 5,5 mil. Kč. Tímto přístupem byla vypočtena hodnota indikátoru na 40, aktuálně je cílová hodnota stanovena na 33 projektů. Vzhledem k tomu, že VNSPA (shodně s pracovníky ŘO) uvádějí, že aktuálně je v České republice „více než desítka“ podniků pro zpracování sladkovodních ryb (konkrétní odhad se pohybuje okolo 15 podniků malé a střední velikosti), bylo by pro naplnění indikátoru nutné, aby každý zpracovatel podal žádost o dotaci a úspěšně realizoval 2-3 projekty.

Z Ověřovací studie také vyplývá, že vyjasněn musí být způsob agregace hodnoty indikátoru „Produkce zpracovaných ryb“ v případě, že by jeden příjemce žádal o podporu opakovaně. Nastavení cílové hodnoty „Počet projektů zaměřených na zpracování“ navrhujeme ověřit znovu po vyhodnocení (vydání Rozhodnutí) u projektů 5. výzvy a následně případně zvážit úpravu cílové hodnoty.

Potenciál naplnění opatření

V rámci opatření 5.3 je již vyhlášena výzva, jsou realizovány projekty a velký počet žádostí o podporu je doporučen ke schválení (celkem 18 žádostí). Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů jsou plněny uspokojivě a existuje tak velký potenciál k naplnění cílů opatření. Naplnění indikátoru 95210 bude ovšem nutné vyhodnotit ještě po úpravě metodiky načítání (agregace) indikátoru. Jelikož stanovení cílových hodnot a milníků počítalo s podáváním projektů v řádově vyšším objemu, existuje tak velké riziko nenaplnění finančního milníku stanoveného ke konci roku 2018.

4.3.3 Hodnocení výkonnostního rámce PU 5

Ukazatel a případně jednotka měření	Milník pro rok 2018	Cíle pro rok 2023
Finanční ukazatel (v EUR)	740 019,-	4 287 220,-
5.3 - Počet projektů zaměřených na zpracování	5	33

Finanční milník je naplňován projekty opatření 5.3, přičemž předpokládáno bylo, že 5 projektů ukončených do konce roku 2018 bude mít finanční alokaci každý kolem 4 mil. Kč (tedy 148 tis. EUR). Výdaje pro spolufinancování aktuálně schválených projektů opatření 5.3 ovšem tvoří teprve 753,3 tis. Kč, tedy 27,9 tis. EUR, což činí 3,8 % hodnoty finančního milníku. Aktuálně podané žádosti (mimo ukončených administrací), které plánují podání Žádosti o platbu do konce roku 2018, mají způsobilé výdaje (Výdaje pro spolufinancování) v hodnotě 10,9 mil. Kč (tedy 402 tis. EUR), což činí pouze 54,3 % hodnoty finančního milníku. ŘO OP Rybářství sice v současnosti disponuje dostatečným počtem projektů v administraci, které by finanční milník naplňovaly, nicméně 2 z těchto projektů předpokládá dokončení fyzické realizace až v květnu 2019. Dosažení finančního milníku pro rok 2018 je tedy ohroženo.

Naplnění milníku vztaheného k počtu projektů zaměřených na zpracování ryb lze hodnotit jako velmi reálné – ke konci roku 2016 byly schváleny již 3 projekty. Zároveň je aktuálně v administraci 18 žádostí, z nichž plánuje předložení Žádosti o platbu do konce roku 2018 celých 16 žádostí.

4.4 Technická pomoc

4.4.1 Opatření Technická pomoc

Opatření technická pomoc je zaměřeno na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly. Cílem opatření je účinná a efektivní realizace OP Rybářství.

Výzva k technické pomoci OP Rybářství byla otevřena 21. 10. 2015, přičemž se jedná o průběžnou výzvu a žádosti o podporu je možné podávat až do 31. 12. 2023. Celková alokace pro opatření Technická pomoc (2,28 mil. EUR) je zcela pokryta uvedenou výzvou.

Analýza finančního pokroku

Tabulka 30: Přehled finančního pokroku – opatření 5.3

PU	Opatření	Celková alokace (EUR)	Celková alokace (Kč)	Finanční prostředky v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu
				podíl na alokaci (v %)	
TP	TP	2 276 400	61 462 800	13,7%	0 %

V rámci Technické pomoci bylo prozatím schváleno 9 projektů, s celkovou požadovanou podporou ve výši 13,7 % alokace opatření. Žádné finanční prostředky nebyly prozatím proplaceny.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 31: Přehled indikátorů – opatření Technická pomoc

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
80001	Počet uspořádaných informačních propagačních aktivit	výstupový	interní	Aktivity	5	1	20	0
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických strategických dokumentů (vč. evaluačních)	výstupový	interní	Dokumenty	15	3	20	0
80600	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	výstupový	interní	Jednání	23	12	52	0

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
80810	Míra čerpání prostředků programu	výsledkový	interní	%	100,0	0	0	
82200	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	výstupový	interní	Kč	32 105 000	172 976	0,5	0,4
82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	výstupový	interní	FTE	3,0	18,0*	600*	0
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	výsledkový	interní	%	20,0	64,0**	45	-

* Počet financovaných pracovních míst se v projektech s vydaným Rozhodnutím vztahuje k období 2007 – 2013 i období 2014 – 2020.

** Uvedený závazek vychází z jednoho realizovaného v opatření 6.1, který uvádí výchozí hodnotu indikátoru 55 %. V rámci Ověřovací studie byla navržena úprava výpočtu cílové hodnoty indikátoru na úrovni programu.

V rámci opatření Technická pomoc bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno celkem 17 žádostí o dotaci, z toho u jednoho projektu byla ukončena administrace, 5 projektů je „ke schválení“ a 2 žádosti jsou ve stavu „projekt doporučen“. U ostatních 9 žádostí byl projekt schválen, bylo vydáno Stanovení výše výdajů. Tyto schválené projekty požadují celkovou podporu ve výši 311 tis. EUR (8,4 mil. Kč), což činí 13,7 % alokace na opatření. Vzhledem k počtu projektů těsně před schválením bude pravděpodobně procento zazávazkovaných financí v blízké době navýšeno (5 projektů ve stavu „doporučen“ nebo „ke schválení“ požaduje podporu ve výši necelých 211 tis. EUR (5,7 mil. Kč), při jejich schválení by tedy došlo k naplnění zazávazkovaných hodnot opatření na 22,9 %).

V tabulce jsou uvedeny zazávazkované hodnoty indikátorů. Vzhledem k tomu, že většina projektů byla k uvedenému datu stále v realizaci, dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou prozatím nulové. Většina projektů předpokládá ukončení fyzické realizace projektu v roce 2016 a podání žádosti o platbu v roce 2017 (jeden projekt plánuje ŽoP v roce 2018 a jeden v roce 2020).

Závazky projektů s vydaným Stanovením výše výdajů naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru 80600 Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin. V případě indikátoru 82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu je v zazávazkovaných projektech hodnota indikátoru 172 976 Kč, tedy 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %. Mezi projekty doporučenými ke schválení jsou projekty s dalšími 354 tis. výdajů, plánované nákupy zahrnují především nákup služeb (vzdělávání a semináře), indikátor by tedy mohl být navýšen na 1,6 % v zazávazkovaných projektech.

Příjemcem všech schválených projektů bylo Ministerstvo zemědělství ČR, Řídící orgán OP Rybářství. Také u většiny podaných žádostí bylo příjemcem MZe, dvě žádosti v procesu hodnocení byly podány Státním zemědělským intervenčním fondem. Naplnění cílových hodnot indikátorů závisí tedy především na potřebách a aktivitě ŘO a ZS.

Z Ověřovací studie vyplývá, že by bylo vhodné provést úpravu výpočtu cílové hodnoty indikátoru *Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury* na úrovni programu tak, aby byl v souladu s definicí v NČI, s Metodikou monitorování OP Rybářství a se zněním pokynů pro žadatele.

Potenciál naplnění opatření

Cílem opatření Technická pomoc je zajistit účinnou a efektivní implementaci. V rámci opatření byla vyhlášena průběžná výzva a průběžně jsou také podávány žádosti o podporu. Celkem 9 projektů je jich schválených a v realizaci, dosud prováděné aktivity jsou v souladu s aktivitami plánovanými v programovém dokumentu. Pro toto opatření nejsou nastaveny milníky, cílové hodnoty indikátorů jsou zatím zazávazkovány v uspokojivé míře vzhledem k zazávazkované alokaci. Míra úspěšnosti plnění opatření se i nadále bude posuzovat v návaznosti na míru úspěšnosti celého Operačního programu Rybářství.

Vyhodnocení komunikace a propagace – realizované projekty

Opatření Technická pomoc je mj. zaměřeno na informování a komunikaci (publicitu) a realizaci propagačních opatření. Na pořádání informačních a propagačních aktivit zaměřen jeden zazávazkovaný projekt, který naplňuje indikátor *80001 Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit*.

Mezi další projekty, které jsou v administraci a které přispívají k naplnění cílů opatření, patří následující:

- Výroční konference 2015 - OP Rybářství
- Monitorovací výbory a konference OP Rybářství (2016 - 2019)
- Inzerce v časopisu Potravinářský obzor 2015
- Marketingová studie odvětví akvakultury a Komunikační strategie OP Rybářství

V rámci výše uváděných projektů byly napsány a zveřejněny 2 dokumenty (Marketingová studie a Komunikační strategie), má být uspořádáno 10 jednání (Výroční konference a MV) a uskutečněn bude nákup materiálu, zboží a služeb ve výši téměř 173 tisíc Kč.

Semináře

V rámci Technické pomoci byl dle informací ŘO realizován také **seminář „Veřejné zakázky v OP Rybářství 2014-2020“**. Tento seminář byl realizován v listopadu 2016 celkem na třech místech (České Budějovice, Brno a Praha). Semináře v Brně a Českých Budějovicích se účastnilo do 10 účastníků, seminář v Praze navštívilo téměř 30 potenciálních příjemců. Kvalita seminářů byla hodnocena pomocí hodnotících formulářů. Nejlépe hodnocenou oblastí byla odbornost a přístup lektora, nejméně „jedniček“ získal faktor Využití pro praxi.

Tabulka 32: Hodnocení semináře k veřejným zakázkám

Celkem / Známa	1	2	3	4	5
Odbornost a přístup lektora	91%	7%	2%	0%	0%
Úroveň podkladů	86%	14%	0%	0%	0%
Tempo semináře	59%	39%	2%	0%	0%
Využití pro praxi	55%	33%	12%	0%	0%
Organizace semináře	70%	25%	2%	2%	0%

Prostory a zázemí	80%	11%	9%	0%	0%
Celkový přínos semináře	70%	26%	5%	0%	0%

Výroční konference 2015 - OP Rybářství

Výroční konference s názvem „Podpora a rozvoj sladkovodní akvakultury v programovém období 2014 – 2020“ se konala dne 10. 12. 2015. Mezi tématy konference byla zpráva o stavu OP Rybářství 2007-2013 a OP Rybářství 2014-2020, představení úspěšných projektů a informace o administrativních a kontrolních postupech ve vazbě na 1. a 2. výzvu. Konference se zúčastnilo celkem 75 osob.

Monitorovací výbory a konference OP Rybářství (2016 - 2019)

V rámci programu OP rybářství proběhly již 4 Monitorovací výbory v termínech 22. 6. 2015, 18. 11. 2015, 25. 5. 2016 a 8. 11. 2016. Dle informací z posledních dvou jednání se Monitorovacího výboru účastní řádově 40-60 účastníků.


V rámci této aktivity byla realizována také Výroční konference 2016. Ta se konala dne 15. 12. 2016 a dle prezenční listiny se jí účastnilo 54 účastníků. Mezi tématy konference byla zpráva o stavu OP Rybářství 2014-2020, představení úspěšných projektů a informace o novinkách a nejčastějších chybách na Portálu farmáře.

Vyhodnocení komunikace a propagace – z pohledu příjemců

V rámci evaluace byla realizována dotazníková šetření na potenciální příjemce a na žadatele / příjemce. Dotazníkové šetření obsahovalo mj. otázky k vyhodnocení využívaných komunikačních kanálů, ke spokojenosti se zdroji informací a k dalším informačním zdrojům, které by respondenti uvítali.

Žadatelé / příjemci odpověděli na otázku odkud čerpali informace o konkrétních možnostech podpory z OP R (viz níže), že nejčastěji využili webové stránky (78 % respondentů), Pravidla pro žadatele a příjemce (57 %), webové stránky eagri.cz a programový dokument OP R (cca 50 %). Ostatní zdroje byly využity v daleko menší míře. Potenciální žadatelé uváděli, že informace o tom, co OP R nabízí, čerpají nejčastěji z obdobných zdrojů. Polovina využívá Programový dokument a webové stránky SZIF, přibližně třetina pak Pravidla pro žadatele a web eagri.cz.


Graf 7: Odkud jste čerpal(a) informace o konkrétních možnostech podpory z Operačního programu Rybářství? (Ž/P)

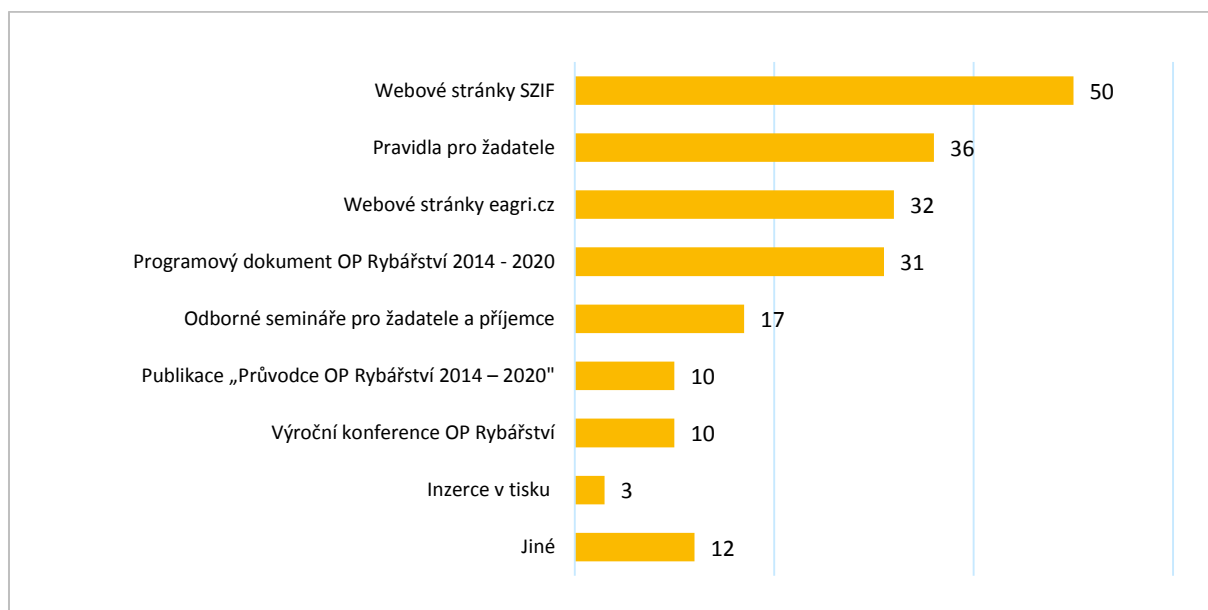


Také při hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými zdroji informací (viz níže) vycházejí velmi pozitivně Pravidla pro žadatele a příjemce, Programový dokument, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení a webové stránky eagri.cz. Obecně se všemi uvedenými zdroji jsou žadatelé / příjemci spokojeni, ve většině případů je jednoznačně spokojena přibližně pětina z nich.

Horších výsledků v porovnání s ostatními zdroji dosáhly odborné semináře a publikace „Průvodce OPR“ (což může být způsobeno tím, že Průvodce obsahuje základní informace pro vytvoření přehledu o možnostech podpory). Spokojenost s Výroční konferencí hodnotilo nejméně respondentů (pouze 7), pro ostatní byl tento zdroj označen jako „nerrelevantní“. To je odpovídající danému nástroji, který nemá za cíl působit jako hlavní zdroj informací pro širokou obec příjemců o možnostech podpory.

Graf 8: Do jaké míry jste spokojen (a) se zdroji informací potřebných pro podání žádosti, realizaci a administraci projektů? (Ž/P)



V otevřené otázce, která se ptala, s čím konkrétně byli žadatelé / příjemci ve vztahu ke zdrojům informací nespokojeni, se nejčastěji objevovaly stížnosti na nejasnosti a složitost. Nejasnosti se týkaly nejednoznačného výkladu pravidel, nesrozumitelnosti pokynů či informací od pracovníků ŘO/ZS a např. chybníků, které jsou nekonkrétní a vyžadují duplicitní informace. Složitost se pak vztahuje především k Instrukčním listům, Portálu farmáře a celkovému podávání žádosti.



Graf 9 - Jaké další informační zdroje byste uvítali? (Ž/P)

Žadatelé a příjemci by pak nejvíce uvítali, kdyby měli větší možnosti osobních konzultací (ty uvedla polovina respondentů), případně elektronických newsletterů (emailů). Informační emaily by uvítali také respondenti, kteří z OP Rybářství doposud nežádali (potenciální žadatelé). Ti by ovšem ještě více uvítali podrobné informační brožury/letáky k jednotlivým opatřením, což může být podnětem pro ŘO k tvorbě takových materiálů.

5 HODNOCENÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT

Mezi horizontální témata zohledňovaná v rámci OP Rybářství patří zásady stanovené v člancích č. 7 a 8 obecného nařízení (EU) č. 1303/2013, tj. základní horizontální principy (1) podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace a (2) udržitelný rozvoj. Dále bude v rámci horizontálních témat hodnocen (3) příspěvek k cílům v oblasti klimatických změn (dle čl. 50 odst. 4 obecného nařízení) a také (4) princip partnerství a víceúrovňové správy, především v oblasti zapojení partnerů do provádění OP (dle čl. 5 obecného nařízení).

Podpora z fondu ENRF v rámci OP Rybářství má vazbu na tematické cíle strategie Evropa 2020 v oblastech (1) a zvýšení konkurenceschopnosti MSP v odvětví rybářství a akvakultury a (2) zachování a ochrany životního prostředí a podpory účinného využívání zdrojů. Vzhledem k těmto skutečnostem a k charakteru intervencí OP Rybářství tak lze v rámci hodnocených horizontálních témat považovat za nejdůležitější podporu udržitelného rozvoje a příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn. Naopak význam podpory principu rovných příležitostí a nediskriminace lze z hlediska povahy programu považovat za okrajový.

5.1 Hodnocení horizontálních témat – princip partnerství

Princip partnerství dle obecného nařízení zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být přitom aktivně zapojeni v celém cyklu programu – v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu. Hodnocení principu partnerství v rámci plnění zakázky se v souladu se zadávací dokumentací soustředí především na **roli partnerů při provádění programu**.

Princip partnerství je při realizaci OP Rybářství uplatňován zejména prostřednictvím Monitorovacího výboru, tj. v souladu s minimálními požadavky MMR-NOK na způsob zapojení partnerů do implementace programu. Partneři se účastní také Plánovacích komisí, na kterých je projednáván Strategický realizační plán (zahrnující např. harmonogram výzev, predikce čerpání, vyhodnocení Strategického realizačního plánu z předchozího roku, apod.) a Odborné skupiny OP Rybářství, jejíž hlavní náplní je implementace programu. Odborná skupina OP Rybářství, která fungovala již při přípravě OP, je platformou méně formálního charakteru než Monitorovací výbor a zahrnuje také větší škálu zainteresovaných stran (partnerů).

Z hlediska počtu členů, uvedených platformem jsou nejdůležitějšími partnery zapojenými do provádění OP Rybářství Ministerstvo zemědělství (Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, ŘO PRV, Úřad pro potraviny) a Rybářské sdružení ČR, a dále např. Národní sdružení intenzivních akvakulturních systémů, Český rybářský svaz a další. Do provádění programu jsou zapojeny subjekty různých typů – ministerské resorty včetně Ministerstva zemědělství a MMR-NOK, organizace sdružující cílové skupiny (svazy a sdružení v oblasti rybářství a akvakultury), výzkumné instituce (univerzity), odborná rybářská veřejnost a další. Struktura složení jednotlivých platform se jeví jako adekvátní a lze konstatovat, že **do provádění programu**, resp. do řešení zásadních aspektů implementace OP Rybářství **jsou zapojováni všichni relevantní partneři**. Jednací řád platform navíc umožňuje na základě požadavku kteréhokoliv člena danou platformu rozšířit a tato možnost je dle zjištění také uplatňována. Navíc jednotliví členové aktivně využívají možnosti pozvat na jednání relevantního hosta, který se může k projednávanému tématu vyjádřit.

Ze zpětné vazby zapojených aktérů vyplývá, že **míra zapojení jednotlivých aktérů do provádění programu je adekvátní**, kdy jednání platform se většinou zúčastňují všichni členové a zároveň hlavní partneři vyvíjejí největší aktivitu. Vzájemná komunikace mezi partnery dle zjištění probíhá na dobré úrovni a společná jednání partnerů přispívají k řešení zásadních aspektů a problémů týkajících se implementace OP Rybářství.

5.2 Hodnocení horizontálních témat – rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí podporuje potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další osoby ohrožené sociálním vyloučením jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Významné téma představuje otázka rovnosti mužů a žen.

Princip rovných příležitostí je v rámci OP Rybářství zohledňován napříč opatřeními především prostřednictvím kontroly souladu projektů s principem rovných příležitostí mužů a žen a nediskriminace či zajištění rovných podmínek žadatelů pro získání podpory. V rámci evaluace bylo zhodnoceno provádění nastavených mechanismů zohledňujících princip rovných příležitostí.

Základní informace o principu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminace jsou zahrnuty v programovém dokumentu OP Rybářství. Konkrétní opatření ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace jsou pak v rámci OP Rybářství zakotvena především v Pravidlech pro žadatele, kde jsou specifikována pravidla dodržování tohoto principu. Příjemci dle Pravidel mají povinnost zajistit, aby projekt neměl prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Uplatnění těchto pravidel je prováděno u všech opatření OP Rybářství prostřednictvím žádostí o podporu, kde žadatelé popisují vztah projektů k principu rovných příležitostí, a to z hlediska:

- 1) existence negativního vlivu na podporu rovnosti žen a mužů
- 2) existence diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace

Bylo ověřeno, že všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné příležitosti byly formálně vyloučeny z podpory programu, a lze tedy konstatovat, že všechny projekty OP Rybářství s právním aktem o poskytnutí podpory nemají prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a nedochází u nich k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

5.3 Hodnocení horizontálních témat – udržitelný rozvoj

Princip udržitelného rozvoje je obecně pojímán jako úsilí o dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. V souladu s článkem 17 obecného nařízení je princip udržitelného rozvoje v kontextu implementace fondů EU chápán primárně v kontextu ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, primárně

tedy v environmentální dimenzi. Hlavním tématem udržitelného rozvoje je proto problematika ochrany životního prostředí.

OP Rybářství zohledňuje princip udržitelného rozvoje v rámci konkrétních prvků nastavení i z hlediska sledování environmentálních indikátorů popisujících příspěvek programu k udržitelnému rozvoji.

Zohlednění principu udržitelného rozvoje v rámci OP Rybářství bylo hodnoceno ve třech rovinách:

- a) Provádění konkrétních opatření
- b) Vliv projektů na udržitelný rozvoj
- c) Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje

a) Provádění konkrétních opatření

Základní informace o principu udržitelného rozvoje včetně požadavků na ochranu životního prostředí jsou zahrnuty v programovém dokumentu OP Rybářství, přičemž implementační nastavení OP Rybářství definuje

- a) aktivity zaměřené na udržitelný rozvoj
- b) aktivity s vlivem na udržitelný rozvoj
- c) aktivity neutrální z hlediska udržitelného rozvoje

Konkrétní opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji jsou pak v rámci OP Rybářství zakotvena především v Pravidlech pro žadatele, kde je stanoveno, že žadatelé/příjemci jsou povinni zajistit, aby projekt neměl prokazatelně negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj. Toto opatření je prováděno u všech opatření OP Rybářství prostřednictvím žádostí o podporu, kde žadatelé popisují vztah projektů k rozvoji – tj. zda má projekt negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj.

Bylo ověřeno, že všechny projekty s potenciálně negativním efektem na udržitelný rozvoj byly formálně vyloučeny z podpory programu.

Zároveň je v žádosti o podporu uváděna informace o příspěvku projektů k udržitelnému rozvoji, resp. k životnímu prostředí, a to v následujícím rozlišení:

- projekt je cíleně zaměřen na udržitelný rozvoj
- projekt je pozitivní k udržitelnému rozvoji
- projekt je neutrální k udržitelnému rozvoji

V případě indikace pozitivního vlivu či cíleného zaměření projektu na životní prostředí je doplněn popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí.

Dalším opatřením pro naplňování principu udržitelného rozvoje je sledování environmentálních indikátorů na úrovni programu (blíže viz níže). Envi indikátory uvedené v programovém dokumentu jsou dle zjištění skutečně monitorovány a vykazovány.

b) Vliv projektů na udržitelný rozvoj

Na základě vlivu jednotlivých projektů k udržitelnému rozvoji, který je žadatelem deklarován v žádosti o podporu, byl vyhodnocen příspěvek jednotlivých Priorit Unie a opatření programu (kde již jsou schválené projekty) k naplňování principu udržitelného rozvoje.

Tabulka 33: Vliv projektů OP Rybářství na udržitelný rozvoj (dle opatření)

Priorita Unie / Opatření	Projekty dle vztahu k udržitelnému rozvoji (podíl projektů v %)		
	Cíleně zaměřené	Pozitivní	Neutrální
PU2 celkem	2%	63%	34%
2.1	0%	50%	50%
2.2	0%	79%	21%
2.3	0%	50%	50%
2.4	8%	0%	92%
2.5	25%	0%	75%
PU5 celkem	0%	100%*	0%
5.3	0%	100%*	0%
PU6 celkem	0%	100%*	0%
6.1	0%	100%*	0%
OP R celkem	2%	68%	30%

* Výsledky za Prioritu Unie 5 a 6 nelze vzhledem k nízké četnosti projektů považovat za vypovídající.
Pozn.: Do vyhodnocení byly započítány pouze schválené projekty (projekty s vydaným Rozhodnutím).

Zdroj: IS SZIF

Dle zjištění mají více než dvě třetiny (68 %) projektů OP Rybářství pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, nejvíce pak v rámci opatření 2.2 zaměřeného na úsporu spotřeby energie v akvakultuře a ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnějšímu využívání zdrojů (79 % schválených projektů v opatření 2.2 deklarovalo pozitivní vliv na udržitelný rozvoj). Pouze 2 projekty (z 99 schválených k 31. 12. 2016) jsou na udržitelný rozvoj cíleně zaměřené, přičemž se jedná o jeden projekt z opatření 2.5 cíleného na vysazování úhoře říčního a dále o jeden projekt z opatření 2.4 zahrnující instalaci recirkulačního zařízení.

c) Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje

OP Rybářství přispívá k principu udržitelného rozvoje také prostřednictvím zaměření podpory, a to zejména z hlediska vysazování úhoře říčního. Příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji byl vyhodnocen s ohledem na sledované environmentální indikátory, a to na základě dosažených hodnot těchto indikátorů (viz tabulka níže).

Tabulka 34: Příspěvek vybraných aktivit OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje

Opatření	Podporované aktivity ve vztahu k udržitelnému rozvoji	Název indikátoru	Dosažená hodnota	Zazávaná hodnota	Cílová hodnota*	Míra naplnění (v %)
----------	---	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

Opatření	Podporované aktivity ve vztahu k udržitelnému rozvoji	Název indikátoru	Dosažená hodnota	Zazávkovaná hodnota	Cílová hodnota*	Míra naplnění (v %)
2.2 Produktivní investice do akvakultury	<ul style="list-style-type: none"> - úspora spotřeby energie v akvakultuře - ekologicky šetrnější akvakultura - účinnější využívání zdrojů 	Počet podpořených výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější	0	0	30 výměn	0
2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby	<ul style="list-style-type: none"> - zachování a rozmnožování vodních živočichů ex-situ - vysazování úhoře říčního ve vybraných rybářských revírech, které umožňují únik 	Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí	0	4	11 projektů	36,4
		Množství vysazeného úhoře	0	762	2 000 kg	38,1

*Uvedeny hodnoty stanovené v programovém dokumentu pro rok 2023

V rámci opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby je podporováno **vysazování úhoře říčního** do vnitrozemských vodních toků (v povodí Labe a Odry). OP Rybářství přispívá prostřednictvím podpory vysazování úhoře říčního v rámci opatření 2.5 k plnění cílů Plánů managementu úhoře říčního, které mají za cíl snížit úmrtnost způsobenou lidskou činností a tím umožnit, aby do moře uniklo přinejmenším 40 % dospělého úhoře v poměru k nejpříznivějším odhadům úniku, k nimž by docházelo bez negativního vlivu lidských činností. V rámci naplňování opatření 2.5 jsou sledovány environmentální indikátory: *Množství vysazeného úhoře* a *Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí (environmentální řízení, systémy auditu, environmentální služby ekologické akvakultury)*. V současné době je schváleno přibližně 40 % plánovaných projektů, které zároveň naplňují téměř 40 % cílové hodnoty plánovaného množství vysazeného úhoře. **V současné fázi implementace programu je pod závazkem vysazení 762 kg úhoře, přičemž na základě dosavadního vývoje lze očekávat, že celkový příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji v tomto ohledu bude odpovídat plánované hodnotě 2000 kg vysazeného úhoře.**

V rámci opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury jsou podporovány aktivity přispívající k úspoře spotřeby energie v akvakultuře a ekologicky šetrnější akvakultuře a účinnějšímu využívání zdrojů. V rámci tohoto opatření je sledován ukazatel *Počet podpořených výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější*, přičemž v rámci schválených ani doposud zaregistrovaných projektů prozatím nejsou zahrnuty aktivity obsahující výměnu za energeticky účinnější zařízení. Prozatím bylo schváleno pouze 16 % projektů očekávaných v rámci opatření 2.2, plánované hodnoty indikátoru (30 výměn) tak ještě bude možné dosáhnout v rámci dalších projektů, které budou v dalším období realizovány v rámci opatření 2.2. **V současné fázi implementace tedy program prozatím nepřispívá k udržitelnému rozvoji z hlediska energetických úspor a účinnějšího využívání zdrojů, přičemž nelze zhodnotit pravděpodobnost dosažení plánovaného příspěvku.** Pro naplnění tohoto horizontálního principu doporučujeme ŘO zaměřit v rámci opatření 2.2 pozornost na realizaci projektů, které zahrnují aktivity obsahující výměnu za energeticky účinnější zařízení.

5.4 Hodnocení horizontálních témat – změny klimatu

Příspěvek OP Rybářství k naplňování cílů v oblasti změny klimatu je v souladu s metodickými pokyny EK hodnocen za relevantní opatření, kterým je **opatření 5.3 Investice do zpracování produktů**. Velikost vlivu tohoto opatření na cíle v oblasti klimatických změn byla stanovena na 40 %. Orientační částka podpory, jež má být v rámci opatření 5.3 použita na cíle v oblasti změny klimatu, tak je ve výši 1 286 166 EUR, což odpovídá 4,1 % celkové finanční alokaci ENRF pro OP Rybářství (31,1 mil. EUR).

Tabulka 35: Příspěvek OP Rybářství k naplňování cílů v oblasti změny klimatu

Opatření (kód, název)	Indikativní výše příspěvku (EUR)	Koeficient pro výpočet podpory opatření	Příspěvek operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory (EUR)	Plnění indikativní výše příspěvku na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (v %)	Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu (EUR)	Plnění indikativní výše příspěvku k na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (v %)
5.3 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury	1 286 166	40,00 %	20 889,41	1,6	0	0

Pozn.: výpočet indikativní výše příspěvku (daného opatření) = indikativní alokace x koeficient

Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn je v současné fázi implementace programu naplňována pouze projekty s vydaným Rozhodnutím, a to na úrovni 1,6 %. Vzhledem k tomu, že ještě nebyly proplaceny žádné prostředky, nelze hodnotit naplňování příspěvku na základě vyúčtovaných žádostí o platbu.

6 HLAVNÍ ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ

Následující kapitola obsahuje hlavní závěry a zjištění z provedených analýz.

Finanční alokace programu

Celková finanční alokace Operačního programu Rybářství je 41,16 mil. EUR. Přibližně dvě třetiny prostředků (66 %) jsou přiděleny na Prioritu Unie 2, přičemž v rámci této PU jsou prostředky mezi specifické cíle rozděleny poměrně nerovnoměrně. Nejvyšší alokaci v rámci programu má specifický cíl 2.B *Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků* s přidělenými prostředky ve výši 19,0 mil. EUR. Naopak specifické cíle 2.A a 2.D patří k těm s nejnižší alokací v rámci programu. Prioritou Unie s druhou nejvyšší alokací je PU 5 (19,2 %). Alokační na Prioritu Unie 3 činí 8,5 %, na Prioritu Unie 6 (Technická pomoc) je alokováno 5,8 %.

Postup implementace

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. První dvě výzvy byly vyhlášeny v říjnu 2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2015. Vyhlášení 5. a 6. výzvy OP Rybářství bylo plánováno na 11. října 2016, žádosti o podporu byly zpřístupněny již k 27. 9. 2016. Výzvy č. 1, 4 a 5 již byly ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v případě 2. a 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018).

K 31. 12. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1, 5.1 a 5.2a) pro které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva (výzva je plánována na duben 2017). Naopak opatření 2.2 je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá jeho významnosti vzhledem k výši alokace specifického cíle 2.B. Všechna opatření spadající pod Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou dle zjištění pokryta alespoň jednou výzvou.

Dosažený pokrok a výsledky jednotlivých specifických cílů OP Rybářství (k 31. 12. 2016):

V rámci **opatření 2.1.** bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí, z nichž byly ke stejnému datu schváleny 2 projekty, což je zhruba desetina cílové hodnoty. V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. K naplnění cílové hodnoty indikátoru *Změna objemu produkce akvakultury* by měla přispět realizace aktuálně schválených projektů zhruba 18 %. Naplnění indikátorů a cílů opatření lze považovat za principiálně reálné. Jako bariéry vnímané žadateli pro podání žádosti jsou obecně nejčastěji uváděny důvody: obavy z administrativní a procesní náročnosti; negativní sentiment žadatelů a příjemců z minulých zkušeností, kdy zisk z podpory je vnímán jako neadekvátní riziko a nákladům spojeným s realizací projektu, především v kontextu kontrol a auditů operací. Také potenciální žadatelé vnímají bariéry v administrativní a procesní náročnosti, zmiňovány byly také negativní zkušenosti z realizace.

V rámci **opatření 2.2. a 2.3.** bylo zaregistrováno celkem 264 žádostí. Již schváleno bylo celkem 69 projektů. U těchto projektů se předpokládá, že jejich realizace přispěje téměř z poloviny k naplnění cílové hodnoty indikátoru *Změna objemu produkce akvakultury*. Díky těmto investicím by mělo dojít k nárůstu objemu akvakulturní produkce o 85,4 tun ročně. V opatření se v průběhu implementace ukázala jako limitující faktor absorpce definice příjemce, respektive požadavek na minimální roční produkci. Pro výzvu na podzim 2016 (pátá

výzva) byla definice příjemce upravena, bylo umožněno čerpat i menším podnikům. Z hlediska perspektivy naplnění cílů programu v opatřeních 2.2 a 2.3 je podstatné, že potenciální žadatelé považují podpory investic do akvakultury za nejatraktivnější instrument OP Rybářství.

V rámci **opatření 2.4.** bylo zaregistrováno celkem 33 žádostí, z toho 12 žádostí již bylo schváleno. Schválena je tak již více než polovina cílového (očekávaného) počtu podpořených projektů. Tento počet projektů celkově naplňuje více jak 60 % indikátoru sledujícího objem produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu indikátoru *Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů s dočišťováním.*

V rámci **opatření 2.5.** byly schváleny 4 žádosti. Tyto projekty naplňují téměř 40 % cílové hodnoty množství vysazeného úhoře. Jako do určité míry limitující faktor nastavení výzev bylo identifikováno vymezení způsobilosti příjemce jako „podniku akvakultury“, kdy přirozená obec příjemců v podmínkách ČR toto vymezení převážně nenaplňuje (jedná se ovšem o nastavení vyplývající z legislativního prostředí).

Celkově bylo k 31. 12. 2016 v rámci PU 2 evidováno 87 projektů s Rozhodnutím s požadovanou výší podpory 114,3 mil. Kč. Zároveň existuje dostatečný zásobník žádostí, které se v současnosti nacházejí v hodnocení. V případě hladké administrace Žádostí o platbu tak lze očekávat naplnění **finančního i věcného milníku.**

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A, **opatření 3.1,** nebyla k 31. 12. 2016 vyhlášena žádná výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru věcného pokroku. V rámci výzvy plánované na duben 2017 má být na projekty v opatření 3.1 alokováno 2,4 mil. EUR, tedy plná finanční alokace na dané opatření. V současné době probíhají mezi žadatelem a ŘO jednání ohledně charakteru plánovaných intervencí v rámci opatření 3.1, přičemž se předpokládá realizace dvou projektů.

K **opatření 3.2** nejsou k 31. 12. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, do otevřené výzvy č. 6 pokrývající toto opatření je možné podávat žádosti až do konce roku 2018. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B. Dle dosavadních informací by měly být první žádosti o podporu podány na začátku roku 2018 a z hlediska průběhu naplňování opatření je očekávána realizace cca 2 projektů ročně. V první fázi by měly být realizovány zejména projekty zaměřené na odborné publikace pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a dále školení a výměnné programy (včetně výměny mezi členskými státy) pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností, přičemž byl indikován zájem cílových skupin o tyto aktivity. Naplnění cílů opatření 3.2 se tak jeví jako reálné.

K 31. 12. 2016 nebyla v PU 3 podána žádná žádost o podporu. S ohledem na plánované aktivity v rámci opatření 3.1. Shromažďování údajů lze však usuzovat, že v roce 2018 bude ze 100 % dosaženo **věcného milníku** (tj. bude ukončen 1 projekt zaměřený na podporu shromažďování, správy a využívání údajů). Dosažení **finančního milníku** nelze nyní odhadnout, protože v současné není dosud známa předpokládaná hodnota studie. Další projekty se v tomto opatření plánují až po skončení studie (tedy po roce 2018).

V **opatření 5.1 a 5.2, záměr a)** nebyly evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena výzva zaměřená na naplňování tohoto opatření (výzvy jsou plánovány na duben 2017). Nejsou tak k dispozici žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to ani na úrovni projektových žádostí. Budoucí vývoj závisí především na zájmu žadatelů o tyto aktivity, který je vzhledem k podmínkám prozatím nejistý.

Přestože výzva č. 3 pokrývající **opatření 5.2, záměr b)** byla vyhlášena již v květnu 2016, nebyl k 31. 12. 2016 schválen v rámci opatření 5.2 žádný projekt. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty monitorovacích indikátorů. K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 7 žádostí o podporu podaných, u jedné žádosti byla administrace ukončena. Požadované finanční prostředky v rámci všech žádostí jsou ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. EUR), což činí přibližně 10 % alokace na výzvu č. 3. výzva je vyhlášena jako průběžná (do 31. 12. 2023) a tudíž je vyčerpání finančních prostředků stále reálné.

V **opatření 5.3** byly schválené celkem 3 projekty zaměřené na zpracování produktů, což je méně než 10 % očekávaného počtu projektů. Ve stavu k 31. 12. 2016 prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové hodnoty produkce zpracovaných ryb. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru *95210 Produkce zpracovaných ryb* měla být dosažena⁷.

Naplnění **věcného milníku** vztaženého k Počtu projektů zaměřených na zpracování ryb (MI 96401) lze hodnotit jako velmi reálné – ke konci roku 2016 byly schváleny již 3 projekty a dalších 18 Žádostí je v administraci. Z celkově podaných Žádostí plánuje předložení Žádosti o platbu do konce roku 2018 celých 16 Žádostí, což by znamenalo splnění milníku na 380 %. **Finanční milník** je aktuálně naplněn zazávazkovánými hodnotami z 3,8 %. V případě hladké realizace všech aktuálně administrovaných projektů lze očekávat naplnění milníku z 54,3 %. ŘO OP Rybářství sice v současnosti disponuje dostatečným počtem projektů v administraci, které by finanční milník naplňovaly, nicméně 2 z těchto projektů předpokládá dokončení fyzické realizace až v květnu 2019. Dosažení finančního milníku pro rok 2018 je tedy ohroženo.

V rámci **opatření Technická pomoc** bylo k 31. 12. 2016 bylo zaregistrováno celkem 17 žádostí o dotaci, schváleno bylo celkem 9 projektů s celkovou finanční podporou ve výši 7,4 mil. Kč, což činí přibližně 11,9 % celkové alokace opatření. Vzhledem k počtu projektů těsně před schválením bude pravděpodobně procento zazávazkovaných financí v blízké době navýšeno. Realizace jednoho projektu již byla ukončena (uspořádání výroční konference k OP Rybářství), většina projektů předpokládá ukončení fyzické realizace projektu v roce 2016 a podání žádosti o platbu v roce 2017. Dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou tak prozatím nulové. Závazky schválených projektů naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru *80600 Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin*. V případě indikátoru *82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu* je zazávazkováno zatím 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %.

Hodnocení horizontálních témat

Princip partnerství

Opatření zohledňující zásady **principu partnerství** jsou v rámci implementace OP Rybářství aktivně uplatňována. Do provádění OP Rybářství jsou zapojeni všichni relevantní partneři a míra jejich zapojení je adekvátní. Partneři jsou do provádění programu zapojeni prostřednictvím ustavených platforem, které jsou dle zjištění funkční a pozitivně přispívají k naplňování principu partnerství. Partneři jsou zapojeni zejména prostřednictvím účasti na Monitorovacím výboru, dále také v rámci Plánovacích komisí a Odborné skupiny OP Rybářství. Platforem se účastní široké spektrum aktérů zahrnujících relevantní subjekty a společná jednání partnerů přispívají k řešení zásadních aspektů týkajících se implementace OP Rybářství.

⁷ Z Ověřovací studie vyplývá, že vyjasněn musí být způsob agregace hodnoty tohoto indikátoru v případě, že by jeden příjemce žádal o podporu opakovaně (aby nedocházelo k opakovanému načítání jedné produkce).

Rovné příležitosti

Informace o principu **rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminace** a o pravidlech dodržování tohoto principu jsou specifikovány v programové a prováděcí dokumentaci OP Rybářství (tj. programovém dokumentu a v Pravidlech pro žadatele OP Rybářství). Nastavené mechanismy zohledňující zásady rovných příležitostí jsou uplatňovány u všech opatření OP Rybářství tak, že relevantní aspekty projektů jsou sledovány v rámci žádostí o podporu. Zároveň bylo ověřeno, že všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné příležitosti byly formálně vyloučeny z podpory programu. Na základě šetření lze konstatovat, že žádný z projektů OP Rybářství nemá prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a že nedochází k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Udržitelný rozvoj

Jak bylo zjištěno, informace o principu **udržitelného rozvoje** a o pravidlech dodržování tohoto principu jsou specifikovány v programové a prováděcí dokumentaci OP Rybářství (tj. programovém dokumentu a v Pravidlech pro žadatele OP Rybářství), a relevantní aspekty projektů jsou sledovány v rámci žádostí o podporu. Bylo ověřeno, že žádný ze schválených projektů OP Rybářství nemá deklarovan prokazatelně negativní vliv na udržitelný rozvoj. Dle zjištění mají více než dvě třetiny (68 %) projektů OP Rybářství pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, nejvíce pak v rámci opatření 2.2 zaměřeného na úsporu spotřeby energie v akvakultuře a ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnějšímu využívání zdrojů. Z hlediska příspěvku OP Rybářství k udržitelnému rozvoji v rámci naplňování environmentálních indikátorů je v současné fázi implementace pod závazkem vysazení 762 kg úhoře a lze očekávat, že celkový příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji bude odpovídat plánované hodnotě 2000 kg vysazeného úhoře. Naopak v současné fázi implementace programu prozatím nebyly podpořeny žádné výměny výrobních zařízení za energeticky účinnější.

Změny klimatu

Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn je v současné fázi implementace programu naplňována pouze projekty s vydaným Rozhodnutím, a to na úrovni 1,6 %. Vzhledem k tomu, že ještě nebyly proplaceny žádné prostředky, nelze hodnotit naplňování příspěvku na základě vyúčtovaných žádostí o platbu.

6.1 Hodnocení naplnění očekávaných výsledků DoP

Strategie OP Rybářství 2014-2020 a Strategie Dohody o partnerství definují vazbu a očekávají příspěvek výsledkům Dohody o partnerství v rámci tematických cílů 6 a 3, tedy v oblasti posílení konkurenceschopnosti ekonomiky a ochrany životního prostředí. Očekávané výsledky, k jejichž naplnění přispívá OP Rybářství, byly definovány následovně:


TC 6	Zvýšená ochrana přírody a krajiny posílením její ekologické stability pomocí posílení biodiverzity a realizace vhodných opatření v oblasti akvakultury
	Snížení energetické náročnosti technologických procesů v akvakultuře
TC 3	Vyšší konkurenceschopnost akvakultury
	Zlepšené řízení a vyšší účinnost strategických procesů (řízení, marketing, inovační management) podpořených firem

TC 6: Zvýšená ochrana přírody a krajiny posílením její ekologické stability pomocí posílení biodiverzity a realizace vhodných opatření v oblasti akvakultury

Příspěvek výsledkům na úrovni Dohody o partnerství má být naplňován především intervencemi specifických cílů:

- 2.5 Opatření - Akvakultura poskytující environmentální služby
- 3.1 Opatření – Shromažďování údajů (okrajově)
- 3.2 Opatření – Sledovatelnost produktů (okrajově)

Obrázek 1 - Příspěvek OP R k plnění TC 6 DoP: Biodiverzita

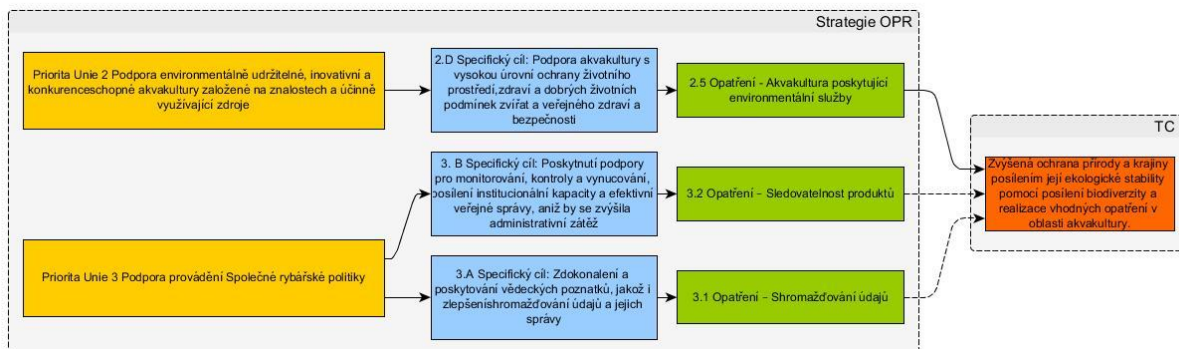

Tabulka 36 - Příspěvek OP R k plnění TC 6 DoP: Biodiverzita

Specifický cíl	Plnění SC	Potenciál naplnění SC	Potenciál příspěvku výsledkům DoP
2.5 Opatření - Akvakultura poskytující environmentální služby	Ne	Ano	Ano
3.1 Opatření – Shromažďování údajů	Ne	Částečně	Lze očekávat pouze vedlejší, tj. částečný příspěvek k výsledku DoP
3.2 Opatření – Sledovatelnost produktů	Ne	Částečně	Lze očekávat pouze vedlejší, tj. částečný příspěvek k výsledku DoP

Závěr:


Program potenciálně přispívá k posílení biodiverzity a ochraně přírody a krajiny primárně udržováním populace úhoře říčního v povodích. Na ohrožení úhoře říčního se podílejí podobné faktory jako u všech tažných druhů ryb, to je znečištění řek i moří, odlov monté pro intenzivní chov tržních úhořů v akvakulturách a zejména velké množství migračních bariér pro juvenilní jedince (monté) i dospělé ryby. Jedinou cestou udržení populací je proto umělé vysazování. Příspěvek intervencí PU 3 nepřímý, okrajový.

TC 6: Snížení energetické náročnosti technologických procesů v akvakultuře

Příspěvek výsledkům na úrovni Dohody o partnerství má být naplňován především intervencemi specifických cílů:

- 2.2 Opatření - Produktivní investice do akvakultury
- 2.4 Opatření – Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Obrázek 2 - Příspěvek OP R k plnění TC 6 DoP: Úspory energií

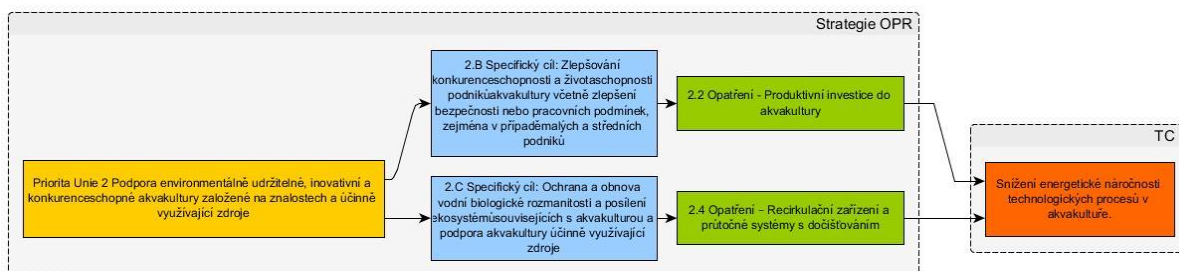

Tabulka 37 - Příspěvek OP R k plnění TC 6 DoP: Úspory energií

Specifický cíl	Plnění SC	Potenciál naplnění SC	Potenciál příspěvku výsledkům DoP
2.2 Opatření - Produktivní investice do akvakultury	Ne	Ano	Ano
2.4 Opatření – Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním	Ne	Ano	Ano

Závěr:


Program přispívá ke snížení energetické náročnosti a úspoře zdrojů technologických procesů v akvakultuře investicemi do modernizace a obnovení technologického vybavení pro chov ryb a do zařízení k intenzivnímu chovu ryb.

TC 3: Vyšší konkurenceschopnost akvakultury

Příspěvek výsledkům na úrovni Dohody o partnerství má být naplňován především intervencemi specifických cílů:

- 2.1 Opatření – Inovace
- 2.2 Opatření - Produktivní investice do akvakultury
- 2.3 Opatření - Podpora nových chovatelů
- 2.4 Opatření – Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
- 5.1 Opatření – Plány produkce
- 5.2 Uvádění produktů na trh
- 5.3 Opatření – Investice do zpracování produktů

Obrázek 3 - Příspěvek OP R k plnění TC 3 DoP: Konkurenceschopnost

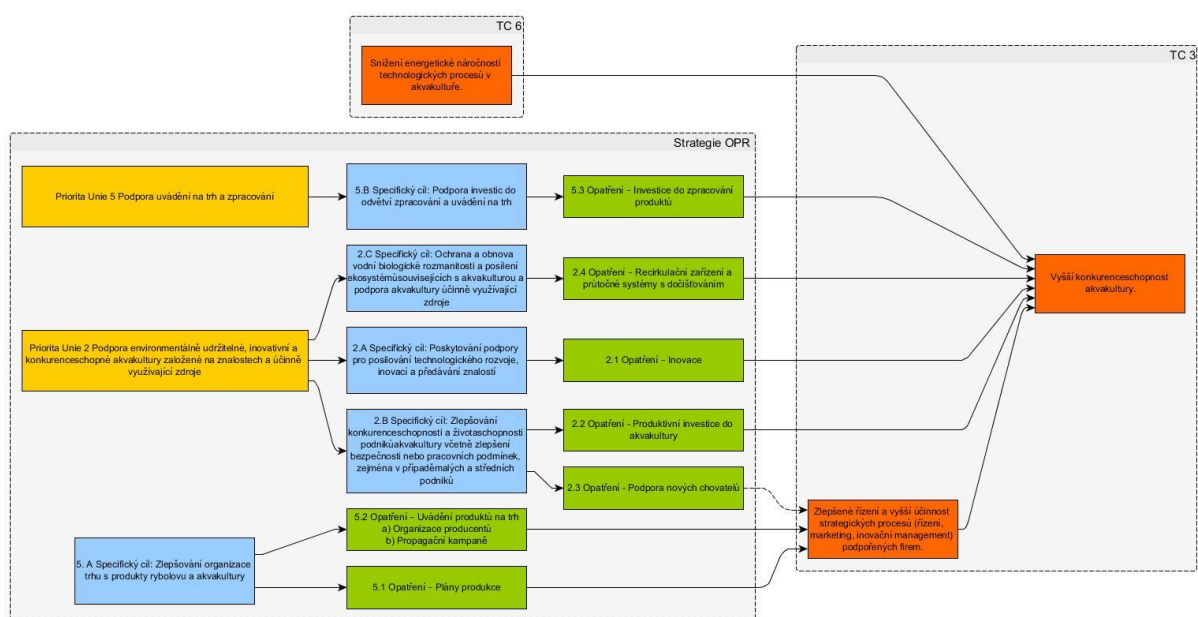

Tabulka 38 - Příspěvek OP R k plnění TC 3 DoP: Konkurenceschopnost

Specifický cíl	Plnění SC	Potenciál naplnění SC	Potenciál příspěvku výsledkům DoP
2.1 Opatření – Inovace	Ne	Ne	Ne
2.2 Opatření - Produktivní investice do akvakultury	Ne	Ano	Ano
2.3 Opatření - Podpora nových chovatelů	Ne	Ne	Ne
2.4 Opatření – Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním	Ne	Ano	Ano
5.1 Opatření – Plány produkce	Ne	Částečně	Ano, aktivity opatření by měly příspěvek na naplnění výsledků DoP.
5.2 Opatření – Uvádění produktů na trh	Částečně	Ano	Ano, aktivity opatření by měly příspěvek na naplnění výsledků DoP.
5.3 Opatření – Investice do zpracování produktů	Ano	Ano	Ano, aktivity opatření mají příspěvek na naplnění

Specifický cíl	Plnění SC	Potenciál naplnění SC	Potenciál příspěvku výsledkům DoP
			výsledků DoP.

Závěr:


Program přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti producentů akvakultury primárně modernizací a obnovou technologického vybavení producentů a související infrastruktury a rozšiřováním intenzivních postupů chovu ryb, částečně též podporou investic do technologií zpracování produktů. Příspěvek v podobě inovativních produkčních postupů lze očekávat spíše zanedbatelný, stejně jako efekty diverzifikace činností producentů. Podobně, pokud lze očekávat příspěvek intervencí PU 3, pak pouze nepřímý, okrajový.

TC 3: Zlepšené řízení a vyšší účinnost strategických procesů (řízení, marketing, inovační management) podpořených firem

Příspěvek výsledkům na úrovni Dohody o partnerství má být naplňován především intervencemi specifických cílů:

- 2.1 Opatření – Inovace
- 2.3 Opatření - Podpora nových chovatelů
- 5.1 Opatření – Plány produkce
- 5.2 Uvádění produktů na trh

Obrázek 4 - Příspěvek OP R k plnění TC 3 DoP: Strategické řízení

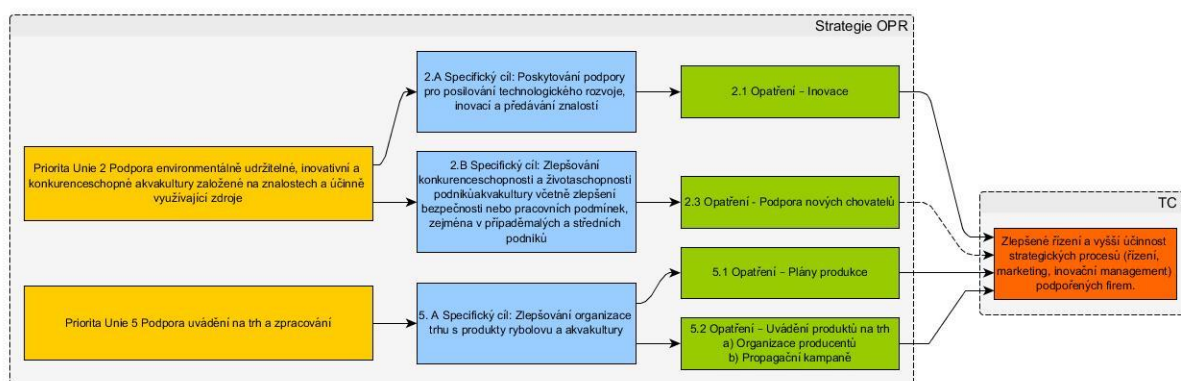

Tabulka 39 - Příspěvek OP R k plnění TC 3 DoP: Strategické řízení

Specifický cíl	Plnění SC	Potenciál naplnění SC	Potenciál příspěvku výsledkům DoP
2.1 Opatření – Inovace	Ne	Ne	Ne
2.3 Opatření - Podpora nových chovatelů	Ne	Ne	Ne
5.1 Opatření – Plány produkce	Ne	Částečně	Ano, aktivity opatření by měly přispěvek na naplnění výsledků DoP.
5.2 Opatření – Uvádění produktů na trh	Částečně	Ano	Ano, aktivity opatření by měly přispěvek na naplnění výsledků DoP.

Závěr:

Na základě aktuálního stavu implementace a zhodnocení dostupného potenciálu program spíše nepřispívá zlepšení řízení a vyšší účinnosti strategických procesů v rámci sektoru.

7 DOPORUČENÍ

Níže uvedená doporučení vyplývají z identifikovaných problémů v čerpání či plnění monitorovacích indikátorů. Ke zprávě se vztahují další doporučení mířící na nastavení indikátorové soustavy, ta jsou uvedena v dílčím plnění 3 evaluace – Ověřovací studii.

Číslo dopor učení	Název	Příslušná kap. evaluační zprávy (zjištění)	Kontext (zdůvodnění) a specifikace doporučení	Harmonogram uvedení do praxe
1.	Navýšit absorpční kapacitu u opatření 2.1	Kap 4.1.1	Vzhledem k naplnění indikátoru Počet projektů zaměřených na inovace, poradenství a pojištění doporučujeme zaměřit pozornost ŘO na zajištění informovanosti a podpory vedoucí ke zvýšení absorpční kapacity v této oblasti.	Průběžně
2.	Navýšit absorpční kapacitu u opatření 2.2 záměr b)	Kap. 4.1.2	Vzhledem k dosavadnímu nízkému zájmu o opatření 2.2 záměr b) doporučujeme zaměřit pozornost ŘO na zajištění informovanosti a podpory vedoucí ke zvýšení absorpční kapacity v této oblasti.	Průběžně
3.	Zajistit absorpční kapacitu u opatření 5.2	Kap. 4.3.1	Aby bylo možné realizovat záměr <i>Vytváření organizací producentů</i> a došlo k naplnění na něj navázaných indikátorů, doporučujeme zaměřit pozornost ŘO na zajištění informovanosti a podpory pro příjemce opatření (zajištění absorpční kapacity opatření 5.2 má vliv i na opatření 5.1).	Průběžně
4.	Vyhodnotit plnění absorpční kapacity u opatření 5.3 (po 5. výzvě) a případně se zaměřit na její navýšení	Kap. 4.3.2	Vzhledem k nastavenému indikátoru „počet projektů“, který násobně překračuje počet zpracoven ryb v ČR, je nutné, aby žádost o projekt podala velká část z nich a to opakovaně. Doporučujeme proto zaměřit pozornost ŘO na průběžné vyhodnocení tohoto opatření (primárně po dokončení hodnocení projektů 5. výzvy) a dále zajištění informovanosti a podpory pro žadatele opatření.	Průběžně
5.	Zkvalitnění informovanost i žadatelů	Kap. 4.4.1	Aby bylo možné navýšit absorpční kapacitu a napomoci žadatelům s identifikovanou částečnou nespokojeností s poskytovanými informacemi, doporučujeme. Žadatelé hodnotí informační zdroje do značné míry pozitivně, zejména ve vztahu k jejich dostupnosti a dostatečnosti. Výhrady směřují spíše ke kvalitě informací a jejich přehlednosti.	Průběžně

Číslo doporučení	Název	Příslušná evaluační zpráva (zjištění)	kap. Kontext (zdůvodnění) a specifikace doporučení	Harmonogram uvedení do praxe
			Doporučujeme proto zkvalitnit informační materiály a aktivity pro žadatele, se zaměřením na publikace jako „Průvodce OP Rybářství 2014-2020“ či vytvoření podrobných letáků / brožur k jednotlivým opatřením. Více využívat semináře a rozšířit možnosti osobních konzultací s pracovníky ŘO i SZIF a zvážit vypracování evidence dobré a špatné praxe.	
6.	Urychlit jednání ohledně finální podoby intervencí v opatření 3.1	Kap. 4.2.1	S ohledem na plnění milníku pro rok 2018, tj. realizace 1 projektu zaměřeného na podporu shromažďování, správy a využívání údajů, doporučujeme zintenzivnit jednání s MZe ohledně finální podoby intervencí v opatření 3.1, tak aby bylo možné zahájit realizaci projektu v co nejkratším časovém horizontu tak, aby byl projekt v roce 2018 ukončen a proplacen.	Bezprostředně
7.	Urychlit realizaci a administraci projektů v opatření 5.3	Kap. 4.3.3	ŘO OP Rybářství sice disponuje dostatečným zásobníkem projektů v administraci pro splnění finančního milníku, ukončení 2 z těchto projektů však předpokládá dokončení fyzické realizace až v květnu 2019. ŘO by proto měl zvážit možnosti urychlení realizace a administrace projektů a zkrácení očekávaného termínu proplacení.	Bezprostředně

8 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

Specifická legislativa

- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 508/2014
- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1380/2013
- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1379/2013
- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013

Interní dokumentace OP Rybářství

- Programový dokument OP R
- Evaluační plán OP Rybářství 2014 – 2020
- Statut plánovací komise OP R
- Strategický realizační plán OP R
- Řídicí dokumentace OP R (OM + přílohy)
- Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014 - 2020 za roky 2014 a 2015
- Závěrečná zpráva k interní evaluaci 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

Datové sestavy / výstupy IS

- Hodnoty indikátorů OPR dle SC k 30. 9. 2016
- Hodnoty indikátorů OPR dle SC k 31. 12. 2016
- Seznam projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace
- Přehled zaregistrovaných žádostí a indikátorů.
