



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

PROCESNÍ A VÝSLEDKOVÉ HODNOCENÍ OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020

Průběžné hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-2020



Zpracovatel

Naviga 4, s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

HOPE Group s.r.o.

Palackého tř. 10
612 00 Brno
(kancelář Lidická 1, Praha 5)

hope
euservis.cz

Zadavatel

ČR – Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

NAVIGA⁴
jednoduchost v orientaci

OBSAH

OBSAH	2
MANAŽERSKÉ SHRUTÍ	3
MANAGEMENT SUMMARY	6
1 ÚVOD	9
2 STRUČNÝ POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ	9
3 IMPLEMENTACE OP RYBÁŘSTVÍ 2014-2016	9
4 DOŠAŽENÝ POKROK A VÝSLEDKY OP RYBÁŘSTVÍ	14
4.1 Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje	14
4.1.1 2. A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí	14
4.1.2 2. B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků .	17
4.1.3 2. C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje	21
4.1.4 2. D Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti	22
4.2 Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky	24
4.2.1 3. A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy	24
4.2.2 3. B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž	25
4.3 Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování	28
4.3.1 5. A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury.....	28
4.3.2 5. B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh.....	31
4.4 Technická pomoc	33
4.4.1 Opatření Technická pomoc.....	33

MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ

Zakázka „**Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství**“ byla zahájena dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společnostmi Naviga 4, s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o.

Průběžná zpráva 1 je jedním z výstupů této veřejné zakázky a zaměřuje se na část výsledkové evaluace. Cílem Průběžné zprávy je analýza věcného pokroku v plnění cílů OP Rybářství, hodnocen je tedy dosavadní pokrok v plnění nastavených indikátorů programu, doplněný o informace o finančním pokroku.

Informace ve zprávě uvedené jsou založeny na analýze plnění indikátorů z dat z MS2014+ generovaných k 30. 9. 2016 ze strany MMR-NOK a doplněné informacemi o schválených projektech (závazky příjemců). V rámci přípravy Průběžné zprávy byly tedy aplikovány metody data mining a provedena analýza dat z MS2014+ a z IS SZIF, dále byl proveden desk research a analýza výzev (harmonogramy výzev, vyhlášené výzvy).

Hlavní závěry a zjištění

Postup implementace

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. První dvě výzvy byly vyhlášeny v říjnu 2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2015. Vyhlášení 5. a 6. výzvy a pokračování 2. výzvy OP Rybářství bylo plánováno na 11. října 2016, žádosti o podporu byly zpřístupněny již k 27. 9. 2016. Výzvy č. 1, 4 a 5 již byly ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v případě 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018).

K 30. 9. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1 a 5.1, pro které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva. Naopak opatření 2.2 je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá jeho významnosti vzhledem k výši alokace specifického cíle 2.B (viz výše). Všechna opatření spadající pod Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou dle zjištění pokryta alespoň jednou výzvou.

Dosažený pokrok a výsledky jednotlivých specifických cílů OP Rybářství (k 30. 9. 2016):

V rámci **opatření 2.1.** bylo zaregistrováno celkem 5 projektů, z nichž jsou ke stejnému datu vydána Rozhodnutí u 2 projektů, což je zhruba desetina cílové hodnoty. V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. K naplnění cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury by měla přispět realizace projektů s vydaným Rozhodnutím zhruba 18 %. Z hlediska interních indikátorů projekty s vydaným Rozhodnutím naplňují přibližně z 15 % plánovaný počet realizovaných procesních inovací.

V rámci **opatření 2.2. a 2.3.** bylo zaregistrováno celkem 118 žádostí (104 v rámci 2.2. a 14 v rámci 2.3.). Celkem u 67 projektů již bylo vydáno Rozhodnutí, a to zejména v rámci opatření 2.2, v případě opatření 2.3 nebylo doposud vydáno Rozhodnutí u žádného projektu. U těchto projektů se předpokládá, že jejich realizace přispěje téměř z poloviny k naplnění cílových hodnot indikátorů *Změna objemu produkce akvakultury* a *Změna hodnoty objemu produkce akvakultury*.

V rámci **opatření 2.4.** bylo zaregistrováno celkem 17 žádostí, u 12 žádostí již bylo vydáno Rozhodnutí. Zazávazkována je tak již více než polovina cílového (očekávaného) počtu podpořených projektů. Tento počet

projektů celkově naplňuje 53 % indikátoru sledujícího objem produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu indikátoru Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů s dočišťováním.

V rámci **opatření 2.5.** bylo vydáno Rozhodnutí u 4 žádostí. Tyto projekty naplňují téměř 40 % cílové hodnoty množství vysazeného úhoře.

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A, **opatření 3.1**, nebyla k 30. 9.2016 vyhlášena žádná výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru věcného pokroku.

V rámci **opatření 3.2** nebyly evidovány žádné žádosti o podporu, neboť výzva č. 6 pokrývající toto opatření byla otevřena pro příjem žádostí až 11. 10. 2016. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B.

V **opatření 5.1** nebyly evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena výzva zaměřená na naplňování tohoto opatření. Nejsou tak k dispozici žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to ani na úrovni projektových žádostí.

Přestože výzva č. 3 pokrývající **opatření 5.2**, záměr b) byla vyhlášena již v květnu 2016, nebylo v rámci opatření 5.2 vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty monitorovacích indikátorů. K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 3. Požadované finanční prostředky (příspěvek Unie) v rámci těchto žádostí činí přibližně 6 % celkové alokace výzvy č. 3.

V **opatření 5.3** byly celkem 3 projekty s vydaným Rozhodnutím zaměřené na zpracování produktů, což je méně než 10 % očekávaného počtu projektů. Ve stavu k 30. 9. 2016 prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové hodnoty produkce zpracovaných ryb. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru *95210 Produkce zpracovaných ryb* měla být dosažena.

V rámci **opatření Technická pomoc** bylo k 30. 9. 2016 celkem 7 projektů s vydaným Rozhodnutím s celkovou finanční podporou ve výši 6,6 mil. Kč, což činí přibližně 10 % celkové alokace opatření. Realizace jednoho projektu již byla ukončena (uspořádání výroční konference k OP Rybářství). Vzhledem k tomu, že většina projektů byla k uvedenému datu stále v realizaci, dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou prozatím nulové. Závazky schválených projektů naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru *80600 Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin*. V případě indikátoru *82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu* je zazávazkováno zatím 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %.

Shrnutí a další postup

S ohledem na aktuální fázi implementace OP Rybářství nenastal prozatím výraznější pokrok v plnění cílů programu. Zhodnocení je tedy provedeno na výsledkové úrovni tam, kde byly již výsledky dosaženy, případně je uveden kvalitativní komentář vycházející z předpokladu naplnění výsledků aktuálně realizovanými projekty. Vzhledem k počáteční fázi implementace OP je obtížné provádět vyhodnocení očekávaných výsledků uvedených v Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020 a vyhodnocení efektivity dosažených cílů. Toto hodnocení bude součástí aktualizace Průběžné zprávy (dílčí plnění 6) na datech generovaných k 31. 12. 2016. V Pre-evaluační studii budou také rozpracovány teorie změny pro jednotlivá opatření a tam, kde to bude relevantní, budou doplněny o terénní šetření.

MANAGEMENT SUMMARY

Project "Process and results evaluation OP Fisheries" was launched on 7. 11. 2016 by signing contracts between the Ministry of Agriculture and supplier Consortium, which consists of the companies Naviga4 s.r.o. and HOPE GROUP s.r.o.

The Interim Report 1 represents one of the outputs of the project and focuses on the results part of the evaluation. The aim of the interim report is to provide an analysis of the substantive progress in the implementation of the objectives of the OP Fisheries, therefore the progress towards target values of program indicators has been assessed, supplemented with information on the financial progress of implementation.

The information given in the report are based on analysis of fulfilment of indicators from data generated by the MS2014+ on 30. 9. 2016 by the MRD-NCA, supplemented with information on approved projects (beneficiaries' commitments). In preparation of the Interim Report were therefore applied methods of data mining (data from the MS2014+ and from SAIF information system), there was realised the analysis of calls (schedules, announced calls) and desk research.

Key Conclusions and Findings

Progress of implementation

A total of 6 calls for project proposals have been opened since October 2015. The first two calls were opened in October 2015, 3. and 4. calls later, at the beginning of May 2015. The launch of the 5. and 6. calls and the reopening of the 2 call of the OP Fisheries was planned for 11. October 2016, application forms have been made available already since 27. 9. 2016. Calls 1, 4 and 5 have already been completed, as far as other calls are concerned, it is still possible to file applications (in case of 3 call up to 31. 12. 2023, under call no 6. up to 31. 12. 2018).

Until 30. 9. 2016, most of the measures of the OP was covered by calls for proposals, with the exception of measures 3.1 and 5.1, for which no call has been opened, yet. On the contrary, the measure 2.2 has been included in 3 calls, which corresponds to its significance given by the allocation of specific objective 2.B (see above). All the measures falling under the Union Priority 2, i.e. the most important part of the OP Fisheries in terms of financial allocation, have been covered with at least one call.

The progress made and the results of specific objectives of the Fisheries OP (as to 30. 9. 2016):

Within measure 2.1, a total of 5 projects were registered, the Decision was published for 2 of the projects on the same date, which represents roughly one-tenth of the target value. As a result of these investments, increase in aquaculture production of 2.9 tonnes per year is expected. Projects with published Decision should contribute to the target value of the indicator Change in the volume of aquaculture production by 18 %. In the framework of internal indicators projects with published Decision fill about 15 % of planned number of realized process innovations.

In the frame of measures 2.2. and 2.3. a total of 118 applications were registered (104 within 2.2. and 14 within 2.3.). There were published Decisions for 67 projects, particularly within the measure 2.2., and no Decision was published within the measure 2.3 up to the date. It is assumed that the implementation of these projects will

contribute nearly by one half to meet the target values of the indicators Change in the volume of aquaculture production and Change in the value of aquaculture production volume.

Under the measure 2.4., a total of 17 applications were registered and Decisions were published for 12 projects. More than half of the target (expected) number of supported projects is committed already. The number of projects contributes by 53 % to the target value of the indicator focusing on the volume of production systems with recirculation and almost one third of indicator 95514.

Within the measures 2.5., the Decisions were published for 4 applications. These projects meet nearly 40% of the target value of the volume of eel introduced.

Due to the fact, that no call has been launched for the measures under the specific objective 3. and the measures 3.1 up to 30. 9. 2016, and therefore no project applications have been filed, at this stage, the degree of substantive progress in implementation cannot be assessed.

Under the measure 3.2, there were no project applications registered, the call # 6 was open for the beneficiaries on 11. 10. 2016. The degree of fulfilment of the factual progress within the specific objective 3 B cannot be assessed at this stage.

No project applications were filed under the measure 5.1, no call within the measure has been launched and no values of monitoring indicators have been available

Although the call no 3 covering measure 5.2, the (b) purpose, was announced in May 2016, there has been no Decision for grant provision published. No values of monitoring indicators have thus been committed for the time being. To the date, a total of 5 applications were registered in the call no 3. The financial resources required (expressed as EU contribution) reached circa 6% of the total allocation of the call no 3.

There are 3 projects under the measures 5.3 (aimed at processing of products) with published Decision, this represents less than 10% of the expected number of projects. As of 30. 9. 2016, 9% of the projects fills almost half of the target value of the production of fish processed. It can be concluded, presuming the current trend is preserved, that the value of indicator Production of processed fish (95210) should be achieved.

As to the technical assistance measure, a total of 7 projects with a committed financial support of 6.6 million CZK were with published Decision to the 30. 9. 2016, which equals approximately 10% of the total allocation of the measure. Implementation of one of the projects has already been completed (the Annual Conference of the OP Fisheries). Due to the fact that, to the date, most of the projects were still amidst implementation, values of most of the indicators are currently at zero level. Commitments of the approved projects reached the 52% of the target number of indicator 80600 No of meetings, working and advisory groups. In case of the indicator 82200 purchase of materials, goods and services needed to ensure the implementation of the programme, 0.5% of the target values has been committed, and 0.4 % achieved.

Summary and Next Steps

Due to the low level of progress in the implementation of the OP, no significant progress in fulfilling the objectives of the programme has been reached yet. The evaluation at the results level has thus been carried out at the levels, where the results have already been achieved. Alternatively, a qualitative comment based on the assumption of the fulfilling the results through currently implemented projects is provided.

Given the very early phase of the implementation of most of the OPs measures, it is difficult evaluate expected results set out in the Partnership Agreement for the programming period 2014-2020 and the effectiveness of the objectives achieved. These tasks will be included in following Interim report, reflecting data generated by 31. 12. 2016. In this report, the theories of change for individual measures will also be elaborated, and where applicable, supplemented by a field research.

Vedoucí týmu hodnotitele

Lukáš Bumbálek

1 ÚVOD

Zakázka „**Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství**“ byla zahájena dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společnostmi Naviga 4, s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o.

Hodnocení v rámci realizované evaluace je zaměřeno na **dva hlavní okruhy – procesní a výsledková evaluace**. Cílem procesního hodnocení je posouzení nastavení implementační struktury a identifikace slabých míst v systému OP Rybářství. Cílem výsledkové evaluace je ověřit relevanci programu vzhledem k novým podmínkám (změny v odvětví akvakultury, změny rozvojových potřeb), posouzení vhodnosti nastavení indikátorové soustavy a relevance komplementárních vazeb a provést hodnocení dosavadních výsledků OP Rybářství. Obsahem výsledkové evaluace je také zpracování pre-evaluační studie, jejímž cílem je nastavit vhodný mix metod, které budou sloužit k vyhodnocování OP Rybářství 2014 – 2020.

2 STRUČNÝ POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ

Průběžná zpráva 1 je jedním z výstupů této veřejné zakázky a zaměřuje se na část výsledkové evaluace. Cílem Průběžné zprávy je analýza věcného pokroku v plnění cílů OP Rybářství, hodnocen je tedy dosavadní pokrok v plnění nastavených indikátorů programu, doplněný o informace o finančním pokroku.

Informace ve zprávě uvedené jsou založeny na analýze plnění indikátorů z dat z MS2014+ generovaných k 30. 9. 2016 ze strany MMR-NOK a doplněné informacemi o schválených projektech (závazky příjemců). V rámci přípravy Průběžné zprávy byly tedy aplikovány metody data mining a provedena analýza dat z MS2014+ a z IS SZIF. Dále byl proveden desk research a analýza výzev (harmonogramy výzev, vyhlášené výzvy).

S ohledem na aktuální fázi implementace OP Rybářství nenastal prozatím výraznější pokrok v plnění cílů programu. Zhodnocení je tedy provedeno na výsledkové úrovni tam, kde byly již výsledky dosaženy, případně je uveden kvalitativní komentář vycházející z předpokladu naplnění výsledků aktuálně realizovanými projekty. Vzhledem k počáteční fázi implementace OP je obtížné provádět vyhodnocení očekávaných výsledků uvedených v Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020 a vyhodnocení efektivity dosažených cílů. Toto hodnocení bude součástí aktualizace Průběžné zprávy (dílčí plnění 6) na datech generovaných k 31. 12. 2016. V této zprávě budou také rozpracovány teorie změny pro jednotlivá opatření a tam, kde to bude relevantní, budou doplněny o terénní šetření.

3 IMPLEMENTACE OP RYBÁŘSTVÍ 2014-2016

Operační program Rybářství je nástrojem pro čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) a přispívá také k plnění cílů Společné rybářské politiky. Operační program Rybářství 2014 - 2020 byl schválen Evropskou komisí dne 4. 6. 2015.

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Dále je program zaměřen na rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a na zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku

na domácí trh, včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Program se tak zaměřuje na jedné straně na rozvoj tradičních forem akvakultury a na straně druhé na podporu zavádění moderních intenzivních chovných systémů, především pro produkci lososovitých ryb, případně dalších druhů.


Cíle OP Rybářství jsou naplňovány prostřednictvím tří věcně zaměřených **priorit Unie**¹ vycházejících z ENRF:

- Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
- Priorita Unie 3: Podpora provádění společné rybářské politiky
- Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

Na jednotlivé priority Unie (PU) jsou navázány specifické cíle, v rámci nichž jsou definována opatření přispívající k dosažení těchto specifických cílů. Struktura věcných PU a specifických cílů operačního programu Rybářství 2014 – 2020 je znázorněna ve schématu níže.

¹ Priorita Unie 6 je zaměřena na technickou pomoc.

Schéma 1: Struktura operačního programu Rybářství 2014 – 2020

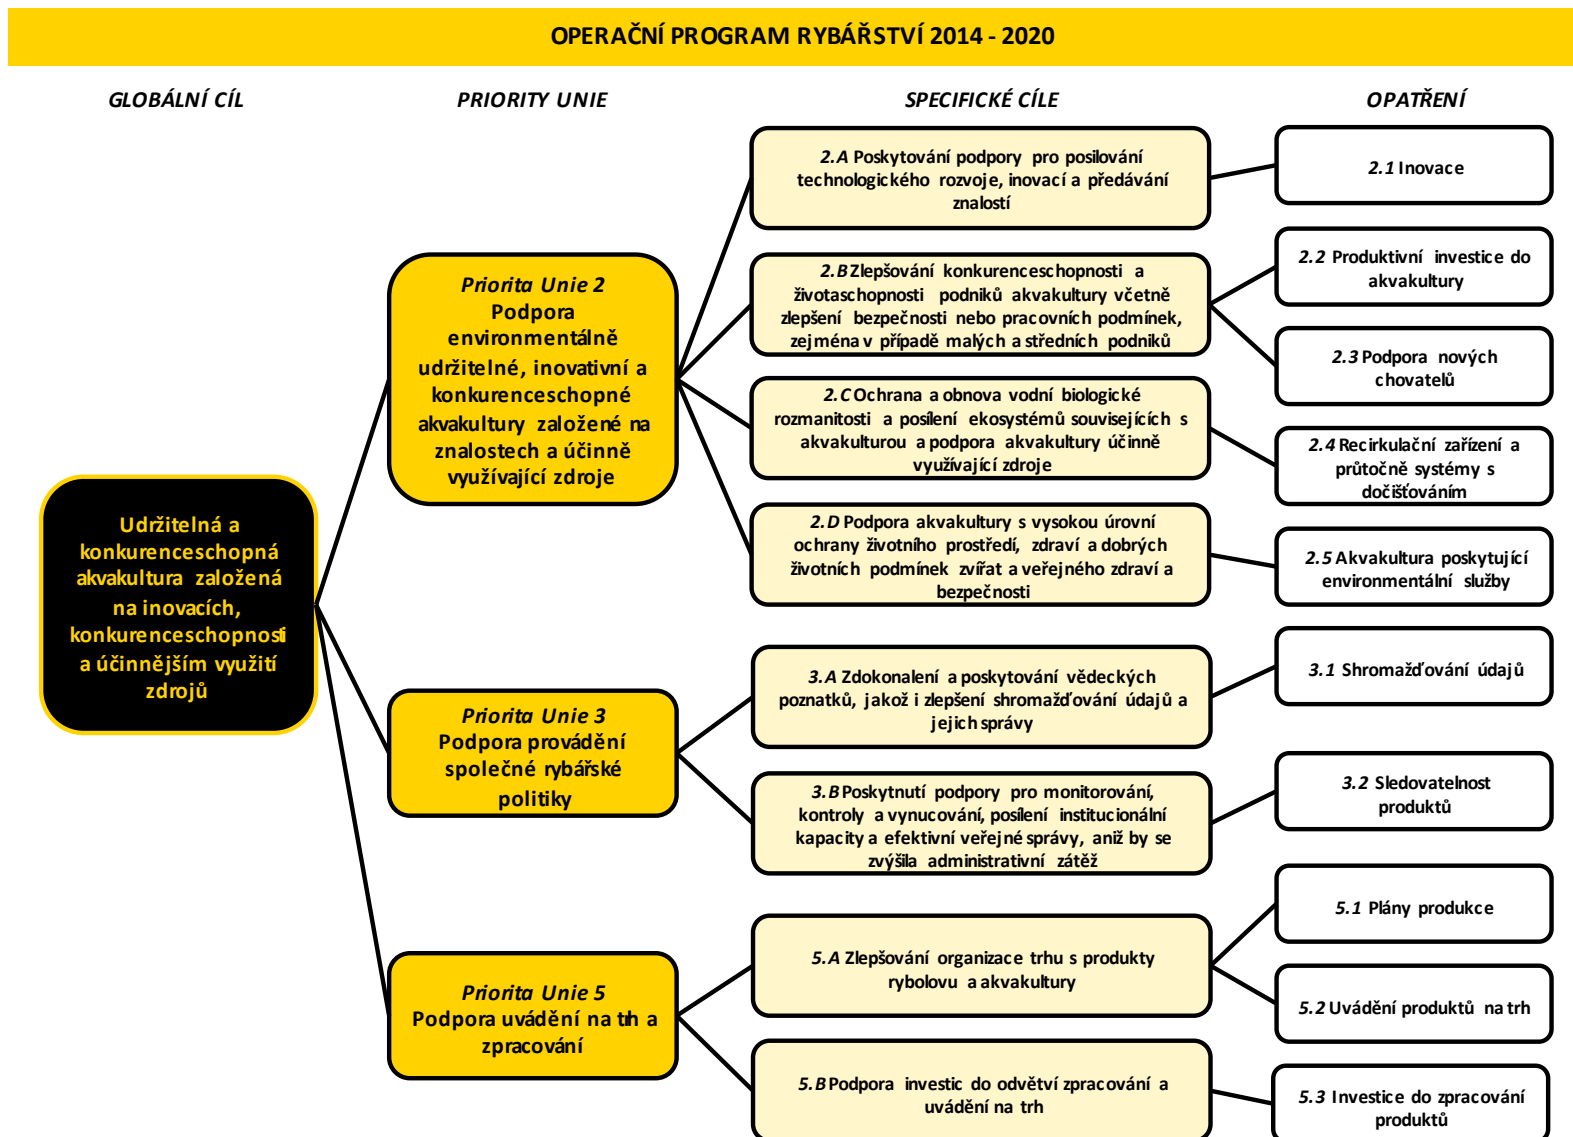

Operační program Rybářství si stanovil **5 priorit**, k jejichž naplňování jednotlivé specifické cíle (a k nim příslušná opatření) směřují:

- Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
- Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
- Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
- Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
- Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Celková finanční alokace Operačního programu Rybářství z prostředků ENRF je 790,3 mil. Kč. Rozdělení alokace na úrovni Priorit Unie a specifických cílů ukazuje tabulka níže. Přibližně dvě třetiny prostředků (66 %) jsou přiděleny na Prioritu Unie 2, přičemž v rámci této PU jsou prostředky mezi specifické cíle rozděleny poměrně nerovnoměrně. Nejvyšší alokaci v rámci programu má specifický cíl 2.B *Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků* s přidělenými prostředky ve výši 360,3 mil. Kč. Naopak specifické cíle 2.A a 2.D patří k těm s nejnižší alokací v rámci programu.

Tabulka 1: Alokace OP Rybářství dle specifických cílů

Priorita Unie	Specifický cíl	Celková alokace (Kč)	Celková alokace, příspěvek Unie (Kč)
2	2.A	35 473 900	24 448 186
	2.B	522 718 350	360 251 205
	2.C	162 762 600	112 174 028
	2.D	40 690 650	28 043 507
	PU 2 celkem	761 645 500	524 916 926
3	3.A	67 134 891	49 613 417
	3.B	21 388 889	17 782 450
	PU 3 celkem	88 523 780	67 395 867
5	5.A	101 204 950	70 117 089
	5.B	117 898 550	81 682 795
	PU 5 celkem	219 103 500	151 799 884
6	6.A	62 601 000	46 139 783
	PU 6 celkem	62 601 000	46 139 783
OP Rybářství celkem		1 131 873 780	790 252 459

Postup implementace

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. V tabulce níže je uveden přehled vyhlášených i plánovaných výzev OP Rybářství. První dvě výzvy byly vyhlášeny v říjnu 2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2015. Vyhlášení 5. a 6. výzvy a pokračování 2. výzvy OP Rybářství bylo plánováno na 11. října 2016, žádosti o podporu byly zpřístupněny již k 27. 9. 2016. Výzvy č. 1, 4 a 5 již byly

ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v případě 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018).

Tabulka 2: Přehled výzev OP Rybářství

Číslo výzvy	Priorita Unie	Specifický cíl	Opatření	Stav výzvy (k 30.9.2016)	Alokace výzvy (Kč)	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí
1	PU 2 PU 5	2.A; 2.B; 2.C; 5.B	2.1; 2.2; 2.4; 5.3	uzavřená	243,2 mil.	21. 10. 2015	3. 11. 2015
2	PU 2	2.D	2.5	otevřená	40,0 mil.	21. 10. 2015	31. 10. 2016
3	PU 5	5.A	5.2.	otevřená	20,0 mil.	3. 5. 2016	31. 12. 2023
4	PU 2	2.B; 2.C;	2.2; 2.3;	uzavřená	70,5 mil.	3. 5. 2016	17. 5. 2016
5	PU 2 PU 5	2.B; 2.C; 5.B	2.2; 2.4; 5.3	vyhlášená	400 mil.	11. 10. 2016	31. 10. 2016
6	PU 3	3.B	3.2.	vyhlášená	10,5 mil.	11. 10. 2016	31. 12. 2018
7	PU 5	5.A	5.1.	plánovaná	6,0 mil.	duben 2017	31. 12. 2018
8	PU 5	5.A	5.2.	plánovaná	2,0 mil.	duben 2017	31. 12. 2017
9	PU 2 PU 5	2.B; 2.C; 5.A	2.2; 2.3; 5.2.	plánovaná	65,0 mil.	duben 2017	duben 2017
10	PU 3	3.B	3.1.	plánovaná	65,9 mil.	duben 2017	31. 12. 2023

Jednotlivé výzvy OP Rybářství pokrývají i více opatření, zaměření výzev dle opatření znázorňuje tabulka níže. K 30. 9. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1 a 5.1, pro které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva². Naopak opatření 2.2 je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá jeho významnosti vzhledem k větší alokace specifického cíle 2.B (viz výše). Všechna opatření spadající pod Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou dle zjištění pokryta alespoň jednou výzvou.

² Dle harmonogramu výzev na rok 2017 budou výzvy pro opatření 3.1 a 5.1 vyhlášeny v průběhu roku 2017.

Tabulka 3: Vyhlášené výzvy pokrývající jednotlivá opatření OP Rybářství 2014 - 2020

výzva / opatření	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	5.1	5.2	5.3
1. výzva										
2. výzva										
3. výzva										
4. výzva										
5. výzva										
6. výzva										
celkem výzev pokrývajících opatření	1	3	1	2	1	0	1	0	1	2

4 DOSAŽENÝ POKROK A VÝSLEDKY OP RYBÁŘSTVÍ

4.1 Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

4.1.1 2. A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

Specifický cíl 2.A je naplňován jedním opatřením - **2.1. Inovace**, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zaváděním nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů. Celkové finanční prostředky alokované k naplňování tohoto opatření činí 35,5 mil. Kč.

Na projekty opatření 2.1. Inovace dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
1	priorita unie 2, 5	2.A, 2.B, 2.C, 5.B	2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015

Ve výzvě bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). Podle harmonogramu výzev pro rok 2017 není plánována na projekty opatření 2.1. žádná výzva.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 4: Přehled indikátorů – opatření 2.1

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95100	Objem produkce akvakultury	kontextový	hlavní	t	19 555	-	-	0
95500	Hodnota produkce akvakultury	kontextový	hlavní	tis. EUR	44 794	-	-	0
95110	Změna objemu produkce akvakultury	výsledkový	hlavní	t	16	2,9	18,1	0
95510	Změna hodnoty produkce akvakultury	výsledkový	hlavní	tis. EUR / rok	34	5,9	17,3	0
95515	Udržení objemu akvakulturní produkce	výsledkový	hlavní	t	200	0	0	0
96002	Počet projektů zaměřených na inovace, poradenství a pojištění	výstupový	hlavní	projekty	18	2	11,1	0
95105	Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek v akvakultuře	kontextový	interní	FTE	1 442	-	-	93,7
96201	Počet realizovaných produktových inovací	výstupový	interní	inovace	9	0	0	0
96202	Počet realizovaných procesních inovací	výstupový	interní	inovace	14	2	14,3	0

K 30. 9. 2016 bylo v rámci opatření 2.1. zaregistrováno celkem 5 projektů. Ke stejnému datu jsou vydaná Rozhodnutí u 2 projektů, což je zhruba desetina očekávaného počtu projektů.

V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. K naplnění cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury by měla přispět realizace projektů

s vydaným Rozhodnutím zhruba 18 %. Podobný příspěvek k naplnění cíle lze očekávat rovněž u indikátoru Změna hodnoty produkce akvakultury. Z hlediska interních indikátorů projekty s vydaným Rozhodnutím naplňují přibližně z 15 % plánovaný počet realizovaných procesních inovací.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016. Dále bude realizováno terénní šetření (rozhovory) mezi dosavadními příjemci k doplnění a ověření dat z monitoringu.

4.1.2 2. B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

Specifický cíl 2.B je naplňován dvěma opatřeními - **2.2. Produktivní investice do akvakultury**, jehož záměrem jsou investice do akvakultury a její diverzifikace a **2.3. Podpora nových chovatelů**.

Cílem prvního opatření je konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje; zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury; výstavba rybníků; úspora spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů a rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře. Hlavním cílem druhého opatření je umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti.

Celková alokace pro opatření 2.2. je 461,2 mil. Kč, u opatření 2.3. činí celková alokace 61,6 mil. Kč.

Na projekty opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
1	priorita unie 2, 5	2.A, 2.B, 2.C, 5.B	2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015
4	priorita unie 2	2.B, 2.C	2.2. záměr b), 2.3.	3. 5. 2016 - 17. 5. 2016
5	priorita unie 2, 5	2.B, 2.C, 5.B	2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	11. 10. 2016 - 31. 10. 2016

Ve výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). V roce 2017 je plánovaná další výzva ve vztahu k SC 2. B (výzva č. 9), zaměřená na projekty naplňující opatření 2.2. (záměr b)), a 2.3.

Počet projektů v rámci opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů v jednotlivých fázích k 30. 9. 2016:

Opatření	Podopatření / záměr	Číslo výzvy	Období příjmu žádostí	Počet zaregistrovaných žádostí	Fáze			
					Kontrola NaP	Věcné hodnocení	Příprava Rozhodnutí	Rozhodnutí vydáno
2.2.	2.2. záměr a)	1	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015	100	8	11	11	67
2.2.	2.2. záměr a)	5	11. 10. 2016 - 31. 10. 2016	-	-	-	-	-
2.2.	2.2. záměr b)	4	3. 5. 2016 - 17. 5. 2016	4	-	-	-	-
2.3.	2.3.	4	3. 5. 2016 -	14	-	-	-	-

Opatření	Podopatření / záměr	Číslo výzvy	Období příjmu žádostí	Počet zaregistrovaných žádostí	Fáze		Příprava Rozhodnutí	Rozhodnutí vydáno
					Kontrola NaP	Věcné hodnocení		
			17. 5. 2016					

Analýza věcného pokroku

Tabulka 5: Přehled indikátorů – opatření 2.2

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95100	Objem produkce akvakultury	kontext	hlavní	t	19 555	-	-	0
95500	Hodnota produkce akvakultury	kontext	hlavní	tis. EUR	44 794	-	-	0
95110	Změna objemu produkce akvakultury	výsledkový	hlavní	t	182	85,4	46,9	0
95510	Změna hodnoty produkce akvakultury	výsledkový	hlavní	tis. EUR	400	184,0	46,0	0
95515	Udržení objemu akvakulturní produkce	výsledkový	hlavní	t	1 300	0	0	0
96001	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	výstupový	hlavní	projekt	415	67	16,1	0
95105	Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek v akvakultuře	kontextový	interní	FTE	1 442	-	-	93,7
96301	Počet podpořených výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější	výstupový	interní	zařízení	30	0	0	0
96501	Příjmy z podpořených	výstupový	interní	Kč	39 000 000	0	0	0

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
	doplňkových aktivit mimo akvakulturu							
96502	Příjmy z podpořených doplňkových aktivit - diverzifikace v rámci druhů ryb	výstupový	interní	Kč	4 000 000	0	0	0
96503	Příjmy z podpořených doplňkových aktivit - diverzifikace v rámci rybářské turistiky	výstupový	interní	Kč	35 000 000	0	0	0
96801	Počet nově vybudovaných rybníků	výstupový	interní	rybník	1	12	1 200	0
96901	Množství vytěženého bahna z rybníka/loviště	výstupový	interní	m3	115 385	29 275	25,4	0
96902	Množství vytěženého bahna z rybníka/loviště přímo použitelného na zemědělský půdní fond	výstupový	interní	m3	3 000	0	0	0
97001	Počet zařízení podpořených na ochranu proti rybožravým predátorům	výstupový	interní	zařízení	38	0	0	0

K 30. 9. 2016 bylo v rámci opatření 2.2. a 2.3. zaregistrováno celkem 118 žádostí (100 v rámci 2.2. a 14 v rámci 2.3.). Celkem u 67 projektů již bylo vydáno Rozhodnutí a to zejména v rámci opatření 2.2., v případě opatření 2.3. nebylo doposud vydáno Rozhodnutí u žádného projektu..

U projektů s vydaným Rozhodnutím se předpokládá, že jejich realizace přispěje téměř z poloviny k naplnění cílových hodnot hlavních výsledkových indikátorů tj. Změna objemu produkce akvakultury a Změna hodnoty

objemu produkce akvakultury. V případě interních indikátorů dokonce již došlo v jednom případě k několikanásobnému přezávazování hodnoty indikátoru. Jedná se o indikátor sledující počet nově vybudovaných rybníků. Způsob vyhodnocování indikátoru v následujících letech bude upřesněn v rámci realizace Dílčího plnění č. 3 Ověřovací studie – analýza a posouzení vhodnosti a správného nastavení indikátorové soustavy.

Tabulka 6: Přehled indikátorů – opatření 2.3

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95100	Objem produkce akvakultury	kontextový	hlavní	t	19 555	-	-	0
95500	Hodnota produkce akvakultury	kontextový	hlavní	tis. EUR	44 794	-	-	0
96003	Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti akvakultury	výstupový	hlavní	projekt y	40	0	0	0
95105	Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek v akvakultuře	kontextový	interní	FTE	1 442	-	-	93,7
95110	Změna objemu produkce akvakultury	výsledkový	interní	t	23	0	0	0
95510	Změna hodnoty produkce akvakultury	výsledkový	interní	tis. EUR	34	0	0	0
95515	Udržení objemu akvakulturní produkce	výsledkový	interní	t	5	0	0	0
95901	Počet podpořených nových chovatelů	výstupový	interní	subjekt y	40	0	0	0

Jak již bylo zmíněno v případě opatření 2.3. bylo k 30. 9. 2016 zaregistrováno celkem 14 projektů, u žádného z nich však doposud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016. Dále bude realizováno terénní šetření mezi dosavadními příjemci k doplnění a ověření dat z monitoringu. Vzhledem k většímu počtu projektů s vydaným Rozhodnutím v rámci tohoto SC je terénní šetření plánováno formou dotazníkového šetření.

4.1.3 2. C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

Specifický cíl 2.C je naplňován jedním opatřením – **2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním**, jehož cílem je vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení a Rozvinutí intenzivní akvakultury založené na aplikaci moderních inovativních metod šetrných k životnímu prostředí.

Celková alokace pro opatření 2.4 činí 162,8 mil. Kč.

Na projekty opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
1	priorita unie 2, 5	2.A, 2.B, 2.C, 5.B	2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	21. 10. 2015 - 31. 11. 2015
5	priorita unie 2, 5	2.B, 2.C, 5.B	2.2. záměr a), 2.4., 5.3.	11. 10. 2016 - 31. 10. 2016

Ve výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). Dle harmonogramu výzev pro rok 2017 není plánována na projekty opatření 2.4. žádná výzva.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 7: Přehled indikátorů – opatření 2.4

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95100	Objem produkce akvakultury	kontextový	hlavní	t	19 555	-	-	0
95300	Objem produkce systémů s recirkulací	kontextový	hlavní	t	1 200	-	-	0
95500	Hodnota produkce akvakultury	kontextový	hlavní	tis. EUR	44 794	-	-	0
95310	Změna objemu výsledkov	výsledkov	hlavní	t	1 100	585	53,2	0

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
	produkce systémů s recirkulací	ý						
96001	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	výstupový	hlavní	projekty	20	12	60	0
95105	Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek v akvakultuře	kontextový	interní	FTE	1 442	-	-	93,7
95514	Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních průtočných systémů dočišťováním	výsledkový	interní	tis. EUR	4 074	1 190,8	29,2	0

K 30. 9. 2016 bylo v rámci opatření 2.4. zaregistrováno celkem 17 žádostí. U 12 projektů již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zazávazkována je tak již více než polovina očekávaného počtu podpořených projektů. Tento počet projektů celkově naplňuje 53 % indikátoru sledujícího objem produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu indikátoru 95514.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016. Hodnocení bude doplněno o terénní šetření mezi příjemci podpory (rozhovor s 1-2 příjemci).

4.1.4 2. D Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

Specifický cíl 2.D je naplňován jedním opatřením – **2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby**, jehož cílem je vysazování úhoře říční do vnitrozemských vodních toků.

Celková alokace pro opatření 2.5 je 40,7 mil. Kč.

Na projekty opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby dosud byly vyhlášeny následující výzvy:

Číslo výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / specifický cíl	Podopatření / záměr	Období příjmu žádostí
2	priorita unie 2	2.D	2.5.	21. 10. 2015 - 3. 11. 2015

Podle harmonogramu výzev pro rok 2017 není plánována na projekty opatření 2.5. žádná výzva.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 8: Přehled indikátorů – opatření 2.5

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
97110	Množství vysazeného úhoře	výstupový *	hlavní	kg	2 000	762	38,1	0
96702	Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí (environmentální řízení, systémy auditu, environmentální služby ekologické akvakultury)	výstupový	hlavní	projekt y	11	4	36,4	0

* V Programovém dokumentu OP R indikátor uveden jako výstupový, v tabulce dle MMR uveden jako výsledkový.

K 30. 9. 2016 bylo v rámci opatření 2.5. vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace u 4 projektů. Tyto projekty naplňují téměř 40 % cílové hodnoty plánovaného množství vysazeného úhoře.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016. Hodnocení bude stejně jako u předchozích SC doplněno o terénní šetření mezi příjemci podpory (plánovaný je rozhovor s 1-2 příjemci)

4.2 Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

4.2.1 3. A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy

Specifický cíl 3.A je naplňován jedním opatřením – **3.1 Shromažďování údajů**, jehož cílem je zlepšení v oblasti shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

Celková alokace pro specifický cíl 3. A, resp. pro opatření 3.1 činí 67,1 mil. Kč. Pro toto opatření však nebyla k 30. 9. 2016 vyhlášena žádná výzva v rámci OP Rybářství. Dle harmonogramu pro rok 2017 by měla být výzva pokrývající opatření 3.1 vyhlášena v dubnu 2017 s alokací 65,9 mil. Kč.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 9: Přehled indikátorů – opatření 3.1

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
97300	Opatření pro shromažďování údajů - provádění datových volání podle rámce pro shromažďování údajů	kontextový	hlavní	%	100,0	-	-	0
97310	Zvýšení procentního podílu provedení datových volání	výsledkový*	hlavní	%	100,0	0	0	0
97301	Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	výstupový	hlavní	Projekty	2	0	0	0
97302	Počet subjektů zapojených do shromažďování údajů	výstupový	interní	Subjekt / rok	500	0	0	0
97305	Počet data - setů zaslaných producenty v oblasti akvakultury do softwaru pro shromažďování údajů	výsledkový**	interní	Data-set / rok	500	0	0	0

* Indikátor je uvedený v sestavě dle MMR i s NČI, v programovém dokumentu není uveden.

*** V Programovém dokumentu OP R indikátor uveden jako výsledkový, v tabulce dle MMR uveden jako výstupový.*

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A nebyla k 30. 9.2016 vyhlášena žádná výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru věcného pokroku.

V rámci plánované výzvy má být z příspěvku Unie na projekty v opatření 3.1 alokováno 52,7 mil. Kč, tedy plná finanční alokace na dané opatření.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016, přičemž dle harmonogramu výzev je vyhlášení první výzvy pro opatření 3.1 plánováno až na únor 2017.

Jelikož v době hodnocení nebudou ještě k dispozici žádné zaregistrované žádosti o dotaci, bude se hodnotitel opírat o informace uvedené v plánu výzvy č. 10, kde by měl být zanesen předpoklad naplnění monitorovacích indikátorů z projektů dané výzvy. Hodnocení bude doplněno rozhovory se zástupci ŘO a případně s významnými potenciálními příjemci (MZe, kontrolní orgány - Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Výběr respondentů pro terénní šetření bude vycházet z oprávněných příjemců, kteří budou stanoveni v plánované výzvě č. 10 (popř. bude dodavatel vycházet z předběžné verze výzvy, pokud nedojde k vyhlášení výzvy na začátku února 2017).

4.2.2 3. B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

Na specifický cíl 3. B se váže opatření **3.2 Sledovatelnost produktů**, které má za cíl zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury, a to zejména s ohledem na (1) globální, integrovaný a společný přístup, (2) spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu, (3) používání účinných moderních technologií kontroly pro dostupnost a kvalitu údajů o rybolovu, (4) rámec Unie pro kontrolu, inspekci a prosazování a (5) rozvoj kultury dodržování pravidel a spolupráce mezi všemi hospodářskými subjekty a rybáři.

Celková alokace pro specifický cíl 3. B, resp. pro opatření 3.2 činí 21,4 mil. Kč. Opatření 3.2 je pokryto výzvou č. 6, která byla vyhlášena 27. 9. 2016 a jejíž otevření pro příjem žádostí o podporu bylo naplánováno na 11. 10. 2016. S celkovou alokací 10,5 mil. Kč pokrývá výzva č. 6 přibližně polovinu celkové alokace specifického cíle 3. B.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 10: Přehled indikátorů – opatření 3.2

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
97500	Stávající zdroje k dispozici pro kontrolu - Počet zaměstnanců (inspektorů) na plný pracovní úvazek	kontextový	hlavní	FTE	1 010,0 (výchozí 1 010,0)	-	-	0
97501	Počet provedených kontrol v rámci softwaru pro sledovatelnost produktů akvakultury	výsledkový	hlavní	Kontroly	800	0	0	0
97505	Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování	výstupový	hlavní	Projekty	10	0	0	0
97510	Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti produktů v oblasti akvakultury	výsledkový	interní	%	90,0	0	0	0
97601	Nakoupený software nebo hardware	výstupový	interní	ks	8	0	0	0

K opatření 3.2 nejsou k 30. 9. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, neboť výzva č. 6 pokrývající toto opatření byla otevřena pro příjem žádostí až 11. 10. 2016. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B.

V rámci opatření 3.2 jsou podporovány aktivity vztahující se ke kontrolním činnostem veřejných subjektů. Jedná se o **školení a výměnné programy** (včetně výměny mezi členskými státy), pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností, dále **analýzy poměru nákladů a přínosů** a posouzení provedených auditů a vynaložených výdajů příslušnými orgány při monitorování, kontrole a sledování a také **iniciativy**, včetně seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jiných zúčastněných osob (inspektorů, státní zástupci a soudci) i povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel společné rybářské politiky.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016. V rámci druhé fáze hodnocení budou pravděpodobně k dispozici již alespoň předložené žádosti potenciálních příjemců a bude možné odhadnout závazek k plnění cílů z těchto žádostí plynoucí. Hodnocení se

bude opírat o informace z plánu výzev, kde by měl být zanesen alespoň předpoklad naplnění monitorovacích indikátorů z projektů dané výzvy. Hodnocení bude případně doplněno o terénní šetření mezi potenciálními příjemci podpory.

4.3 Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

4.3.1 5. A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Specifický cíl 5.A je naplňován prostřednictvím dvou opatření.

Opatření **5.1 - Plány produkce** má za cíl jednak zefektivnit organizaci, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh a jednak přispět k rovnováze nabídky a poptávky na trhu. V rámci opatření 5.1 je podporována příprava a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, které jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu. Hlavním účelem opatření je v tomto smyslu zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky. Příjemci v rámci opatření jsou organizace producentů a sdružení organizací producentů.

Opatření **5.2 - Uvádění produktů na trh** má stanoveny následující cíle: (1) zlepšení postupů při zavádění opatření k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizace trhů prostřednictvím organizací producentů; (2) široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury; (3) zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní a (4) prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách. V rámci opatření 5.2 jsou podporovány aktivity spojené se zakládáním organizací producentů a s vedením regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní. Opatření 5.2 je dále rozčleněno na 2 záměry - *záměr 5.2 a) Vytváření organizace producentů a záměr 5.2 b) Propagační kampaně*.

Specifický cíl 5. A má přiřazenou alokaci ve výši 101,2 mil. Kč, z toho 17,8 mil. Kč (17 %) připadá na opatření 5.1 a 83,5 mil. Kč (83 %) na opatření 5.2. Pro specifický cíl 5. A byla prozatím vyhlášena jedna výzva pro podávání žádostí (výzva č. 3), která svým zaměřením pokrývá pouze opatření 5.2, záměr b). Jedná se o průběžnou výzvu, do které je možné podávat žádosti až do konce roku 2023. S alokací 45 mil. Kč výzva č. 3 naplňuje přibližně polovinu celkové alokace specifického cíle 5. A a více než polovinu alokace opatření 5.2. Dle harmonogramu výzev jsou v roce 2017 plánovány pro SC 5.A dvě výzvy – výzva č. 7 pro opatření 5.1 s alokací 6 mil. Kč a výzva č. 8 pro opatření 5.2, záměr a) s alokací 2 mil. Kč. Po jejich vyhlášení budou výzvami pokryta všechna opatření/záměry specifického cíle 5. A.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 11: Přehled indikátorů – opatření 5.1

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95111	Změna objemu prvního prodeje v organizacích producentů	výsledkový	hlavní	t	600,0	0	0	0
95312	Podíl produkce uváděné na trh	kontextov	hlavní	%	6,5	-	-	0

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
	organizacemi producentů (objem)	ý						
95511	Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích producentů	výsledkový	hlavní	tis. EUR	2 309,0	0	0	0
95513	Podíl produkce uváděné na trh organizacemi producentů (hodnota)	kontextový	hlavní	%	12,5	-	-	0
95600	Počet organizací producentů	kontextový	hlavní	Organizace producentů	1	-	-	0
95801	Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány produkce a uvádění produktů na trh se podporují	výstupový	hlavní	Organizace producentů	1	0	0	0
96004	Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování	výstupový	hlavní	Projekty	5	0	0	0

K opatření 5.1 nejsou k 30. 9. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena výzva zaměřená na naplňování tohoto opatření. Nejsou tak k dispozici žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to ani na úrovni projektových žádostí.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016, přičemž dle harmonogramu výzev je vyhlášení první výzvy pro opatření 5.1 plánováno až na únor 2017.

Jelikož v době hodnocení nebudou ještě k dispozici žádné zaregistrované žádosti o dotaci, bude se hodnotitel opírat o informace uvedené v plánu výzvy č. 7, kde by měl být zanesen předpoklad naplnění monitorovacích indikátorů z projektů dané výzvy. Hodnocení bude doplněno rozhovory se zástupci ŘO a případně s významnými potenciálními příjemci (sdružení organizací producentů). Výběr respondentů pro terénní šetření bude upřesněn dle stanovených oprávněných příjemců uvedených v plánované výzvě č. 7 (popř. bude dodavatel vycházet z předběžné verze výzvy, pokud nedojde k vyhlášení výzvy na začátku února 2017).

Tabulka 12: Přehled indikátorů – opatření 5.2

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
96004	Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování	výstupový	hlavní	Projekty	5	0	0	0
95005	Spotřeba sladkovodních ryb a rybích výrobků na obyvatele za rok	kontextový	interní	kg/osoba	1,41 (výchozí 1,40)	-	-	-
95111	Změna objemu prvního prodeje v organizacích producentů	výsledkový	interní	t	600,0	0	0	0
95511	Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích producentů	výsledkový	interní	tis. EUR	2 309,0	0	0	0
80001	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	výstupový	interní	Aktivity	4	0	0	0
95601	Počet založených organizací producentů	výstupový	interní	Organizace producentů	1	0	0	0
95801	Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány produkce a uvádění produktů na trh se podporují	výstupový	interní	Organizace producentů	1	0	0	0

Přestože výzva č. 3 pokrývající opatření 5.2, záměr b) byla vyhlášena již v květnu 2016, nebylo k 30. 9. 2016 vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty monitorovacích indikátorů.

K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 3. Všechny zaregistrované žádosti tedy spadají pod opatření 5.2, záměr b). Požadované finanční prostředky (příspěvek Unie) v rámci těchto žádostí jsou ve výši 2,88 mil. Kč, což činí přibližně 6 % celkové alokace výzvy č. 3. V rámci těchto projektů (opatření 5.2, záměr b)) je žadateli/příjemci vykazován indikátor 80001 *Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit*. Z hlediska zaměření se jedná o projekty, jejichž výstupem je webová stránka, reklamní spot, knihy receptů či výstavní expozice.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016. V rámci druhé fáze hodnocení budou pravděpodobně k dispozici již alespoň nějaké projekty s vydaným

Rozhodnutím (podané do výzvy č. 3) a zazávazkované hodnoty monitorovacích indikátorů a bude tedy možné částečně stanovit vyhodnocení plnění cílů vzhledem k vyhlášené alokaci. Hodnocení bude doplněno o terénní šetření mezi příjemci podpory (rozhovor s 1-2 příjemci), realizována bude evaluační návštěva u příjemce (navazující na hodnocení v rámci pre-evaluační studie).

4.3.2 5. B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Specifický cíl 5. B je naplňován opatřením **5.3 Investice do zpracování produktů**, jehož cílem je zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb a modernizace a inovace zpracovatelských kapacit. V rámci opatření jsou podporovány investice na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Oprávněnými příjemci jsou zde malé a střední podniky.

Alokace specifického cíle 5 B, resp. opatření 5.3 je ve výši 117,9 mil. Kč. Opatření 5.3 bylo zahrnuto již ve dvou vyhlášených výzvách – v 1. a 5. výzvě. V obou výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2), a zpracovatel nemá k dispozici informace o dílčích alokacích v rámci těchto výzev na jednotlivá opatření.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 13: Přehled indikátorů – opatření 5.3

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
95200	Objem zpracovaných ryb	kontextový	hlavní	t	7 453,0 (výchozí 6 803)	-	-	0
95210	Produkce zpracovaných ryb	výsledkový	hlavní	t	650,0	311,0	47,8	0
96401	Počet projektů zaměřených na zpracování	výstupový	hlavní	Projekty	33	3	9	0
95005	Spotřeba sladkovodních ryb a rybích výrobků na obyvatele za rok	kontextový	interní	kg/osoba	1,41 (výchozí 1,40)	-	-	0

K 30. 9. 2016 byly v opatření 5.3 celkem 3 projekty s vydaným Rozhodnutím zaměřené na zpracování produktů, což je méně než 10 % očekávaného počtu projektů (dle stanovené hodnoty MI 96401). Objem produkce zpracovaných ryb (MI 95210) se mezi jednotlivými projekty výrazně liší, a to až v řádu stovek tun. Ve stavu k 30. 9. 2016 tak prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové hodnoty produkce zpracovaných ryb, jak je patrné z tabulky výše. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru *95210 Produkce zpracovaných ryb* měla být dosažena.

Z hlediska zaměření se jedná o projekty zahrnující jak nové zavedení procesu zpracování ryb (tj. výchozí hodnota produkce zpracovaných ryb je nulová), tak modernizaci stávajících provozů pro zpracování ryb. Obsahem projektů je obvykle nákup zařízení, strojů a materiálního vybavení.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016. V rámci druhé fáze hodnocení bude pravděpodobně k dispozici již více projektů s vydaným Rozhodnutím a zazávkované hodnoty monitorovacích indikátorů a bude tedy možné lépe vyhodnocení plnění cílů. Hodnocení bude doplněno o terénní šetření mezi příjemci podpory (rozhovor s 1-2 příjemci), realizována bude evaluační návštěva u příjemce (navazující na hodnocení v rámci pre-evaluační studie).

4.4 Technická pomoc

4.4.1 Opatření Technická pomoc

Opatření technická pomoc je zaměřeno na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly. Cílem opatření je účinná a efektivní realizace OP Rybářství.

Výzva k technické pomoci OP Rybářství byla otevřena 21. 10. 2015, přičemž se jedná o průběžnou výzvu a žádosti o podporu je možné podávat až do 31. 12. 2023. Celková alokace pro opatření Technická pomoc (62,6 mil. Kč) je zcela pokryta uvedenou výzvou.

Analýza věcného pokroku

Tabulka 14: Přehled indikátorů – opatření Technická pomoc

ID	Název indikátoru	Typ indikátoru	Hlavní / interní	Jednotka	Cílová hodnota	Závazek	Závazek (v %)	Dosažená hodnota (v %)
80001	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	výstupový	interní	Aktivity	5	0	0	0
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	výstupový	interní	Dokumenty	15	3	20	0
80600	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	výstupový	interní	Jednání	23	12	52	0
80810	Míra čerpání prostředků programu	výsledkový	interní	%	100,0			
82200	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	výstupový	interní	Kč	32 105 000	172 976	0,5	0,4
82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	výstupový	interní	FTE	3,0	18,0*	600*	0
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	výsledkový	interní	%	20,0	64,0**	-	-

* Počet financovaných pracovních míst se v projektech s vydaným Rozhodnutím vztahuje k období 2007 – 2013 i období 2014 – 2020.

**** Uvedený závazek vychází z jednoho realizovaného v opatření 6.1, který uvádí výchozí hodnotu indikátoru 55 %.**

V rámci opatření Technická pomoc bylo k 30. 9. 2016 celkem 7 projektů s vydaným Rozhodnutím s celkovou finanční podporou ve výši 6,6 mil. Kč, což činí přibližně 10 % celkové alokace opatření. Realizace jednoho projektu již byla ukončena (uspořádání výroční konference k OP Rybářství).

V tabulce jsou uvedeny zazávazkované hodnoty indikátorů. Vzhledem k tomu, že většina projektů byla k uvedenému datu stále v realizaci, dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou prozatím nulové.

Závazky projektů s vydaným Rozhodnutím naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru *80600 Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin*. V případě indikátoru *82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu* je zazávazkováno zatím 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %.

Další hodnocení

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 2016. V rámci druhé fáze hodnocení bude provedeno terénní šetření, v rámci kterého budou osloveni zástupci MZe (ŘO OP Rybářství) a případně i zástupci SZIF (jako zprostředkujícího subjektu OP).
